



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2020 г.

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН
ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
(ИПГВР) 2014-2020г.
НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО**



Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ.....	5
I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИПГВР НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2014-2020 г.....	11
1.1. Общи положения.....	12
1.2. Съгласуваност на ИПГВР с релевантни планове и стратегии.....	15
1.3. Координация и мониторинг на ИПГВР.....	19
II. ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК.....	21
2.1. Обща характеристика на проектите, включени във финалния доклад-отчет на ИПГВР..	22
2.2. Подробно проучване по проектите в Зона за въздействие „С“ с преобладаващ социален характер.....	26
2.3. Подробно проучване по проектите в Зона за въздействие „П“ на публични функции с висока обществена значимост.....	29
2.4. Подробно проучване по проектите в Зона за въздействие „И“ с потенциал за икономическо развитие.....	32
2.5. Проекти в Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.....	33
2.6. Проекти за финансиране с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020.....	35
2.7. Други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.....	36
III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.....	38
3.1. Анализ и оценка на проектите от гледна точка целите и приоритетите на ИПГВР.....	39
3.2. Отчитане актуалните стойности на индикаторите на ИПГВР.....	41
IV ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ.....	48
4.1. Анализ на финансовото изпълнение на ИПГВР по зони за въздействие.....	49
4.2. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси по приоритети.....	61
4.3. Обобщение на организационните ресурси за изпълнение и наблюдение.....	64
4.4. Описание на съответствието между разходите и очакваните ползи.....	65
V. ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО ..	66
VI. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД.....	71
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	74
Приложение №1. Списък на проектите в ИПГВР по приоритети и мерки.....	75
Приложение №2. Актуализирана матрица бюджет.....	85
Приложение №3 Актуализирана матрица общоградски проекти.....	119
Приложение №4. Финансово изпълнение на ИПГВР.....	126
Приложение №5 Преглед на постигнатия напредък.....	157

1. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР	158
1.1. Група проекти ЗС-1: Безопасна, обновена и привлекателна среда.....	158
1.2. Група проекти ЗС-2: Обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси.	163
1.3. Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и социална инфраструктура	164
1.4. Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания	173
1.5. Група проекти ЗС-5: Насърчаване на заетостта сред всички групи от населението	187
1.6. Група проекти ЗС-6: Достъпна архитектурна среда	195
1.7. Група проекти ЗС-7: Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт.....	197
2. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ	200
2.1. Група проекти ЗП-1: Обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради	200
2.2. Група проекти ЗП-2 Модернизирани на образователна, културна и спортна инфраструктура	201
2.3. Група проекти ЗП-3 Опазване и промотиране на културното наследство и туризма	209
2.4. Група проекти ЗП-4: Модернизирани на публични пространства и зони за рекреация..	216
2.5. Група проекти ЗП-5: Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда.....	221
2.6. Група проекти ЗП-6: Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт.....	228
2.7. Група проекти ЗП-7 Повишаване капацитета на местната администрация	229
2.8. Група проекти ЗП-8 Повишаване на образователното равнище и стимулиране на научния капацитет.....	232
2.9. Група проекти ЗП-9: Повишаване квалификацията на кадровите ресурси	233
3. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ	234
3.1. Група проекти ЗИ-1: Рехабилитация и модернизирани на градската среда	234
3.2. Група проекти ЗИ-2 Енергийна ефективност и обновяване на производствени сгради	236
3.3. Група проекти ЗИ-3 Заетост, образование и преквалификация.....	239
3.4. Група проекти ЗИ-4: Стимулиране на младите предприемачи.....	240
3.5. Група проекти ЗИ-5 Стимулиране използването на интелигентни и иновативни производствени системи.....	242
3.6. Група проекти ЗИ-6 Реклама и промоция на икономическите дейности	245
4. ДРУГИ ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ИПГВР	247
Приложение №6. Източници на информация.....	261

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АСП	Агенция за социално подпомагане
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ИПГВР	Интегриран план за градско възстановяване и развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.
НИНКН	Националният институт за недвижимо културно наследство
НКПРР	Националната концепция за пространствено развитие
НПЕЕМФЖ	Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
С	сгради
НСИ	Национален статистически институт
ОИЦ	Областния информационен център
ОП	Оперативна програма
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ОПРР	Оперативна програма „Региони в развитие“ 2014-2020
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г
ОПР	Общински план за развитие
ОУП	Общ устройствен план
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПО	Приоритетна ос
ПУП	Подробен устройствен план
РИМ	Регионален исторически музей
СКФ	
УО	Управляващ орган
ФМ на ЕИП	Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

СПИСЪК НА СХЕМИТЕ В ТЕКСТА

Схема 1	Зони за въздействие, съгласно ИПГВР-гр. Велико Търново 2014-2020 г.
Схема 2	Зона „С“ с преобладаващ социален характер
Схема 3.	Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост
Схема 4	Зона „И“ с потенциал за икономическо развитие

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ В ТЕКСТА

Таблица 1.	Приоритетни области на ИПГВР
Таблица 2.	Допълнени проекти в Зона „С“ с преобладаващ социален характер
Таблица 3.	Допълнени проекти в Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост
Таблица 4.	Статус на изпълнение на Инвестиционната програма по ПО1 на ОПРР
Таблица 5.	Други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР
Таблица 6.	Индикатори за въздействие
Таблица 7.	Финансово изпълнение на ИПГВР към декември 2020 г
Таблица 8.	Финансово изпълнение на проектите в Зона за въздействие „С“ с преобладаващ социален характер
Таблица 9.	Финансово изпълнение на проектите в Зона за въздействие „П“ на публични функции с висока обществена значимост
Таблица 10	Финансово изпълнение на ИПГВР към декември 2020 г , Зона за въздействие „И“ с потенциал на икономическо развитие (в хил.лв.)
Таблица 11	Финансово изпълнение други проекти за ИПГВР към декември 2020 г.

Таблица 12	Разпределение на финансовите ресурси по източници
Таблица 13	Финансово изпълнение на ИПГВР към декември 2020 г. по приоритети
Таблица 14	Разпределение на финансовите ресурси по източници

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ В ТЕКСТА

Фигура 1	Процес по разработване, наблюдение и оценката на ИПГВР
Фигура 2.	Подход за финално отчитане изпълнението на ИПГВР
Фигура 3	Обвързаност между главна стратегическа цел и специфичните цели на зоните за въздействие
Фигура 4.	Стратегическа цел и приоритети на ИПГВР - Велико Търново
Фигура 5	Връзка на ИПГВР с различни международни, национални, регионални и общински стратегически и планови документи.
Фигура 6.	Разпределение на проектите от ИПГВР, по зони
Фигура 7	Разпределение на проектите, включени във финалния доклад-отчет на ИПГВР
Фигура 8.	Съотношение по показател „физически напредък на проектите“, включени в ИПГВР на гр. Велико Търново
Фигура 9	Физически напредък проектите в ИПГВР по приоритетни области
Фигура 10.	Съотношение по показател „физически напредък на проектите“ в Зона „С“
Фигура 11.	Физически напредък по групи проекти в Зона „С“
Фигура 12.	Съотношение по показател „физически напредък на проектите“ в Зона „П“
Фигура 13.	Физически напредък по групи проекти в Зона „П“
Фигура 14.	Съотношение по показател „физически напредък на проектите“ в Зона „И“
Фигура 15.	Физически напредък по групи проекти в Зона „И“
Фигура 16.	Разпределение на проекти в ИПГВР по приоритети
Фигура 17.	Планирано финансово разпределение на бюджета на ИПГВР по зони
Фигура 18.	Изпълнение на ИПГВР спрямо общата стойност на планираните инвестиции
Фигура 19.	Финансово разпределение при отчитане на проектите на ИПГВР по зони, вкл. други проекти
Фигура 20.	Финансово изпълнение на ИПГВР към декември 2020 г. по зони за въздействие
Фигура 21.	Финансово изпълнение на Зона за въздействие „С“ (в хил.лв.)
Фигура 22.	Финансово изпълнение на Зона за въздействие „П“ (в хил.лв.)
Фигура 23.	Финансово изпълнение на Зона за въздействие „И“ (в хил.лв.)
Фигура 24.	Разпределение на финансовите ресурси по източници
Фигура 25.	Разпределение на финансовите ресурси по източници и по зони за въздействие
Фигура 26.	Финансово изпълнение на ИПГВР към декември 2020 г. по приоритети
Фигура 27.	Финансово изпълнение на проектите в ИПГВР по приоритети
Фигура 28.	Разпределение на финансовите ресурси по източници и приоритети

ВЪВЕДЕНИЕ



Финалният доклад – отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Велико Търново за периода 2014-2020г. е изготвен в изпълнение на т.5.2. от Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, публикувано на 14.03.2019 г., одобрено със Заповед №РД-02-36-340 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, през втората половина на 2020 г.

Цели

Изготвянето на финалния доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР на град Велико Търново е ориентирано към постигането на следните цели:

- (1) Систематизиране и оценка на резултатите от изпълнението на ИПГВР в периода 2014-2020 г.;
- (2) Включване в матрицата-бюджет на други нови проекти/ проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР;
- (3) Актуализиране на матрицата-бюджет;
- (4) Идентифициране на проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво;
- (5) Формулиране на обосновани препоръки за следващия програмен период.

Обект

Финалният доклад-отчет разглежда устойчивото и интегрирано развитие на град Велико Търново, фокусирано в три типа целеви зони за въздействие, в чиито обхват е включена над 65% от територията на града.

Предмет

Предмет на разработката е интегрираното развитие на град Велико Търново, свързано с изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията, приоритетите и целите на ИПГВР. В доклада са разгледани направените инвестиции по зони за въздействие, както и постигнатите резултати по приоритетни области: икономическо развитие; социална интеграция; качествена градска среда; околна среда; достъпност и самоуправление.

Отчетен период

Финалният доклад-отчет обхваща периода от 2014г. до края на 2020г. За целите на оценката на степента на изпълнение са определени две основни групи: проекти, за които не е отчетен напредък в изпълнението и за които не се предвижда реализация до края на 2023г. и проекти, за които е отчетено изпълнение, като в тях са включени следните категории: „Приключени в периода 2014-2020г.“; „В процес на изпълнение“ и

„Очакващи финансиране до 2023г.“. Включването на проекти, които са в изпълнение и за които се очаква финансиране в групата на изпълнените проекти е обусловено от факта, че основният инструмент за реализация на ИПГВР е Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, която по своята същност представлява средносрочен документ за реализация на планираните проекти по зони за въздействие и е със срок на усвояване на планираните средства до 2023г. В отчета са включени и проекти или части от тях, които са реализирани след 2014г., независимо, че са финансирани в предходния програмен период.

Процес по разработване, наблюдение и оценка на ИПГВР

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново за периода 2014-2020г. е изготвен през 2013г. в изпълнение на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/008, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа на интегрирани планове за градско възстановяване и реализиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“.

ИПГВР е одобрен от Великотърновски общински съвет през 2013г. с Решение №959, прието с Протокол № 59/19.12.2013г.¹ и от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. с писмо с изх.№ 99-00-6-13415/ 20.12.2013г.

ИПГВР на град Велико Търново е публикуван на интернет страницата на общината.²

ИПГВР на град Велико Търново за периода 2014-2020г. е структуриран в три основни раздела:

Част I: Целеви и проблемен анализ

Част II: Стратегия и цели на ИПГВР

Част III: Управление на реализацията/прилагането на ИПГВР

Изброените компоненти са с логическа последователност и взаимна обвързаност, като въз основа на целевия и проблемен анализ е формулирана стратегическа част, а дефинираните подходи и механизми за управление, изпълнение и наблюдение осигуряват практическото осъществяване и постигане на заложените цели.

Обширният целеви и проблемен анализ е обобщен в кратък SWOT анализ, който заедно с резултатите от публични дискусии и анкети извежда аргументите за стратегията на ИПГВР. Нейната структура включва визия и главна стратегическа цел, които се постигат чрез група проекти и дейности, тематично обвързани в 6 приоритета по приоритетни области. Визията и целите изразяват желаното бъдещо състояние на общината, докато приоритетните области представят необходимите усилия на общинската администрация и нейните партньори за постигането на това състояние.

¹ <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obshinski-saver-archive/resheniya/resheniya-ot-2013-godina/resheniya-po-protokol-59-ot-19122013-g-copy/reshenie-959/>

² <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/pravilnici-i-naredbi/planove-i-strategii/integriran-plan-za-gradsko-vzstanovyavane-i-razvitie-na-grad-vel/>

В ИПГВР-гр. Велико Търново са определени три типа целеви зони за въздействие, в чиито обхват са повече от 65% от територията на града. Върху зоните за въздействие приоритетно се осъществява пространствената проекция на Визията за развитие на града и цялостната стратегическа рамка. Формулирането на стратегията се основава на т. нар. „интегриран подход“, при който отделните приоритетни области не са дефинирани като ограничен сектор, а като комплекс от допълващи се теми. По идентичен начин, отделните приоритети и техните проекти създават съвместни резултати и продукти в търсенето на обща добавена стойност за града. Приоритетните области включват мерки, групи проекти и конкретни проекти, които са остойностени и обобщени в матрица бюджет. Неразделна част от документа са и инструментите за управление на реализацията и прилагането на ИПГВР, включително планираните индикатори на наблюдения и оценка.

Фигура 1. Процес по разработване, наблюдение и оценката на ИПГВР



Структура на финалния доклад-отчет

Финалният доклад – отчет за изпълнението на ИПГВР на град Велико Търново за периода 2014-2020г. включва петте елемента, дефинирани в т.5.2. на Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, публикувани на 14.03.2019г., одобрени със Заповед №РД-02-36-340 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, през втората половина на 2020г.:

- (1) Актуализирана матрица-бюджет, в която са включени изискуемите проекти в резултат на извършен преглед на проектите, включени в зоните за въздействие на ИПГВР и идентифицирани други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР;
- (2) Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;
- (3) Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и информацията за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;
- (4) Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;
- (5) Основни изводи и препоръки за следващия период.

Първите четири елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълнението на ИПГВР.

- Първият елемент е обвързан с общ преглед на проектите/проектните идеи в зоните за въздействие, както и идентифицирани към момента на финалното отчитане проекти, които не са включени до момента в ИПГВР. Съгл. указанията това са: всички проектни идеи, които общината е включила в процеса на актуализиране и

допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020 г.; всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014 – 2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР; други нови проекти/ проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР. Систематизирани са всички проекти, като е отчетен техният статус, източникът на финансиране и/или причината поперчила за реализация в рамките на отчетния период.

- При втория компонент - преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана, всички групи проекти са систематизирани по мерки и по приоритети. Идентифицирани са неизпълнени мерки, които не са подплатени с конкретна реализация на групи проекти. Оценена е степента на изпълнение на приоритетните области, като стойностите са обобщени в обща финансова оценка на изпълнението по мерки и приоритети.
- Сравнени са актуалните и целевите стойности на индикаторите от ИПГВР. Преценката на ефективността и ефикасността на изпълнението се аргументира от съотношението между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на целите и приоритетните области на ИПГВР.
- Четвъртият елемент отразява най-важните констатации относно идентифицираните проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, поперчили на изпълнението на ИПГВР. Изводите са базирани на следните основни групи причини: промени на фактически обстоятелства на обектите (собственост; начин на стопанисване; функции на обектите; състояние на сградния фонд); обективна липса или наличие на условия за реализация на проектите: (липса на подходящи сгради/терен; проблеми със собствеността и отчуждавания; проблеми със статута на обектите; отрицателни становища по екологичното законодателство и други); Наличие на финансови ограничения: липса на финансиране; недостиг на общински средства; заемно финансиране; друго финансиране (частни инвестиции); липса на проектна готовност (проектна готовност; възникнала спешност на нуждите и др.

Конкретните препоръки са базирани на изводите и са насочени към процеса на програмиране на следващия програмен период 2021-2027г.

Методика

Изготвянето на финалния доклад – отчет за изпълнението на ИПГВ на гр. Велико Търново 2014 - 2020г. се базира на принципите на системния подход и се ръководи от разбирането, че ИПГВР представлява инструмент за пространствена и времева координация и интеграция на политически усилия и стратегически цели, приоритети и

конкретни мерки и проекти, насочени към устойчиво подобряване условията за живот и бизнес в рамките на градската територия.

Използвани методи

Оценката на ИПГВР е осъществена при спазване на **указанията в Методически насоки за разработване и прилагане на** интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (изменение от март 2019г.)³ За целите на оценката са използвани две основни групи методи: 1) методи за набиране и обработка на данни и 2) методи за обобщение, интерпретиране и анализ на информацията.


Основният метод за набиране и обработка на информацията е документалното проучване, което включва:

- ✓ Проучване на актове, документи, доклади и друга информация – преглед на всички изброени документи, имащи отношение към изпълнението на целите и проектите в ИПГВР,
- ✓ Филтриране на информацията от проучените документи – определяне на каква точно информация ще се ползва от всеки документ и с каква цел;
- ✓ Въвеждане на така филтрираната информация в Програмата за изпълнение на ИПГВР на ниво зона за въздействие, група проекти, проект,
- ✓ Обобщаване на информацията на по-горно ниво,
- ✓ Представяне на обобщената информация в графичен и табличен вид за по-лесно визуализиране и възприемане на резултатите от оценката

Методите за обобщение, интерпретиране и анализ на данните включват:

- ✓ Извършване на експертна оценка по приоритетни области: „Икономическо развитие“, „Социална интеграция“, „Качествена градска среда“, „Околна среда“, „Достъпност“, „Самоуправление“
- ✓ Извършване на количествен и качествен анализ. За целта е използван инструментариум за прилагане на определени критерии (в зависимост от конкретните цели), които характеризират качеството на изпълнението на ИПГВР към неговото финално отчитане.

Приложен подход



Фигура 2. Подход за финално отчитане изпълнението на ИПГВР

Използваният подход за отчитане изпълнението на ИПГВР се базира на структурирано, систематично и итеративно събиране, обработка, обобщение, интерпретиране, анализ и представяне на информацията. Осъществени са основните стъпки, посочени на фигурата.

³ <https://www.mrrb.bg/bg/metodicheski-nasoki-za-razrabotvane-i-prilagane-na-integrirani-planove-za-gradsko-vuzstanovyavane-i-razvitiie-izmenenie-ot-mart-2019-g/>

I. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИПГВР НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2014-2020 г.



1.1. Общи положения

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие, съгл. Допълнителните разпоредби на Закона за регионалното развитие е „стратегия, с която се определят интегрирани действия за справяне с икономическите, екологичните, климатичните, демографските и социалните проблеми в градските райони, като се отчита необходимостта от насърчаване на нови връзки между градските и селските райони, разработена за прилагането на оперативните програми, финансиращи проекти в градовете“.

Според чл.13а на ЗРР, Интегрираният план „осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия“.

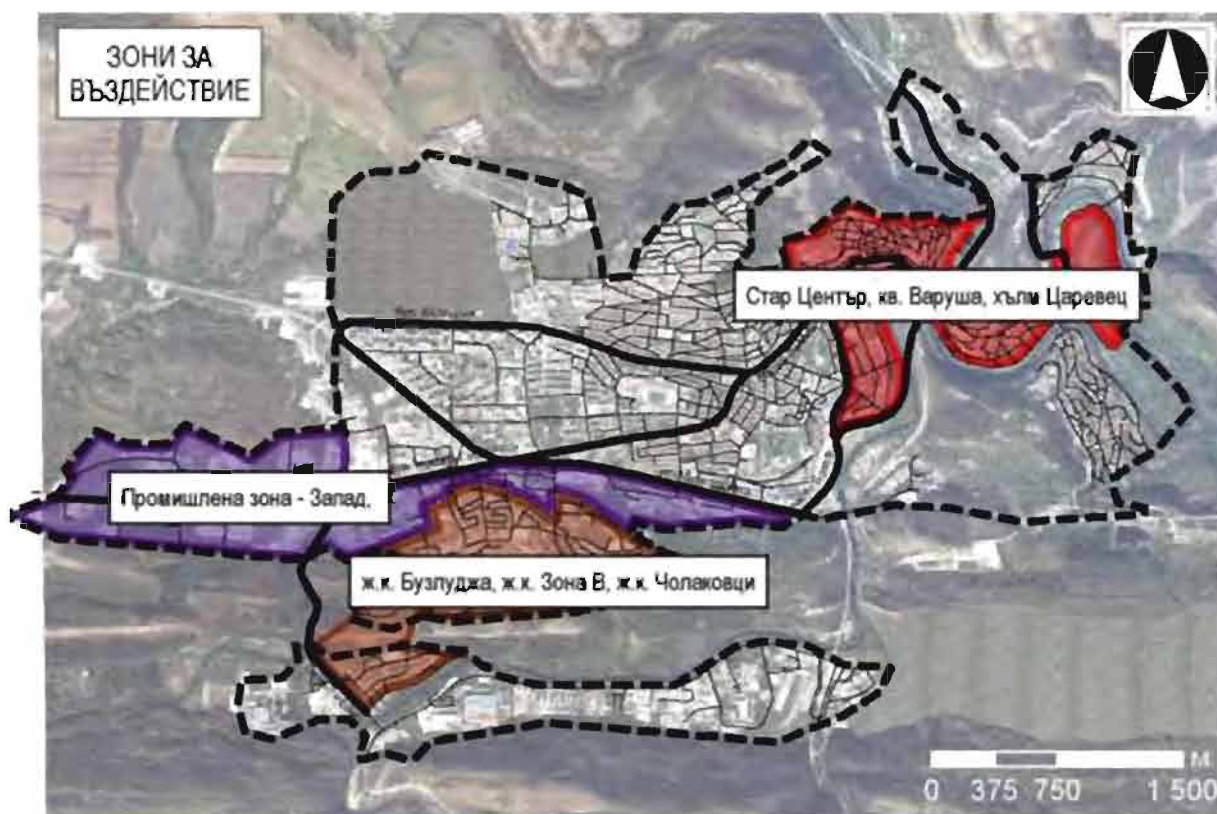


Схема 1. Зони за въздействие, съгласно ИПГВР-гр. Велико Търново 2014-2020 г.

Визия

Визията на ИПГВР на град Велико Търново за периода 2014-2020г. е формулирана на базата на резултатите от целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация; изискванията на нормативните актове в сферата на регионалното развитие; целите и приоритетите на европейските, националните и регионалните планови документи за развитие на регионите, като са взети под внимание както стратегическите предимства на града, така и проблемите и/или ограничаващите фактори за развитие. Отчетени са също

интересите на различните групи заинтересовани страни, а така също и допустимите за финансиране интервенции. Визията е формулирана по следния начин:

Град Велико Търново – привлекателен за хората, интелигентен европейски град, водещ образователен, промишлен, туристически и културен център, с конкурентна икономика, високо качество на живот и съхранена автентична градска среда.

В ИПГВР е посочено, че Визията задава посоката на развитие на града като устойчив, привлекателен, съхранен и конкурентоспособен, като по този начин ще се постигне подобряване на условията за живот, намаляване на вътрешните различия в града. Въздействието, което се очаква в социално-икономическото развитие, е възможно да бъде изпълнено, защото се залага на използване на специфичните особености и ресурси на града при преодоляване на предизвикателства и адаптиране към съвременните условия. Визията отговаря и е съобразена с визиите, целите и приоритетите от европейско национално, регионално и местно ниво, като е насочена към превръщане на град Велико Търново в по - добро място за живеене, работа, отдих и инвестиции. Очакваният резултат от прилагане на визията ще бъде постигнат чрез прилагане на интегриран подход в планирането и управлението на град Велико Търново, който има три аспекта: тясна координация на политики, широко гражданско участие и добро управление.

Зони за въздействие от градската територия

В ИПГВР на град Велико Търново са определени три типа целеви зони за въздействие, в чиито обхват са повече от 65% от територията на града. Съобразно основното им функционално предназначение трите зони за въздействие от градската територия на град Велико Търново са определени като:

- Зона за въздействие „С“ с преобладаващ социален характер ;
- Зона за въздействие „П“ на публични функции с висока обществена значимост;
- Зона за въздействие „И“ с потенциал за икономическо развитие

Стратегическа цел и приоритети

Визията за развитието на град Велико Търново до 2020г. се очаква да се реализира чрез осъществяването на групи проекти/проекти/дейности, насочени към постигането на главната стратегическа цел чрез 6 приоритета по приоритетни области.

Главна стратегическа цел: Съхраняване автентичния облик и превръщане на Велико Търново в интелигентен град - център на икономически разцвет, туризъм и научно-изследователска и развойна дейност.

Главната стратегическа цел съдържа два неделими компонента „съхраняване автентичния облик“ и „превръщане на Велико Търново в интелигентен град“. За изпълнението на визията и главната цел са дефинирани следните приоритети по области на интегрирано планиране:

Приоритет 1. Интелигентна икономика и развитие на научно-изследователска и развойна дейност (Приоритетна област: Икономическо развитие)

Приоритет 2. Висококачествено образование и високи нива на заетост за всички групи (Приоритетна област: Социална интеграция)


Приоритет 3. Привлекателна и съхранена автентична градска среда и културни ценности (Приоритетна област: Качествена градска среда)

Приоритет 4. Устойчиво развитие и опазване на местните ресурси (Приоритетна област: Околна среда)

Приоритет 5. Достъпна среда и усъвършенствана мобилност (Приоритетна област: Достъпност)

Приоритет 6. Благоприятна бизнес среда и добро управление (Приоритетна област: Самоуправление)


За осъществяване на желаната визия за развитието на град Велико Търново и за постигане на дефинираната главна цел и приоритети са определени специфични цели за всяка от трите зони за въздействие

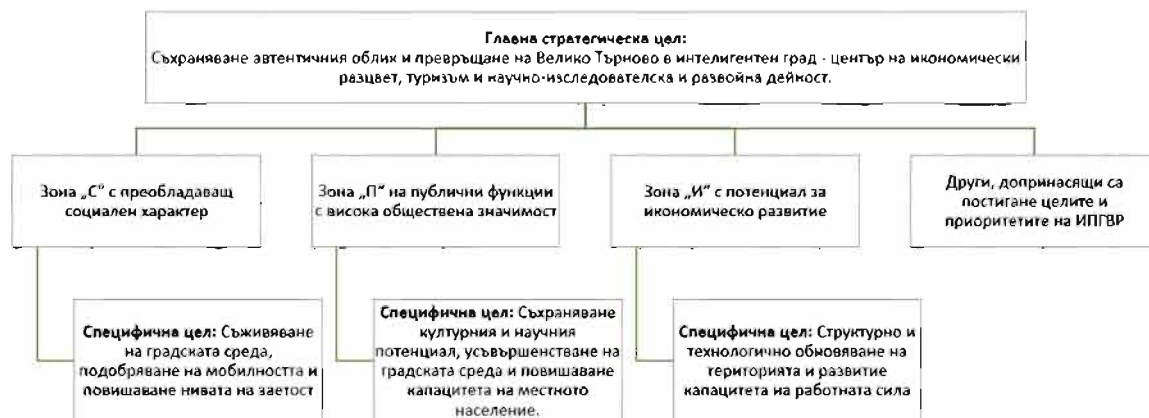

Фигура 3. Обвързаност между главна стратегическа цел и специфичните цели на зоните за въздействие

Специфичните цели за трите избрани зони за въздействие допринасят за постигане на главната цел и приоритетите, чрез конкретни мерки, обезпечени с групи проекти/проекти/дейности

Също така всеки един от определените приоритети се постига чрез мерки в съответната зона за въздействие.

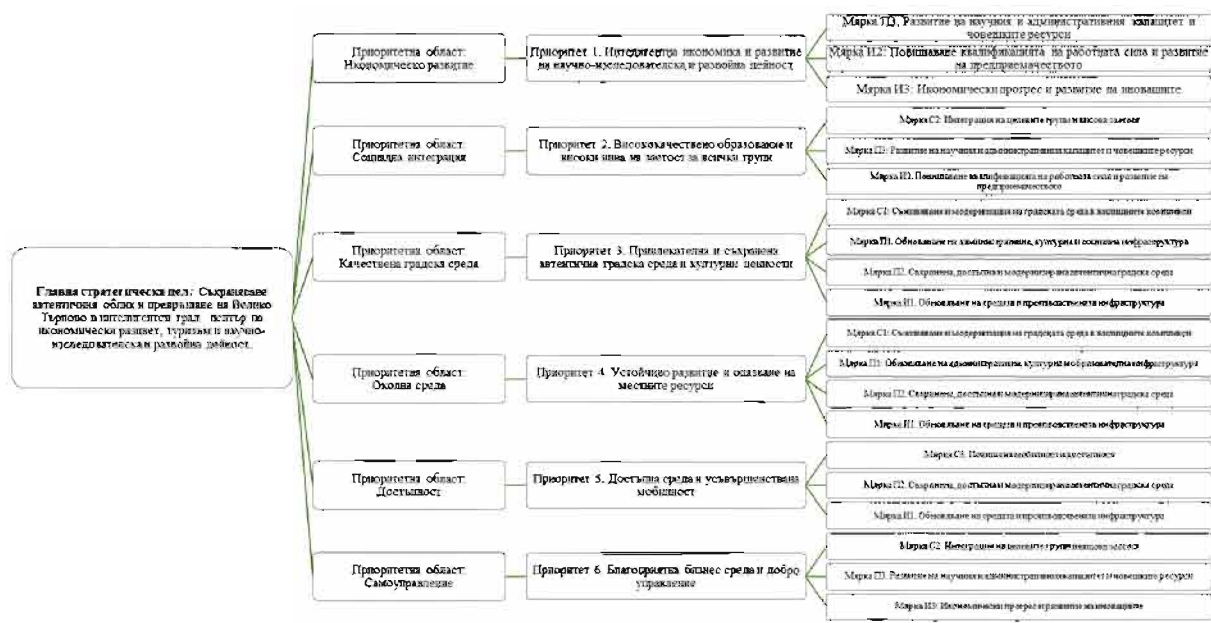

Фигура 4. Стратегическа цел и приоритети на ИПГВР - Велико Търново

За реализиране на политиката за интегрирано планиране и развитие в град Велико Търново, в ИПГВР са включени общо 76 основни проекта, разпределени в зоните за въздействие и обособени по групи проекти. Общата стойност на проектите, включени в ИПГВР възлиза на 344 179 000 лв


Проектите, предвидени за реализиране в ИПГВР се осъществяват с подкрепата на различни източници на финансиране, включително: от Оперативните програми за програмния период 2014-2020, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове; от общинския бюджет; от националния бюджет; със средства от национални програми; с частно финансиране; чрез използването на финансови инженерингови инструменти от други финансови източници.

Финансовата програма за реализация на ИПГВР, включително по зони за въздействие и степената ѝ на изпълнение са представени и анализирани в Раздел III. Преглед на постигнатия напредък

На ИПГВР на град Велико Търново не е правено изменение, което е допустимо съгл. т 4 от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

1.2. Съгласуваност на ИПГВР с релевантни планове и стратегии

ИПГВР на град Велико Търново за периода 2014-2020г е съгласуван с относимите към политиката за териториалното планиране и развитие на града документи. Връзката на ИПГВР със стратегическите и плановите документи на европейско, национално и регионално ниво е визуализирана с фигура.



Фигура 5. Връзка на ИПГВР с различни международни, национални, регионални и общински стратегически и планови документи.

Общоевропейско ниво

Един от основните европейски документи в областта на постигане на устойчиви европейски градове на държавите-членки е Лайпцигската харта за устойчиви градове (2007)⁴ Към момента на изготвяне на настоящия финален доклад-отчет няма приети изменения от датата на приемането на документа, а Проектостановището на Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС от 3 март 2020 г. относно Обновяване на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове (COTER-VI/001) визира периода до 2050г., което е извън времеви обхват на действащия ИПГВР.

Основополагащ документ в пространственото развитие е Европейската перспектива за пространствено развитие (ESDP,1999)⁵, чиито основни цели се изразяват в икономическо и социално сближаване на територията на европейските региони; постигане на балансирана полицентрична система от градове, в които водещи са принципите на устойчиво развитие особено по отношение на околната среда; поставя на преден план балансирана конкурентноспособност на територията на Европа.

Друг основополагащ документ в процеса на планиране и управление на градовете е Декларацията от неофициална среща на министрите в Толедо по въпросите на

⁴ Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове, съгласувана по повод на Неформална среща на министрите, отговарящи за развитието на градските райони и териториална кохезия в Лайпциг на 24 - 25 май 2007 г.; <http://www.bgregio.eu:8080/FC/Editor/UserFiles/File/Leipzig-Charta-AdR-bgl.pdf>

⁵ ESDP – European Spatial Development Perspective (Европейската перспектива за пространствено развитие, приета от СЕМАТ в Потсдам, 1999); https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf

градското развитие (2010)⁶, който е насочен към постигане на по-интелигентно, по-устойчиво и социално включващо градско развитие чрез прилагане на интегриран подход в градските политики, който е един от основните инструменти за постигане на напредък за изпълнение на стратегия „Европа 2020“.

ИПГВР на град Велико Търново за периода 2014-2020 кореспондира със Стратегия „Европа 2020“ (2010 г.)⁷ за насърчаване на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж. В документа се определят конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати през следващото десетилетие, в области като заетостта, образованието, използването на енергия и иновациите, за да бъде преодоляна финансовата криза и да се помогне на Европа отново да поеме по пътя на икономическия растеж. ИПГВР на град Велико Търново е синхронизиран с политиките за повишаване на заетостта, повишаване дела на разходите за научно-изследователска и развойна дейност и повишаване на енергийната ефективност, по-конкретно в Зоната на публични функции с висока обществена значимост (П) и в Зоната с потенциал за икономическо развитие (И).

ИПГВР на град Велико Търново е изготвен през 2013 г. и е приет в края на същата година. В периода на неговото действие общоевропейските документи не са изменени и не са настъпили промени, с които ИПГВР да следва да бъде отново съгласуван.

Национално ниво

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2020 г. (2012)⁸ е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. ИПГВР на град Велико Търново е в съответствие със документа. През периода на действие на ИПГВР документът не е изменен.

ИПГВР на град Велико Търново е в унисон с Националната програма за развитие „България 2020“ (2012)⁹ (НПР БГ2020), която е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. ИПГВР на град Велико Търново е в съответствие със документа, като пряко отражение има в Зоната с преобладаващ социален характер (С): подобряване на достъпа и качеството на образованието, намаляване на бедността и насърчаване на социалното

⁶ Декларация от неофициалната среща на министрите в Толедо по въпросите на градското развитие, Толедо, 22 юни 2010 г., http://www.bgregio.eu:8080/FCSEditor/UserFiles/File/2010%2006%2022%20TOLEDO%20DECLARATION%20approved_revised_bg.pdf

⁷ ЕВРОПА 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2010) 2020 окончателен), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020>

⁸ Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г., приета с Решение № 696 на Министерския съвет от 24.08.2012 г.; <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=772>

⁹ Национална програма за развитие: България 2020, приета с Решение № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г., <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=765>

включване, както и постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал и в Зоната на публични функции с висока обществена значимост (П): укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса. НПРБГ 2020 не е изменяна от датата на приемането ѝ през 2012 г.

В периода на действие на ИПГВР на град Велико Търново релевантните национални стратегически документи не са изменяни и не са настъпили промени, с които ИПГВР да следва да бъде отново съгласуван.

ИПГВР на гр. Велико Търново е релевантен към Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.¹⁰ (НКПРР) е средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие. През 2020г. е документът е актуализиран¹¹. Актуализирането е обвързано с новата Оперативна програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г., като определя териториалната основа за провеждане на държавната политика за регионално развитие, в т.ч. и със средства от европейските фондове. В актуализираната концепция са отчетени действащите стратегически документи на международно равнище в областта на регионалното и пространственото развитие и националните стратегически документи за развитие на секторните и хоризонталните политики. В този смисъл направените промени при актуализацията не са релевантни към изпълнението на действащите ИПГВР и не следва да бъде съгласуван.

Регионално ниво

ИПГВР на гр. Велико Търново кореспондира с Регионалния план за развитие на Северния централен район за периода 2014-2020 г.¹² Същият не е актуализиран от приемането му през 2013 г.

ИПГВР е в съответствие с целите и приоритетите на Областна стратегия за развитие на Област Велико Търново 2014-2020 година¹³, които подкрепят европейските и национални политики, като отразяват специфичните особености на област Велико Търново. Документът не е актуализиран от приемането му през 2013 г.

В периода на действие на ИПГВР на град Велико Търново релевантните стратегически документи на регионално ниво не са изменяни и не са настъпили промени, с които ИПГВР да следва да бъде отново съгласуван.

¹⁰ Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., приета с Протокол № 47.61 на Министерския съвет от 19.12.2012 г.; <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=774>

¹¹ Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година, приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 2020 г. (обн. ДВ, Бр.42 от 12 май); <https://www.eifunds.bg/bg/oprd/node/4554>

¹² Регионален план за развитие на Северния централен район за периода 2014-2020 г., приет с Решение № 461 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.; <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=867>

¹³ Областна стратегия за развитие на Област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., приета с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 13.06.2013 г.; <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=991>

От направения преглед се установи, че проектите, включени в ИПГВР, кореспондират с Програмата за реализация на **Общински план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г. (2014)**¹⁴, чиято основна цел е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският план на Велико Търново е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Велико Търново и действащите устройствени планове. Документът не е актуализиран.

Следва да се отбележи, че ИПГВР е съгласуван и с **Общия устройствен план на Община Велико Търново (2013)**¹⁵, като в процеса на изготвянето му са взети под внимание и одобрени **подробни устройствени планове (ПУП)**.

1.3. Координация и мониторинг на ИПГВР

Община Велико Търново е изградила организационна система за реализиране на проектите, включени в ИПГВР. Системата се състои от: Постоянна работна група за управление и реализация на ИПГВР; Проектни екипи и Междинно звено.

Със Заповед №РД 22-1687/17.08.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново е създадена Работна група за избор на обекти на интервенция от УО на ОПРР обекти в ИПГВР, които да бъдат включени Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР2014-2020.

Работната група се състои от 28 члена, от които 17 са представители на Община Велико Търново, 6 са представители на неправителствения сектор, 3 са от сектор – образование и 1 представител на Областния информационен център – Велико Търново.

Работната група изпълнява дейността си в съответствие с Устройствения правилник на общинската администрация на Община Велико Търново (Заповед №РД 22-1694/18.08.2015г. на Кмета на Община В. Търново) и „Одитна пътека за финансово управление и контрол при осъществяване на функциите по оценка и подбор на проекти, финансирани по ОПРР 2014-2020г. (Заповед № РД 22-295/28.01.2016г.).

Работната група документира работата си чрез протоколи, присъствени списъци, мотивирани доклади и др.

Със заповеди на Кмета на Общината се формират екипи за подготовка на проектните предложения, с които се кандидатства за финансиране. Екипите за изпълнение на даден проект се формират след сключване на Договор за предоставяне на БФП.

В съответствие с чл.7 от Регламент (ЕС) №1301/2013 Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. сключва Споразумение (РД-02-37-26/22.06.2015 г.) с

¹⁴ Общински план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г., приет с Решение № 1136 на Общинския съвет от 28.05.2014 г., <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1125>

¹⁵ Общ устройствен план на Община Велико Търново, Одобен с Решение № 507 от Протокол № 34 от 31.01.2013 г. на Великотърновски Общински съвет, <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/stroitelstvo-i-ustroistvo/obsh-ustrojstven-plan/>

Община Велико Търново за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР2014-2020.

Междинното звено е сформирано със Заповед №РД 22-1594/05 08.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново. Задачите на Междинното звено се изпълняват съгласно Устройствения правилник на общинската администрация на Община Велико Търново (Заповед №РД 22-1694/18.08.2015г. на Кмета на Община В. Търново), сключеното между Община Велико Търново и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Споразумение (РД-02-37-26/22.06.2015 г.), указанията и инструкциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Междинното звено извършва оценка и избор на проекти за изпълнение на стратегията за устойчиво градско развитие. За целите на изпълнението на дейностите за устойчиво градско развитие, Община Велико Търново, в качеството ѝ на местен орган, отговорен за изпълнението на стратегията за устойчиво градско развитие („градски орган“, съгласно чл.7, т.4 от Регламент (ЕС) 1301/2013) разработва инвестиционна програма, която включва единствено мерките от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, които ще бъдат осъществявани чрез Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. Общината е едновременно конкретен бенефициент и Междинно звено по Приоритетна ос 1 на ОПРР2014-2020 и като такава гарантира подходящо разпределение на функциите и отговорностите, с цел предотвратяване на потенциален конфликт на интереси при извършване на оценка и избор на проекти, по смисъла на Споразумението с УО на ОПРР

Със Заповед №РД 22-1595/05 08.2015 г. е определен съставът на служителите в Междинното звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020г.

Законът за регионалното развитие и Правилникът за неговото прилагане¹⁶ не налагат нормативно извършването на междинна оценка на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Отчитането на напредъка по изпълнение на ИПГВР е включвано в ежегодните отчети за изпълнение на Програмата за управление на Община Велико Търново за съответната година.

¹⁶ Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие, приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г., обн. ДВ. бр.80 от 12.09.2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.50 от 01.07.2016 г.

II. ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК



2.1. Обща характеристика на проектите, включени във финалния доклад-отчет на ИПГВР

Оценката на първоначалните резултати се основава на **индикативния списък** на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на град Велико Търново по зони на въздействие (матрица-бюджет); **Инвестиционната програма** по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 (списък с индикативни основни проекти и списък с индикативни резервни проекти); **годишни отчети за изпълнение на Мандатната програма** на кмета на общината за периода 2015-2019 г.; отчети за изпълнението на **Инвестиционната програма** (отчитане на капиталовите разходи) за периода от 2014 до 2019 г. и обобщение на частни проекти и инвестиции с отношение към ИПГВР (информация от ИСУН), статистически данни на НСИ по отрасли по години. Основните източници на информация са допълнени с по-детайлно проучване на единични проекти с оглед точно определяне на тяхното съответствие с приоритетните области и мерки на ИПГВР. Обхванати са четири категории проекти/проектни идеи, съгл. Методическите насоки

- (1) Всички проекти включени в ИПГВР по зони за въздействие;
- (2) Проекти, които са реализирани/ в процес на реализация или с предстоящата реализация, попадащи в зона за въздействие и не са включени в Програмата за реализация, но имат висока степен на съответствие с определените групи проекти и имат принос към мерките на ИПГВР;
- (3) Други нови проекти/ проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.

Във връзка с Методическите насоки следва да се направи следното уточнение, относно изискването на бъдат включени и следните проекти

- Проектни идеи, които общината е включила в процеса на актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020 г

Община Велико Търново последователно изпълнява Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 и не е възниквала необходимост от актуализирането ѝ.

- Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014 – 2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР;

Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти са включени в ИПГВР при неговото разработване и са част от Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.


За целите на оценката на степента на изпълнение са определени две основни групи проекти, за които не е отчетен напредък в изпълнението и за които не се предвижда

реализация до края на 2023г. и проекти, за които е отчетено изпълнение, като в тях са включени следните категории: „Приключени в периода 2014-2020г.“; „В процес на изпълнение“ и „Очакващи финансиране до 2023г.“. Включването на проекти, които са в процес на изпълнение и за които се очаква финансиране, в групата на изпълнените проекти е обусловено от факта, че основният инструмент за реализация на ИПГВР е Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, която е със срок на усвояване на планираните средства до 2023г. В отчета са включени и проекти/ или части от тях, които са реализирани след 2014г., независимо, че са финансирани в предходния програмен период.

Принос към финалния доклад-отчет е систематизирането на всички разгледани проекти/проектни идеи, заедно с посочване на техните основни характеристики. Пълният списък на проектите е част от структурата на настоящия доклад и е представен в преглед на постигнатия напредък на изпълнението на проекти, включени в ИПГВР и идентифицирани други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР на град Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Общо представяне на проектите, включени във финалния доклад-отчет:

Списъкът от проекти, включени в ИПГВР – гр. Велико Търново, съдържа 76 проекта разпределени по зони на въздействие.




Най-много проекти са концентрирани в Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост - 30 бр., което формира 40% от общия брой проекти, включени в ИПГВР. Зона „С“ с преобладаващ социален характер са включени 26 бр. проекти, което представлява 34% от общия брой проекти, включени в ИПГВР.

Фигура 6. Разпределение на проектите от ИПГВР, по зони

В зона „И“ с потенциал за икономическо развитие са предвидени за реализация 20 проекта или 26% от общия брой проекти в ИПГВР.

След направен преглед и съгласно Методическите насоки в оценката на ИПГВР на град Велико Търново са включени общо 109 проекта както следва: проекти в зона „С“: 33 бр.; проекти в зона „П“: 36 бр.; проекти в зона „И“: 20 бр. и други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР: 20 бр.

Най-много проекти са концентрирани в Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост - 36 бр., което формира 34% от общия брой проекти, с които се отчита изпълнението на ИПГВР.

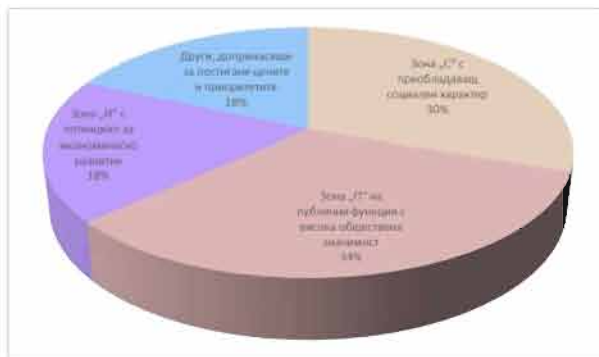

Фигура 7. Разпределение на проектите, включени във финалния доклад-отчет на ИПГВР


Зона „С“ с преобладаващ социален характер са включени 33 бр. проекти, което представлява 30%, в зона „И“ с потенциал за икономическо развитие са предвидени за реализация 20 проекта или 18% и 20 проекта (18%) са други проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ИПГВР.

Оценка на физическия напредък на ИПГВР

Преди да се извърши преглед и да се анализира напредъка по изпълнение на ИПГВР на град Велико Търново, следва да се направят някои уточнения:

- ✓ Характерно е, че в рамките на един проект са включвани по няколко самостоятелни обекти, които са с различен вид собственост, но за целите на настоящия отчет се отчитат като единица.
- ✓ Част от изпълнените проекти включват комплекс от дейности и често обхващат различни зони за въздействие. Поради тази причина извършените дейности са съотнесени към отделни зони за въздействие, там където това е било възможно;
- ✓ Проекти и дейности, извършвани в различни години, но отнасящи се до един обект, се отчитат като единица.
- ✓ При наличие на проекти, изпълнени (изцяло и/или частично) от други организации, но включени в Програмата за реализация, са отчетени там където това е било възможно.

Анализът е извършен на база проектите, включени във финалния доклад-отчет. На фигурата е представено физическото изпълнение на проектите в ИПГВР на град Велико Търново.

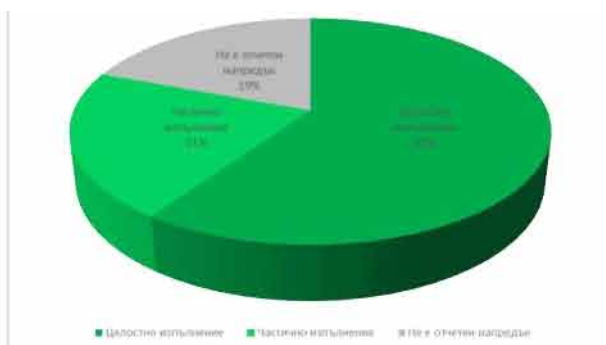

Фигура 8. Съотношение по показател „физически напредък на проектите“, включени в ИПГВР на гр. Велико Търново


В периода 2014-2020 г. 65 проекта (60%) се отчитат като цялостно изпълнени, частично изпълнени са 23 проекта (21%). Към датата на отчета не е отчетен напредък по изпълнението на 21 проекта (19%), като причините са анализирани и представени за всеки един проект.

Пълният списък на проектите е част от структурата на финалния доклад-отчет и е представен в Приложение №1 - Списък с проектите, включени в ИПГВР на град Велико Търново. Тук е направен обзор на резултатите от гледна точка на тяхната принадлежност и насоченост към шестте приоритетни области на ИПГВР:

Таблица 1. Приоритетни области на ИПГВР

Приоритетна област	Зона за въздействие	Обхват
1. Икономическо развитие	П, И	Развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси; повишаване квалификацията на работната сила и развитие на предприемачеството; стимулиране използването на интелигентни и иновативни производствени системи
2. Социална интеграция	С, П, И, Други	Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания; насърчаване на заетостта сред всички групи от населението; повишаване квалификацията на кадровите ресурси;
3. Качествена градска среда	С, П, И, Други	Рехабилитация и модернизирание на градската среда: достъпна архитектурна среда, подобряване безопасността на движението, видеонаблюдение, благоустрояване и изграждане на пешеходни и зелени пространства; опазване и промотиране на културното наследство и туризма; модернизиране на публични пространства и зони за рекреация, детски площадки и др.; обновяване на образователната инфраструктура;
4. Околна среда	С, П, И, Други	Обновяване и енергийна ефективност на административни, жилищни и производствени сгради; на образователна, културна, социална и спортна инфраструктура; подобряване водоснабдяването и качеството на атмосферния въздух;
5. Достъпност	С, П, Други	Достъпна среда и повишена мобилност, реконструкция, рехабилитация, изграждане на улици, пешеходни алеи, тротоари, паркинги; развитие на интегриран градски транспорт и др.
6. Самоуправление	С, П, И	Повишаване на административния капацитет, реклама и промоция на икономическите дейности в подкрепа на бизнеса и др.

Проектите от приоритетна област „Качествена градска среда“ и Приоритетна област „Самоуправление“ отбелязват най-висок ръст при физическия напредък.

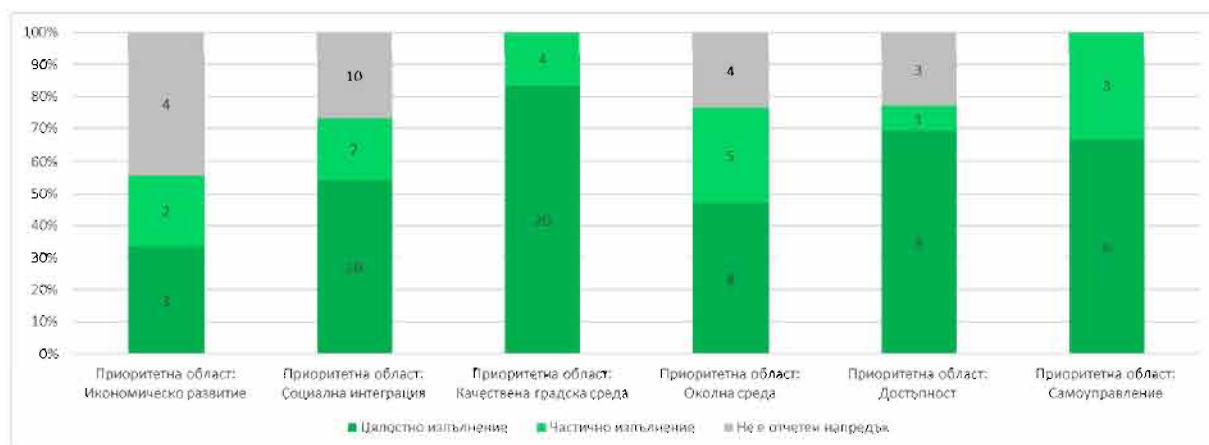


Фигура 9. Физически напредък проектите в ИПГВР по приоритетни области

2.2. Подробно проучване по проектите в Зона за въздействие „С“ с преобладаващ социален характер

Обща информация за Зона „С“

Територията на Зона „С“ (с преобладаващ социален характер) е наситена с проблеми, свързани с обитаването като: лошо състояние на сградния фонд, неизградена градска среда, лошо състояние на техническата и социалната инфраструктура. Очакванията са обновяването на тази зона да допринесе за повишаване на качеството на живот на нейните жители и подобряване на цялостния облик на града.

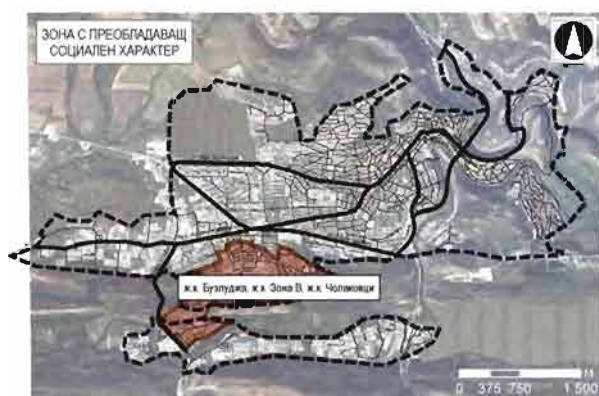

Териториален обхват: ж.к. „Бузлуджа“, ж.к. „Зона В“, ж.к. „Чолаковци“

Площ: 1337 дка, 10% от територията на град Велико Търново

Население: 21 170 души

Проекти в зона „С“: 26 бр.

Схема 2. Зона „С“ с преобладаващ социален характер

Граници: Границата на зоната върви по: ул. „Борис Богданов“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Димитър Благоев“, осова точка 8154, 8159, 8148, 8166, ул. „Стоян Коледаров“, осова точка 8503, регулационната граница на населеното място до осова точка 1942, осова точка 19 в кв. „Чолаковци“, регулационната граница на кв. „Чолаковци“ в посока изток, осова точка 82, ул. „Рада Войвода“ в посока запад, ул. „Сан Стефано“ в посока север, осова точка 94, осова точка 8445 (ж.к. „Бузлуджа“), регулационната граница на населеното място в посока север до ул. „Борис Богданов“.

Обхват и съдържание на проектите в Зона „С“

Проектите в Зона „С“ с преобладаващ социален характер са 26 броя и са обособени в 7 групи. Те са насочени към съживяване и модернизация на градската среда и жилищните комплекси, като се очаква обновяването да допринесе за съживяване на територията и индиректно увеличаване стойността на недвижимите имоти, подобряване екологичното състояние на средата и привлекателността на зоната. Важен акцент са проектите, насочени към интеграция на целевите групи и осигуряване на висока заетост, като очакванията им са, че реализацията ще допринесе за намаляване на социалните неравенства и нарушенията на обществения ред в зоната, както и върху предоставянето на социални услуги, образование и трудова заетост за младежи и възрастни в неравностойно положение, намаляване на бедността и рисковете за населението. Повишаването на мобилността и достъпността е важна тема за развитие на територията, включена в социалната зона.

След направения документален преглед се установи, че през периода 2014-2020 в зоната са реализирани и други проекти, които допринасят за изпълнение на ИПВР, представени в следващата таблица:


Таблица 2. Допълнени проекти в Зона „С“ с преобладаващ социален характер

Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и социална инфраструктура	Проект Зона ЗС-3.1: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на образователна инфраструктура, вкл. обновяване на дворни пространства, детски и спортни площадки, ремонт на огради, видеонаблюдение
	Допълнен Дейност ЗС- 3.1.6Д: Изграждане на нова детска градина в зона „В“ - ДГ „Шарения замък“
Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и спортна инфраструктура	Допълнен ЗС-3.3.4. Възстановяване на църковен храм "Св. Архангел Михаил"
Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания	Допълнен Проект Зона ЗС-4.12Д: „Кризисен център за лица „Търновград“ (ул. „Драган Цончев“ № 8) - ЗОНА В
	Допълнен Проект Зона ЗС-4.13Д: Изграждане и функциониране на три Центъра за наставяване от осмесен тип на територията на град Велико Търново
	Допълнен Проект Зона ЗС-4.14Д: „Бъдеще за всяко дете“ (ул. „Иларнион Драгостинов“ № 3А) - ж.к. „Булзлуджа“
	Допълнен Проект Зона ЗС-4.15Д: „Инвестиция в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново“
	Допълнен Проект Зона ЗС-4.16Д: „И аз имам семейство“
	Допълнен Проект Зона ЗС-4.17Д: „Привеми ме 2015“

При изготвяне на финалния доклад проектите в Зона „С“ с преобладаващ социален характер са 33 броя.

Оценка на физическия напредък


В Зоната с преобладаващ социален характер, включваща ж.к. „Бузлуджа“, ж.к. „Зона В“, ж.к. „Чолаковци“, за изпълнение са предвидени общо 33 проекта, обособени в 7 групи.

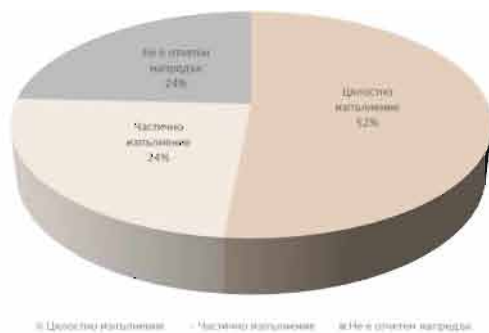

Фигура 10. Съотношение по показател „физически напредък на проектите“ в Зона „С“

Към периода на изготвяне на настоящия финален доклад 52% (17 броя) от проектите, включени в Програмата за реализация в зоната, са изпълнени. Частично са изпълнени 24% (8 броя) от проектите и за токова не е отчетен напредък - при 24% (8 броя) не се отчитат стартирани дейности. Във фигурата е показано физическото изпълнение на проектите в зоната по групи.

Най-голям дял на проектите, по които не е отчетен напредък се пада на Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания. Основната причина е отпадане на необходимостта от тяхната реализация в резултат на прилагане на нов подход в държавната политика в областта на социалните услуги. С Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет е приет План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. След приемане на Плана за действие. Агенция за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на общините в Република България изготвят Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността, които са утвърдени от Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания през месец февруари 2018 година. Конкретните обекти не попадат в списъка с новите социални услуги и не са изпълнени.

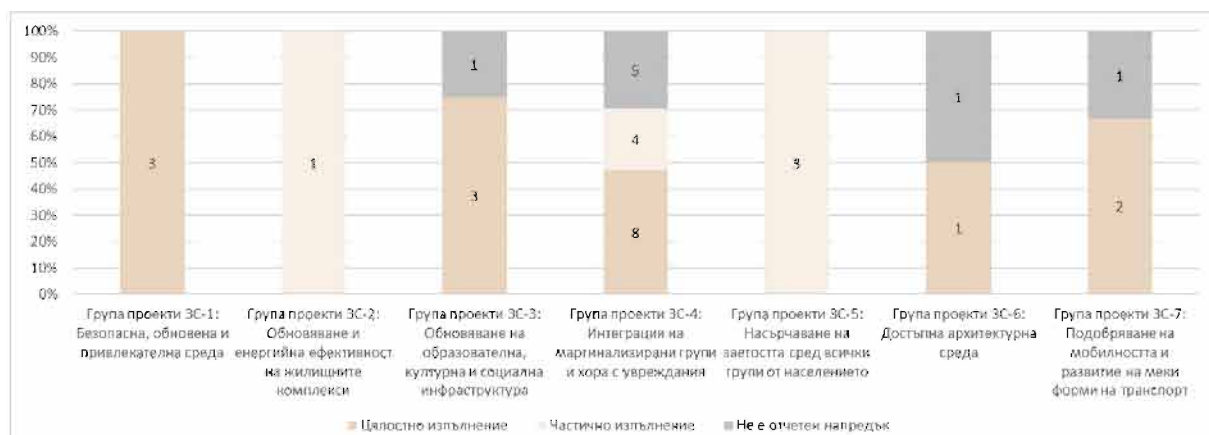


Фигура 11. Физически напредък по групи проекти в Зона „С“

2.3. Подробно проучване по проектите в Зона за въздействие „П“ на публични функции с висока обществена значимост

Обща информация за Зона „П“

В Зона „П“ (на публични функции с висока обществена значимост) са съсредоточени са съсредоточени повечето административни и обществени сгради, недвижимите културни ценности, както и много образователни и културни институции. Потенциалът за растеж на тази територия се дължи на голямото съсредоточаване на икономически дейности за развитие на предприемачеството и услугите, има голямо значение като транспортен възел на града и център за медицински, социални, културни и образователни дейности. Благодарение на тези функции на центъра и тяхното развитие се повишава качеството на живот в града, като се запазва неговата автентичност.

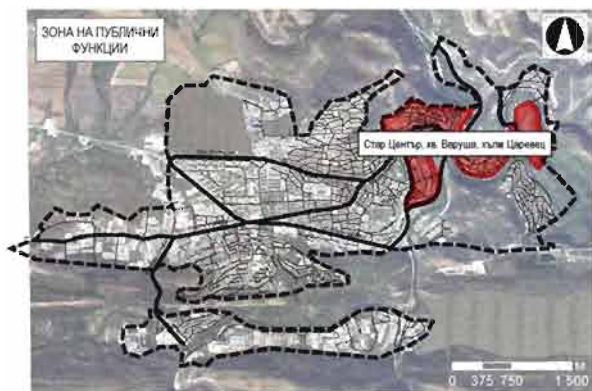

Териториален обхват: Старата градска част, кв. „Варуша“ и хълмът Царевец

Площ: 1270 дка, 9.5 % от територията на град Велико Търново

Население: 4 652 души

Проекти в зона „П“: 30 бр.

Схема 3. Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост

Граници: Границата върви по северната регулационна граница на населеното място, по коритото на р. Янтра, мостът свързващ осови точки 1522 и 1521, ул. „Климент Охридски“ (около хълма Царевец), осова точка 8541, 8540, 8525, 8524, 8523, 8522, 8521, 8543, ул. „Крайбрежна“, осова точка 1312, коритото на р. Янтра, осова точка 3545 (път Е -85), ул. „Христо Ботев“, осова точка 1672, 1671, 179, 180, 182, ул. „Есперанто“, ул. „Константин Кисимов“, осова точка 173, 142, ул. „Руен“, осова точка 838, 456, регулационна граница на населеното място.

Обхват и съдържание на проектите в Зона „П“

Проектите в Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост са 30 броя и са обособени в 9 групи. Те са насочени към обновяване на административна, културна и спортна инфраструктури, вкл. въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и Съхраняване, достъпност и модернизирание на автентичната градска среда чрез модернизирание на публични пространства и зони за рекреация, опазване и промотиране на културно-историческото наследство и туризма, подобряване на мобилността и

развитие на техните форми за транспорт. Проекти са насочени и към развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси.

След направения документален преглед се установява, че в зоната са реализирани и други проекти, които допринасят за изпълнение на ИПГВР. Направените допълнения са представени в следващата таблица:


Таблица 3. Допълнени проекти в Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост

Група проекти ЗП-2: Модернизиране на образователна, културна и спортна инфраструктура	Към Проект Зона ЗП-2.3: Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура, вкл. околното пространство, достъпна среда и видеонаблюдение
	Допълнен ЗП - 2.3.7.Д: Изграждане на система за видеонаблюдение на културна инфраструктура
	Допълнен ЗП-2.3.8.Д „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development“/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576
	Допълнен ЗП-2.3.9.Д Оборудване на културна инфраструктура
	ЗП-2.3.9.1.Д ХГ „Борис Денев“
	ЗП-2.3.9.1.ДД Изложбени зали "Рафаел Михайлов"
Група проекти ЗП-3: Опазване и промотиране на културното наследство и туризма	Проект Зона ЗП-3.1: Експониране и адаптация на културно наследство
	Допълнен ЗП - 3.1.6.Д. Оборудване на РИМ
	Допълнен Проект Зона ЗП-3.5Д: Проект ЗП - CultTour - културно /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм
Група проекти ЗП-5: Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда	Допълнен Проект Зона ЗП-5.8Д: Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012
Група проекти ЗП-7: Повишаване капацитета на местната администрация	Допълнен Проект Зона ЗП-7.3Д: Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020
	Допълнен Проект Зона ЗП-7.4Д: Европейска академия
	Допълнен Проект Зона ЗП-7.5Д: Информационни системи на администрацията
	Допълнен Проект Зона ЗП-7.6Д: Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново

При изготвяне на финалния доклад проектите в Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост са 36 броя.

Оценка на физическия напредък

Видно от горното, в Зоната, включваща Старата градска част, кв. „Варуша“ и АМР Царевец, се оценява реализацията на общо 36 проекта в рамките на 9 групи.

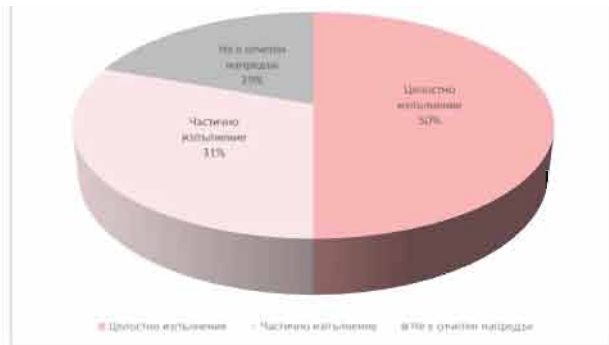

Към периода на изготвяне на настоящия финален доклад 50% (18 броя) от проектите, включени в Програмата за реализация в зоната, са изпълнени изцяло. Частично са изпълнени 31% (11 броя) от проектите, а при 19% (7 броя) не се отчитат стартирани дейности. Във фигурата е показано физическото изпълнение на проектите в зоната по групи.

Фигура 12. Съотношение по показател „физически напредък на проектите“ в Зона „П“

Не е отчетен съществен напредък в Група проекти ЗП-9: Повишаване квалификацията на кадровите ресурси и най-слабо е реализирането на дейностите в Група проекти ЗП-1: Обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради.



Фигура 13. Физически напредък по групи проекти в Зона „П“

2.4. Подробно проучване по проектите в Зона за въздействие „И“ с потенциал за икономическо развитие

Обща информация за Зона „И“

Зона „И“ (с потенциал за икономическо развитие) притежава потенциал за развитие, чрез който е възможно привличането на инвестиции, повишаването на заетостта и конкурентоспособността на града. Очакванията са това да доведе до повишаване на икономическото развитие на целия град чрез превръщането му в център на чистото производство и високи технологии чрез повишен иновационен капацитет.

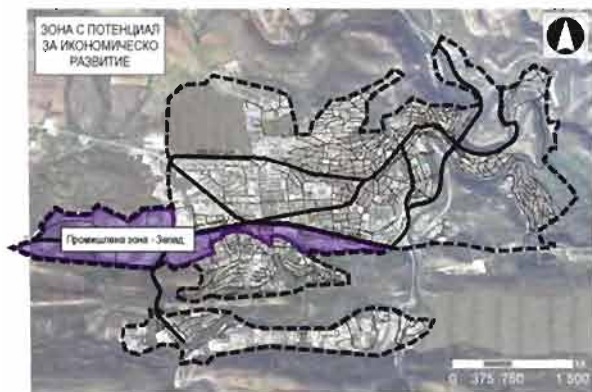


Схема 4. Зона „И“ с потенциал за икономическо развитие

Териториален обхват: Западната промишлена зона, обслужващата зона северно от кв. „Бузлуджа“ и промишлената зона южно от ул. „Магистрална“

Площ: 1795 дка, 13.4% от територията на град Велико Търново

Проекти в зона „И“: 20 бр.

Граници: Границата върви по северната регулационната граница на населеното място, ул. „36-та“, бул. „Никола Габровски“, ул. „Магистрална“, осова точка 3483, 3481, 3479, 160, регулационна граница на населеното място, осова точка 8503, ул. „Стоян Коледаров“, осова точка 8166, 8148, 8159, 8154 ул. „Димитър Благоев“, ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Борис Богданов“, регулационна граница на населеното място

Обхват и съдържание на проектите в Зона „И“


Проектите в Зона „И“ с потенциал за икономическо развитие са 20 броя и са обособени в 6 групи. Насочени са към обновяване на средата и производствената инфраструктура; повишаване квалификацията на работната сила и развитие на предприемачеството и икономическо развитие, вкл. внедряване на иновации.

След направения документален преглед не възникна необходимост от включване на допълнителни проекти.

При изготвяне на финалния доклад проектите в Зона „И“ с потенциал за икономическо развитие са 20 броя.


Оценка на физическия напредък

В Зоната, включваща Западната промишлена зона - обслужващата зона северно от кв. „Бузлуджа“ и промишлената зона южно от ул. „Магистрална“, предвидени за реализация са 20 проекта, обособени в 6 групи проекти.

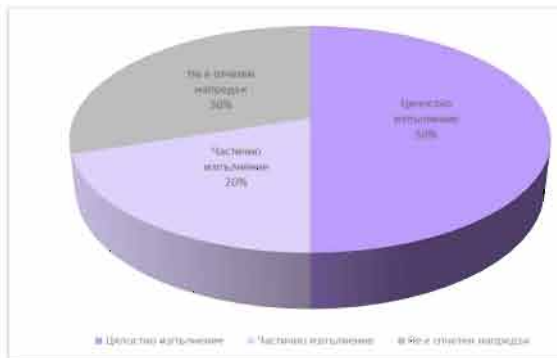

Фигура 14. Съотношение по показател „физически напредък на проектите“ в Зона „И“

Към периода на изготвяне на настоящия финален доклад 50% (10 броя) от проектите, включени в Програмата за реализация в Зоната, са изпълнени. Частично са изпълнени 20% (4 броя) от проектите, а при 30% (6 броя) не се отчитат стартирали дейности. Във фигурата е показано физическото изпълнение на проектите в Зоната по групи.

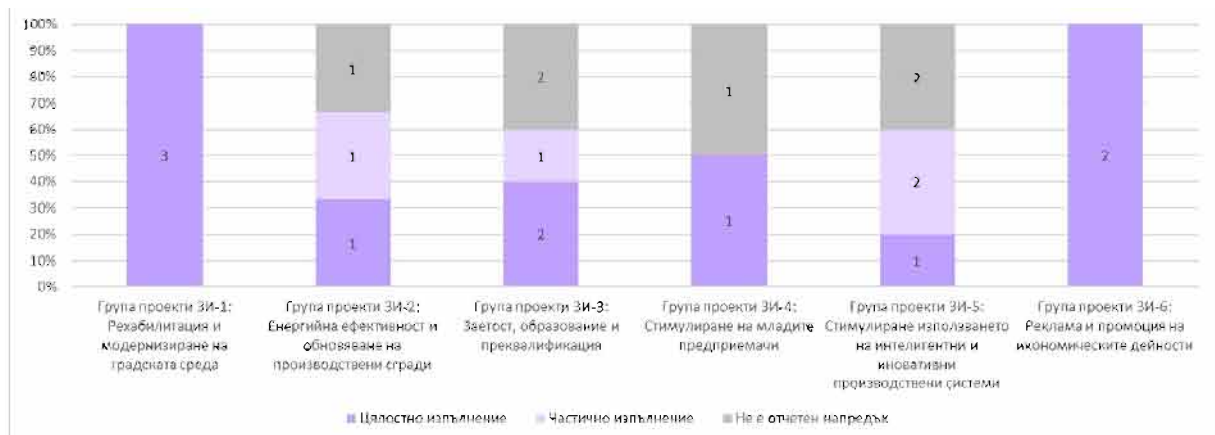

Фигура 15. Физически напредък по групи проекти в Зона „И“

2.5. Проекти в Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020

На 23 март 2016 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Велико Търново се подписва Споразумение за реализация на инвестиционната програма с Регистрационен номер BG16RFO001-1.040-0003-C01 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFO001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Инвестиционни програми“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Инвестиционната програма включва индикативен списък с основни и индикативен списък с резервни проекти за финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и/или чрез комбинирано финансиране – безвъзмездна финансова помощ и финансови

инструменти. Споразумението се отнася за програмния период 2014-2020 и е със срок на действие до 31.12.2023 г.

По своята същност, Инвестиционната програма представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР за финансовата рамка 2014-2020 г. Тя е ключов документ за изпълнение на изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“. С нея се прави естествен и логичен преход между одобрения ИПГВР (който е по-обхванат стратегически документ) и конкретните проекти, за които ще се предостави БФП по ОПРР 2014-2020. Обектите на интервенция в Инвестиционната програма са идентифицирани като проекти в Програмата за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Велико Търново.

Съгласно чл. 4(1) от Споразумението, общият размер на безвъзмездната финансова помощ с интензитет 100%, възлиза на 43 382 875,45 лева.

Максималното общо финансиране за изпълнение на индикативния списък с основни проекти е в размер на 44 688 641,93 лв., като са предвидени и проекти, които се реализират чрез финансови инструменти по линия на ОПРР 2014-2020г.

Община Велико Търново последователно изпълнява Инвестиционната програма и не е възниквала необходимост от актуализирането ѝ.

При извършения преглед на статуса на проектите, включени в Инвестиционната програма по ОПРР се установи, че единствено за проектите от Група дейности „Културна инфраструктура“ предстои стартирането им.

Таблица 4. Статус на изпълнение на Инвестиционната програма по ПО1 на ОПРР

№	Обект на интервенция	Статус
Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“		
1	„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“	В изпълнение
Инвестиционен приоритет „Градска среда“		
Група дейности „Градска среда“		
1	<p>Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново</p> <p>(Проект Зона ЗС-6.1: Подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, вкл. улично озеленяване/ енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (Фаза 1); Дейност ЗП-4.1.1: Площад „Съединение“ - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, проектиране на дъждовна канализация, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане; Проект Зона ЗП-4.2: Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“; Проект Зона ЗП-5.2: Градска среда в старата градска част - Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане; Дейност ЗП-5.6.1: Реконструкция на обществени</p>	Приключен

	паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала; Дейност ЗП-5.7.1: Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ №29)	
Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“		
1	Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона (Проект Зона ЗИ-1.1: Рехабилитация на улици и тротоари, изграждане на паркинги, шумоизолираща зеленина, съоръжения за намаляване на скоростта по основни транспортни артерии, огради, енергийно ефективно осветление и осветени пътеки, видеонаблюдение)	Приключен
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“		
Група дейности „Социална инфраструктура“		
1	Развитие на социалната инфраструктура в град Велико Търново (Проект Зона ЗС-4.3: Изграждане на Кризисен център за лица)	Приключен
Група дейности „Културна инфраструктура“		
1	Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - Изграждане на Експозиционен център (Фаза 1) (Проект Зона ЗП-3.2: „Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, културно - информационен център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище	Планиран
2	Разширение на “Мултимедиялен посетителски център „Царевград Търнов“	В изпълнение
3	Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ (Дейност ЗП-2.3.3: Музей „Възраждане и Учредително събрание“)	В изпълнение
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“		
1	Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново (Дейност ЗС-3.1.1: ДГ „Ален мак“; Дейност ЗС-3.1.2: ДГ „Рада войвода“; Дейност ЗС-3.1.4: СУ „Владимир Комаров“; Дейност ЗС-3.1.4: СУ „Г. С. Раковски“ и спортно училище; Дейност ЗП-2.1.5: ДГ „Пролет“)	Приключен

В случай на свободен финансов ресурс от общия размер на БФП след сключване на договори за БФП на основните проекти или при увеличаване на общия размер на БФП, с наличните средства могат да бъдат финансирани проекти, включени в индикативния резервен списък в Инвестиционната програма.

2.6. Проекти за финансиране с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020

Трите проекта в обхвата на ИПГВР, които се предвижда да се реализират с финансови инструменти попадат в Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост

и са включени в Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, Група дейности „Културна инфраструктура“:

1. Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище-Изграждане на Експозиционен център (Фаза 1) (Проект Зона ЗП-3.2: „Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, културно - информационен център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище
2. Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ (Проект Зона ЗП-3.4: Проектиране и разширяване на Мултимедийния център на ул. „Пиколо“, административната сграда на РИМ);
3. Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ (Дейност ЗП-2.3.3: Музей „Възраждане и Учредително събрание“)

2.7. Други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИЦГВР

В оценката на плана са включени нови 20 проекта извън зоните за въздействие, но допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИЦГВР. Представени са в следващата таблица:

Таблица 5. Други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИЦГВР

Група проекти Д-1: Обновяване и енергийна ефективност на МФЖС и обществени сгради	Проект Д-1.1.: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси
Група проекти Д-2: Обновяване на образователната инфраструктура	<p>Проект Д-2.1. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“ (Обект 1. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Велико Търново“; Обект 2. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново“.</p> <p>Проект Д-2.2. „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“ (ПГ по електроника „Александър С. Попов“ - Велико Търново; ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Велико Търново; ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“)</p> <p>Проект Д-2.3. „Изграждане на детска градина в кв. „Картала“, гр. Велико Търново</p>

	<p>Проект Д-2.4. „Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев“ за осигуряване на едносменен режим на обучение - гр. В. Търново“</p> <p>Проект Д-2.5. „Реконструкция на сграда на ОУ „Бачо Киро“ - гр. Велико Търново за осигуряване на едносменен режим на обучение“</p> <p>Проект Д-2.6. Модернизация на образователната инфраструктура на ДГ „Първи юни“</p> <p>Проект Д-2.7. Модернизация на образователна инфраструктура, вкл. дворни пространства, достъпна среда и видсонаблюдение</p>
Група проекти Д-3: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания	Проект Д-3.1. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД““
	Проект Д-3.2. „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ (ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3)
	Проект Д-3.3. „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ (с. Церова кория)
	Проект Д-3.4. „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ (ул. „Симеон Велики“ № 3)
	Проект Д-3.5. „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14“
	Проект Д-3.6. „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ село Церова кория, общ. Велико Търново
	Проект Д-3.7. „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Церова Кория“
	Проект Д-3.8. „Реновация и модернизация на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с. Церова Кория
	Проект Д-3.9. „Вътрешно преустройство на съществуващата сграда на Домашен социален патронаж - гр. Дебелец, общ. Велико Търново“
	Проект Д-3.10. Други инвестиции за социална инфраструктура извън зоните за въздействие
Група проекти 4: Свързаност и достъпност	Проект Д-4.1. „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“, чрез общи мерки в трансграничния регион“
	Проект Д-4.2. Осигуряване функционална свързаност на периферията със зоните за въздействие

III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ



3.1. Анализ и оценка на проектите от гледна точка целите и приоритетите на ИПГВР

Проектите, включени в ИПГВР са относими към конкретни приоритетни области и приоритети, чрез които се постига главната стратегическа цел на ИПГВР.

Приоритетна област	Зона за въздействие	Обхват
Икономическо развитие	Ц, И	Развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси; повишаване квалификацията на работната сила и развитие на предприемачеството; стимулиране използването на интелигентни и иновативни производствени системи
Социална интеграция	С, П, И, Други	Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания; насърчаване на заетостта сред всички групи от населението; повишаване квалификацията на кадровите ресурси;
Качествена градска среда	С, П, И, Други	Рехабилитация и модернизиране на градската среда: достъпна архитектурна среда, подобряване безопасността на движението, видеонаблюдение, благоустрояване и изграждане на пешеходни и зелени пространства; опазване и промотиране на културното наследство и туризма; модернизиране на публични пространства и зони за рекреация, детски площадки и др.; обновяване на образователната инфраструктура;
Околна среда	С, П, И, Други	Обновяване и енергийна ефективност на административни, жилищни и производствени сгради, на образователна, културна, социална и спортна инфраструктура; подобряване водоснабдяването и качеството на атмосферния въздух;

Достъпност	С, П, Други	Достъпна среда и повишена мобилност, реконструкция, рехабилитация, изграждане на улици, пешеходни алеи, тротоари, паркинги; развитие на интегриран градски транспорт и др.
Самоуправление	С, П, И	Повишаване на административния капацитет, реклама и промоция на икономическите дейности в подкрепа на бизнеса и др.

Приоритетна област


Приоритет

Икономическо развитие	1. Интелигентна икономика и развитие на научно-изследователска и развойна дейност
Социална интеграция	2. Висококачествено образование и високи нива на заетост за всички групи
Качествена градска среда	3. Привлекателна и съхранена автентична градска среда и културни ценности
Околна среда	4. Устойчиво развитие и опазване на местните ресурси
Достъпност	5. Достъпна среда и усъвършенствана мобилност
Самоуправление	6. Благоприятна бизнес среда и добро управление

- Най-много проекти и инициативи са планирани в приоритетна област „Социална интеграция“, Приоритет 2. Висококачествено образование и високи нива на заетост за всички групи – 37 броя, която съсредоточава усилията за подобряване на социалната сфера, интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания, изграждане на необходимата инфраструктура и подобряване образованието, квалификацията, професионалната реализация и заетост според нуждите на пазара на труда.

- В приоритет област „Качествена градска среда“, Приоритет 3. Привлекателна и съхранена автентична градска среда и културни ценности е предвидена реализацията на 24 проекта, които обединяват по няколко самостоятелни обекта, дефинирани като дейности.

- Приоритетна област „Околна среда“, Приоритет 4. Устойчиво развитие и опазване на местните ресурси обхваща реализацията на 17 проекта, насочени към въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователни, социални и административни обекти, многофамилни жилищни сгради и производствени предприятия.

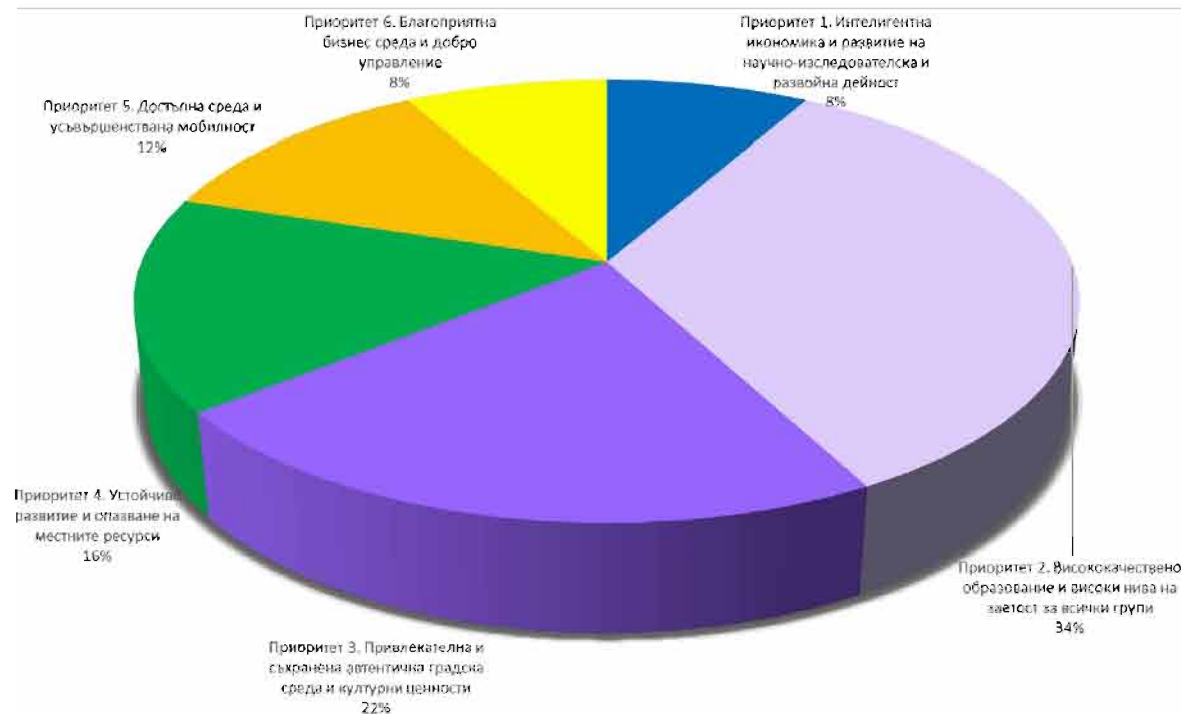

Фигура 16. Разпределение на проекти в ИПГВР по приоритети

- Приоритетна област „Достъпност“, Приоритет 5. Достъпна среда и усъвършенствана мобилност се изпълнява чрез 13 проекта, насочени към развитие на интегриран градски транспорт, създаване на достъпна архитектурна среда в урбанизираната територия.
- Приоритетна област „Икономическо развитие“, Приоритет 1. Интелигентна икономика и развитие на научно-изследователска и развойна дейност е експонирана върху 9 проекта, ориентирани към стимулиране на научните изследвания, дигитализация, въвеждане на иновативни производствени системи – проекти, които са извън допустимостта на общинската администрация за осигуряване на финансирането им.
- Приоритетна област „Самоуправление“, Приоритет 6. Благоприятна бизнес среда и добро управление включва изпълнението на 9 проекта, ориентирани както към повишаване на местния административен капацитет, така и към реклама и промоция на икономическите дейности. *Информацията за обхвата на конкретните приоритети, мерки и проекти е представена в Приложение №1 - Стисък на проектите в ИПГВР по приоритети и мерки.*

3.2. Отчитане актуалните стойности на индикаторите на ИПГВР

Постигнатата степен на изпълнение и ефективността е извършена въз основа на дефинираните индикатори за оценка и наблюдение. На лице са две предварителни условия, които предопределят възможността за извършаване на оценка на ИПГВР на гр. Велико Търново -

1. Дефинираните индикатори следва да отговарят на минималните изисквания. Те трябва да имат стойности, които посочват изходното състояние, както и целеви стойности за постигане на набелязаните цели.

2. Да са налични данни за постигнатите физически резултати от изпълнените проекти.

Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие определят три вида индикатори:

- ✓ индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които ще се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот – подобрени инфраструктурни елементи, обновени многофамилни жилищни сгради, брой нови социални жилища, икономия на топлинна и електроенергия (MWh) от прилагане на мерки за енергийна ефективност и др.;
- ✓ индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект – тук влизат показатели като брой публични обекти с улеснен достъп за лица с увреждане, площ (ха) на новоусвоените терени в реновирани производствени зони, брой новоразкрити работни места, в обновените производствени и/или създадени производствени зони и др.;
- ✓ индикатори за въздействие, свързани с въздействието върху развитието на територията – нови работни места, увеличена производителност, повишено качество на здравното обслужване, социални грижи, образование, култура, интегриране на групите в неравностойно положение, относителен дял на населението на града положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР, нарастване на частта от населението, облагодетелствано от подобрен транспортен достъп и др.

Анализът на системата от индикатори показва, че в голяма степен изискванията за видовете индикатори са спазени в разработения ИПГВР на гр. Велико Търново.

Измерването на степента на изпълнение и ефективност зависят от предварително поставените цели.

Изводът, който се налага по отношение на индикаторите, че липсват базови стойности, които да поставят реална база за постижимостта на изпълнение. Отчитайки тези фактори, при извършване на оценката са разгледани настъпилите промени по определени показатели, където това е било възможно, като са съблюдавани следните обстоятелства:

- ✓ Наличие на връзка със заложените проекти;
- ✓ Възможност за количествено измерване на промяната;
- ✓ Наличие на официална, достоверна и проверяема информация;
- ✓ Възможност за определяне на изходна база;
- ✓ Възможност за оценка на ефектите от изпълнението на мерките, дейностите и проектите.

Вторият основен фактор за извършване на оценка по отношение на степента на постигане на целите и ефективността, а именно, наличието на данни за постигнат физически напредък се отразява в извършеното задълбочено анализиране на всеки един от проектите в ИПГВР.

Независимо от срещнатите трудности се положиха усилия за събиране на допълнителни данни на база приключилите проекти (където имаше възможност), за да отчете постигнатия напредък.

Отчитане на актуалните стойности на индикаторите за измерване на целите и приоритетите от ИПГВР е представено в Таблица 6 по-долу. Сравнението между базовите, целевите и постигнатите стойности позволява втори подход за преценка на степента в реализацията на ИПГВР. Разгледани са индикаторите с достоверен източник на информация към момента на изготвяне на финалния доклад-отчет: отчети по проекти и справки от Община Велико Търново, ИСУН, НПЕЕМФЖС, НСИ, като данните от последния са към 2018г. и за някои от индикаторите са направени собствени изчисления, поради невъзможността им да бъдат обезпечени с категоричен информационен източник. Постигнатите стойности показват висока степен на изпълнение за целите и приоритетите на ИПГВР. Част от индикаторите са представени с натрупване за целия период от 2014-2020г.

Таблица 6. Индикатори за въздействие

Области на интегрирано планиране	Индикатори		Мерна единица	Базова стойност 2013 г.	Целева стойност (2022)	Постигната стойност (2020)	Степен на изпълнение
	Категория индикатор	Индикатор					
Икономическо развитие	Индикатори за резултат	Инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност	млн. лв.	0	2 754	8 625	313.18%
		Брой модернизирани производствени сгради	брой	0	20	15	75,00%
	Индикатори за въздействие	Ръст на приходите в местната икономика %	%	0	35	30	85,71%
		% от населението засегнат от подобрената икономическа база	%	0	35	30	85,71%
	Индикатори за използваните ресурси /	Брой работни места, създадени в подпомагани предприятия	брой	0	3 000	150	5%

	синергичен ефект/	Брой посещения на подпомогнатата туристическа инфраструктура	брой	0	600 000	1 071 000	179%
		% на новоусвоените терени в реновираните производствени зони	%	0	28	10.00	36%
		Брой новоразкрити работни места в обновени производствени територии	брой	0	3 000	150	5%
Социална интеграция	Индикатори за резултат	Капацитет на подпомаганите образователни услуги и грижи за деца		4 000	4 500	4 500	100,00%
		Брой новоизградени центъра за настаняване от семеен тип	брой	0	6	9	150,00%
	Индикатори за въздействие	Брой пътувания чрез използване на подпомагани услуги на градския транспорт	брой	0	4 000 000	3 147 683	78.69%
		Брой хора преминали професионално обучение (вкл. квалификация и преквалификация)	брой	0	5 940	6 120	103,03%
	Индикатори за използваните	Брой публични обекти с улеснен достъп	брой	0	41	58	141,46%

	ресурси /синергичен ефект/	за лица с увреждания					
		% успешно интегрирани хора ползващи обновена образователна инфраструктура	%	0	4 500	10 514	233,64%
Качествена градска среда	Индикатори за резултат	Брой обновени публични пространства	брой	0	10	28	280,00%
		Брой обновени многофамилни жилищни сгради	брой	0	179	18	10,06%
	Индикатори за въздействие	Брой домакинства с подобро енергийно потребление	брой	0	21 480	1 728	8,04%
	Индикатори за използваните ресурси /синергичен ефект/	Брой посещения на подпомаганите културни обекти	брой	0	600 000	1 071 000	178,50%
Околна среда	Индикатори за резултат	Брой зелени площи с приложени мерки за устойчиво развитие	брой	0	2	15	750,00%
		Брой изпълнени проекти за подобряване на екологичните условия	брой	0	4	13	325,00%
	Индикатори за въздействие	Относителен дял на територията с подобрени	%	0	60	63	105,00%

		екологични параметри /%/					
	Индикатори за използваните ресурси /синергичен ефект/	Брой предприятия с въведени екоиновации и повишена ресурсна ефективност	брой	0	20	38	190%
Достъпност	Индикатори за резултат	% на подобрена достъпност	%	0	55	60	109%
		Км обновена улична мрежа	км	0	16	19	114%
	Индикатори за въздействие	Нарастване на частта от населението, облагодетелствано от подобрен транспортен достъп /%/	%	0	55	70	127%
		Нарастване броя на лицата с физически увреждания, ползващи МОПТ за ежедневни пътувания (%)	%	0	40	42	105%
		Нарастване на частта от населението, ползващо МОПТ за ежедневни пътувания (%)	%	0	30	32	107%
		Индикатори за използваните ресурси /синергичен ефект/	Брой публични пространства с улеснен достъп за лица с увреждания	брой	0	10	15

Самоуправление	Индикатори за резултат	Повишен инвестиционен интерес %	млн. лв	0	75	140	187%
		Брой хора от местната администрация, преминали курсове за преквалификация и обучения	брой	0	600	706	118%
	Индикатори за въздействие	% от населението ползващ подобреното обслужване в местните административни структури	%	0	68	86	126%
	Индикатори за използваните ресурси /синергичен ефект/	Икономия на труд, оборудване и финанси в местните административни звена %	%	0	71	55	77%



IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Настоящата оценка проверява два аспекта:

- (1) доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати (цели, приоритетни области и завършени проекти от Програмата за реализация на ИПГВР) – ефективност;
- (2) доколко начинът за изпълнение на ИПГВР се основава на добро управление на ресурсите – ефикасност.

Оценката на ефективността е определена и в други раздели на настоящия документ с разглеждането на следните фактори:

- (1) изпълнение на проекти по зони за въздействие (Раздел II. Преглед на постигнатия напредък),;
- (2) изпълнение на проекти по мерки и приоритети (Раздел III. Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите);
- (3) причини за неизпълнение на индикативни проекти (Раздел V. Проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво“;

В този раздел е представена степента на финансовото изпълнение на проектите по зони за въздействие; степента на изпълнение на приоритетните области според финансовото им отчитане; степента на изпълнение на целите и приоритетите според индикаторите на ИПГВР.


В резултат на извършения анализ е изготвена и актуализираната матрица – бюджет на ИПГВР на гр. Велико Търново.

Представено е обобщение на ефективността общо за ИПГВР, както и от гледна точка на начина за използване на достъпните финансови и наличните организационни ресурси в Община Велико Търново.

4.1. Анализ на финансовото изпълнение на ИПГВР по зони за въздействие

Финансово изпълнение на проектите общо за ИПГВР по зони за въздействие

Общата стойност на проектите, включени в ИПГВР възлиза на 344 179 000 лв., разпределени за реализиране на проектите в трите зони за въздействие.

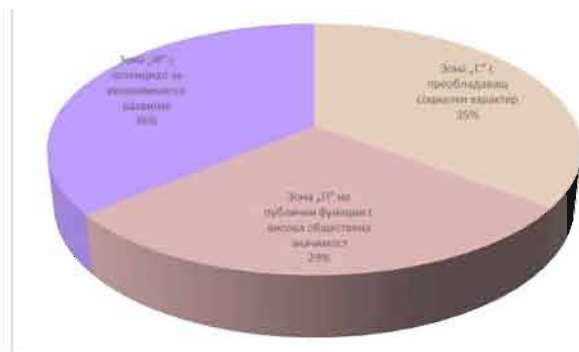


Зоната с най-голям обем планирани инвестиции е Зоната за въздействие „I“ с потенциал за икономическо развитие - над 124 милиона лева. В Зоната за въздействие „C“ с преобладаващ социален характер е предвидена реализацията на финансов ресурс в размер над 121 милиона лева.

Фигура 17. Планирано финансово разпределение на бюджета на ИПГВР по зони

Най-малко средства са предвидени да се концентрират в Зоната за въздействие „П“ на публични функции с висока обществена значимост – близо 99 милиона лева.

ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР Е 66% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПЛАНИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ.

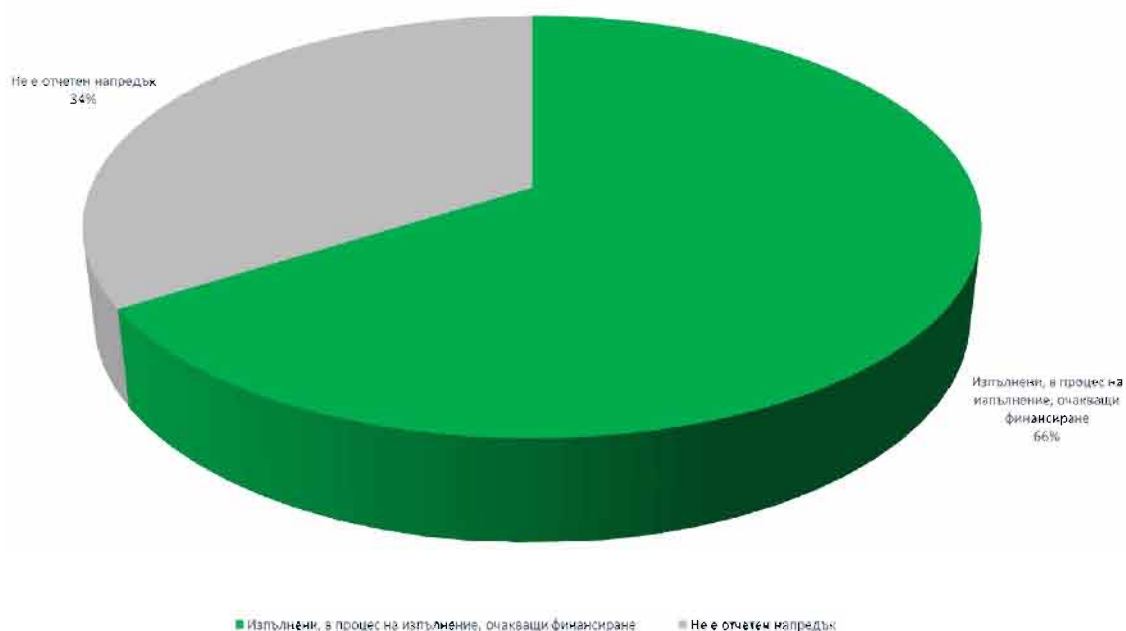

Фигура 18. Изпълнение на ИПГВР спрямо общата стойност на планираните инвестиции


Таблица 7. Финансово изпълнение на ИПГВР към декември 2020 г.

Зона въздействие	Планирана стойност в ИПГВР	Изпълнена стойност към .12.2020	Изпълнение
			(в хил. лв.)
Зона за въздействие „С“, с преобладаващ социален характер	121 254	65 886	54,34%
Зона за въздействие „П“ на публични функции с висока обществена значимост	98 517	63 009	63,96%
Зона за въздействие „И“ с потенциал за икономическо развитие	124 408	49 171	39,52%
Общо ИПГВР	344 179	178 066	51,74%
Други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР		49 059	
Общо Финален доклад	344 179	227 125	65,99%

От направения преглед на матрицата – бюджет на приетия ИПГВР през 2014г. е видно, че е предвидено почти всички средства да се осигурят от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Въпреки наличието на проекти, които са изцяло на частни бенефициенти, не е предвидено финансовото им обезпечаване. Финансовият план не предвижда подкрепа на инвестиционната програма от други донори, дарения, национални програми или частни инвеститори. Напр. за проектите, свързани с

енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради в зона „С“ и зона „П“, като източник на средствата са посочени СКФ, а съфинансирането се предвижда да бъде от бюджета на общината. Идентична е ситуацията и с проекти в икономическата зона насочени за подобряване енергийната ефективност на производствени сгради, внедряване на иновациите, квалификация на персонала и т.н. Това предопределя невъзможността за финансиране на такива проекти.


Като цяло, използваният основен инструмент за реализацията на ИПГВР е процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BC16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по която Община Велико Търново е конкретен бенефициент.

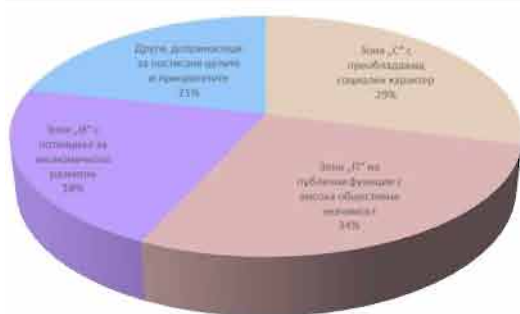

Фигура 19. Финансово разпределение при отчитане на проектите на ИПГВР по зони, вкл. други проекти

Задълбочен преглед и анализ на финансовото изпълнение на Програмата за реализация на ИПГВР на град Велико Търново показва, че към декември 2020г. финансовото изражение на всички групи проекти, реализирани или в процес на реализация, от трите зони за въздействие е 227 125 141,20 лв., представляващо 65,99% от бюджета на ИПГВР.

По отношение на зоните за въздействие, най-голям напредък е постигнат в Зона за въздействие „П“ на публични функции с висока обществена значимост. За реализиране на проектите, включени в нея, са разходвани средства в размер на 63 009 064,03 лв.

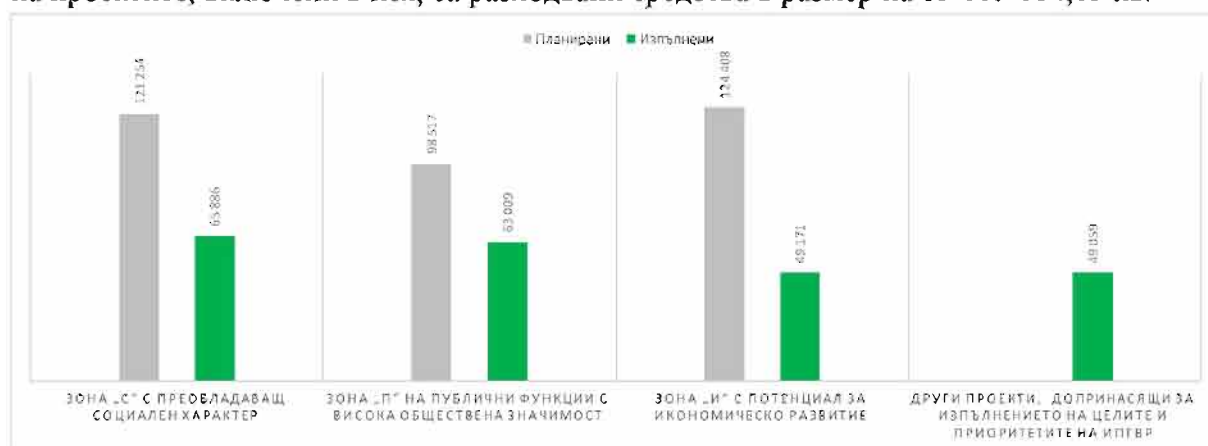

Фигура 20. Финансово изпълнение на ИПГВР към декември 2020 г. по зони за въздействие

На следващо място по усвояемост на програмираните средства са проектите от Зона за въздействие „С“ с преобладаващ социален характер. За тяхното реализиране са разходвани средства в размер на 65 886 298,84 лв., което представлява 54,34% от

предвидените ресурси. В Зона за въздействие „И“ с потенциал за икономическо развитие се отчита нисък процент на усвоените средства – 49 170 9754,70 лв., което представлява 39,52%.

Финансово изпълнение на проектите в Зона „С“

Предвидените инвестиции в зона „С“ са на обща стойност над 121 милиона лева.

ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА „С“ Е 54,34% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПЛАНИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ.

Таблица 8. Финансово изпълнение на проектите в Зона за въздействие „С“ с преобладаващ социален характер


Група проекти в Зона „С“ с преобладаващ социален характер	Планирана стойност в ИПГВР	Изпълнена стойност към .12.2020	Изпълнение
	(в хил. лв.)		%
Група проекти ЗС-1: Безопасна, обновена и привлекателна среда	23726	20455	86,21%
Група проекти ЗС-2: Обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси	54300	7380	13,59%
Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и социална инфраструктура	3772	13016	345,07%
Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания	20758	9732	46,88%
Група проекти ЗС-5: Насърчаване на заетостта сред всички групи от населението	8325	2104	25,27%
Група проекти ЗС-6: Достъпна архитектурна среда	4403	1954	44,37%
Група проекти ЗС-7: Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт	5970	11246	188,38%
Обща стойност	121 254	65 886	54,34%

Най-голям напредък във финансовото изпълнение от проектите, включени в Зона „С“, се наблюдава в Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и социална инфраструктура. В групата са включени 3 проекта, като най-мощният от тях е Проект Зона ЗС-3.1: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на образователна инфраструктура, вкл. обновяване на дворни пространства, детски и спортни площадки, ремонт на огради, видеонаблюдение със следните обекти: детските градини „Ален Мак“ и „Рада Войвода“, средните училища „Вела Благодеева“, „Георги Сава Раковски“ и Спортно училище „Г. Живков“, и „Владимир Комаров“. Съществен дял за финансовото изпълнение има и допълнения обект – изграждането на нова детска градина „Шарения замък“ в зона „В“. За реализирането на проектите са вложени малко над 12 милиона лева. Детайлен анализ показва, че голям напредък във финансовото изпълнение на проекти се наблюдава при тези, свързани с подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт, като е включен проекта за интегриран градски транспорт, имащ общоградско значение. За реализирането на проектите, свързани градската мобилност са програмирани малко над 11 милиона лева.

Голям принос за напредъка имат реализираните инфраструктурни проекти за създаване на безопасна, обновена и привлекателна градска среда в ж.к. „Чолаковци“, ж.к. „Зона В“ и в ж.к. „Бузлуджа“, като през периода са разходвани около 86, 21% от планираните средства - близо 20,5 милиона лева.

По-малко ресурси са усвоени за интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания в Зона „С“ - 46,88%. Нереализирани инфраструктурни проекти са за над 14 милиона лева. Основната причина е, че отпада необходимостта от изграждане на предвидените обекти, поради промяна в държавната политика по отношение на вида и типа на социални услуги и посочените в ИПГВР не са включени в Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността, утвърдени през месец февруари 2018 година, в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приета с Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет.

Най-малък дял от предвидените инвестиции са усвоени в Група проекти ЗС-2: Обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси – близо 14%, като инициативата за реализиране на този тип проекти следва да е на собствениците на частни имоти.

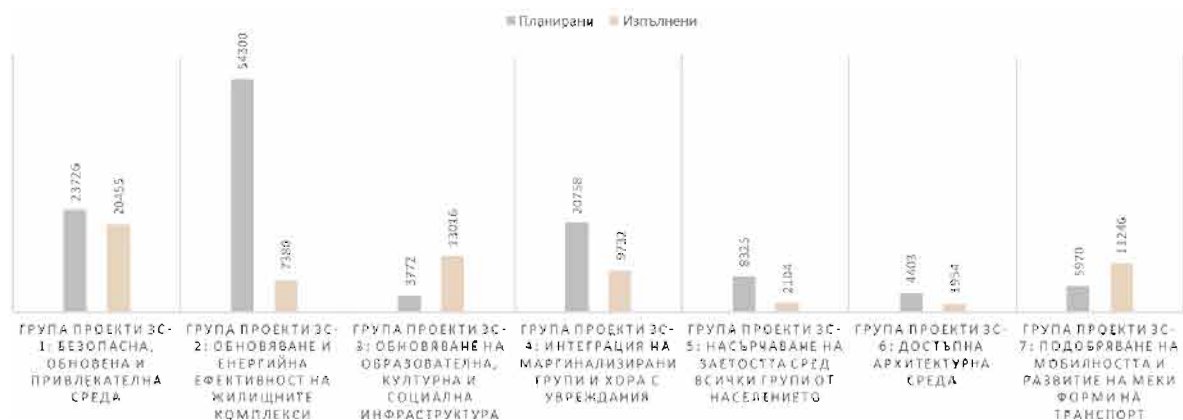

Фигура 21. Финансово изпълнение на Зона за въздействие „С“ (в хил.лв.)

Финансово изпълнение на проектите в Зона „П“

Предвидените инвестиции в зона „П“ са на обща стойност от близо 99 милиона лева.

ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА „П“ Е 63,96% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПЛАНИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ.

Зоната „П“ на публични функции с висока обществена значимост е с най-малък планиран бюджет, но с най-голям брой проектни предложения. Най-голям напредък във финансовото изпълнение има при реализацията на проектите, насочени към опазване на културното наследство и туризма и модернизирането на публични пространства и зони за рекреация.

Ключовият проект е изграждането на обекти на терена на Старото военно училище, като основен обект е изграждането на Експозиционен център, представляващ мултифункционална сграда. Към момента на изготвяне на настоящия финален доклад-отчет, реално са изпълнени дейностите свързани с подготовка за реализация на мащабната инвестиция: подробен устройствен план, проектиране, подготовка за изграждане на комуникационната и техническа инфраструктура. Предстои подписване на договора с финансовия посредник и одобрение на проекта за БФП и реализиране на инвестицията. Стартираи проекта за разширяване на Мултимедийния център "Царевград Търнов". И двата проекта са включени в Инвестиционната програма по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма регионално развитие 2014-2020.

Таблица 9. Финансово изпълнение на проектите в Зона за въздействие „П“ на публични функции с висока обществена значимост

Група проекти в Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост	Планирана стойност в ИПГВР	Изпълнена стойност към .12.2020	Изпълнение
	(в хил. лв.)		%
Група проекти ЗП-1: Обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради	6 590	114	1,74%
Група проекти ЗП-2: Модернизирани на образователна, културна и спортна инфраструктура	9 070	9 799	108,03%
Група проекти ЗП-3: Опазване и промотиране на културното наследство и туризма	15 210	31 738	208,67%
Група проекти ЗП-4: Модернизирани на публични пространства и зони за рекреация	517	1 434	277,34%
Група проекти ЗП-5: Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда	51 693	16 278	31,49%
Група проекти ЗП-6: Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт	1 450	1 002	69,10%
Група проекти ЗП-7: Повишаване капацитета на местната администрация	6 023	2 117	35,15%
Група проекти ЗП-8: Повишаване на образователното равнище и стимулиране на научния капацитет	3 514	527	15,01%
Група проекти ЗП-9: Повишаване квалификацията на кадровите ресурси	4 450	0	0,00%
Обща стойност	98 517	63 009	63,96%


Проектите, насочени към модернизирани на публични пространства и зони за рекреация имат голям принос за финансовото изпълнение на програмираните средства чрез реализацията на мащабния инфраструктурен проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, финансиран от ОПРР 2014-2020.

През разглеждания период сериозни инвестиции от страна на Община Велико Търново са направени в образователната инфраструктура: обновяване, енергийна ефективност, благоустрояване на дворните пространства, достъпна среда, видеонаблюдение, подобряване на материално техническата база на ДГ „Пролет“ и Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Ботев“ В тези обекти са вложени над 2,7 милиона лева. По линия на Министерство на образованието и науката са инвестирани над 713 хиляди лева в Старопрестолна професионална гимназия по икономика.

През периода не е отчетено разходване на средства за планираните обекти от спортната инфраструктура. Реализирането на инвестиции в спортен комплекс „Юнак“ не е осъществено поради факта, че обектът попада в част от територията на Старо военно училище, като през периода са извършвани процедури, свързани с устройственото планиране.

1,74% е процентът на разходвани средства за проектите, насочени към обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради и многофамилни жилищни сгради по главните улици на Стария град. Основните причини са: липса на проектна готовност, вкл. съгласуване на проектите с Националният институт за недвижимо културно наследство; инициативата за реализиране на проектите следва да е на собствениците на сградите, както и липса на възможност за финансиране на посочените обекти.

Не е отчетен финансов напредък при проектите за повишаване квалификацията на кадровите ресурси, което е от компетентността на частни инвеститори и към момента на изготвяне на настоящия доклад такава информация липсва.

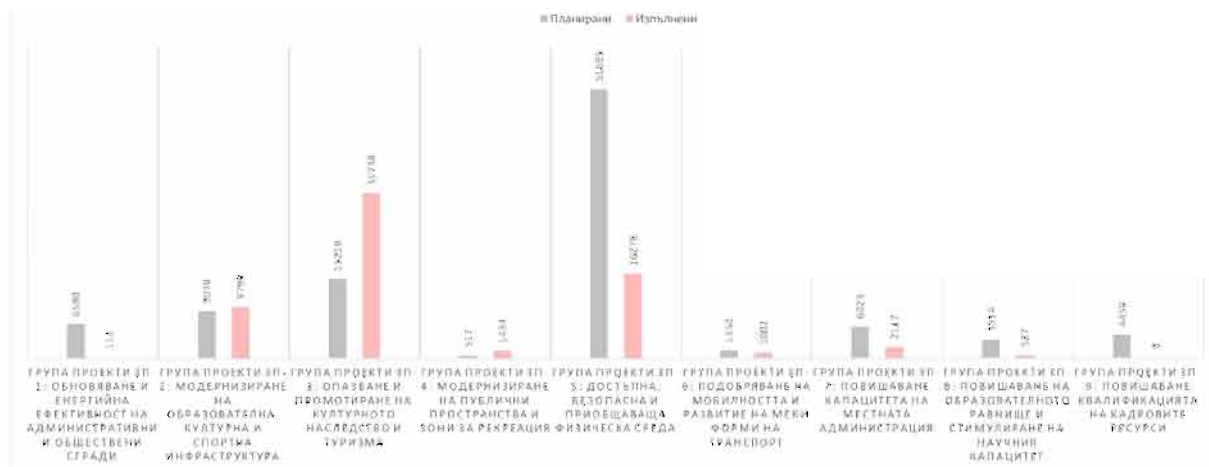

Фигура 22. Финансово изпълнение на Зона за въздействие „П“ (в хил.лв.)

Най-голямата нереализирана инвестиция от 44 милиона лева в публичната зона е за проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Велико Търново - II част“, който е включен в ИПГВР през 2013 г. на база Решение №379/30.08.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г., с което е одобрено проектното предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.“ по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2007-2013г. Одобреното финансиране е размер на 38 153 162,68 лв. от които 30 522 530,14 лв. от Кохезионния фонд на ЕС и 7 630 632,54 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет и от общинския бюджет. В решението е отбелязано, че при липса на финансиране по ОПОС 2007-2013 и възможност съгласно нормативната уредба, да бъде предоставена БФП от Кохезионния и/или структурните фондове на ЕС за програмен период 2014-2020.

При изпълнението са посочени средствата за основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, получени по Споразумения за предоставяне на средства №РД-02-30-84/20.12.17г. и №РД-02-30-12/18.04.2018г., изменено с Допълнително споразумение №1 РД-02-30-12(1) от 18.09.2018г. и Допълнително споразумение №2 РД-02-30-12(2) от 19.12.2018г., между МРРБ и Община Велико Търново.

Финансово изпълнение на проектите в Зона „И“

Предвидените инвестиции в зона „И“ са на обща стойност малко на 126 милиона лева.

ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНА „И“ Е 39,52% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПЛАНИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ.

Таблица 10. Финансово изпълнение на ИПГВР към декември 2020 г., Зона за въздействие „И“ с потенциал на икономическо развитие (в хил.лв.)

Група проекти в Зона „И“ с потенциал за икономическо развитие	Планирана стойност в ИПГВР	Изпълнена стойност към 12.2020	Изпълнение
	(в хил. лв.)		%
Група проекти ЗИ-1: Рехабилитация и модернизиране на градската среда	6 568	3 052	46,47%
Група проекти ЗИ-2: Енергийна ефективност и обновяване на производствени сгради	45 795	21 958	47,95%
Група проекти ЗИ-3: Заетост, образование и преквалификация	13 840	2 962	21,40%
Група проекти ЗИ-4: Стимулиране на младите предприемачи	605	653	107,91%
Група проекти ЗИ-5: Стимулиране използването на интелигентни и иновативни производствени системи	54 200	19 423	35,84%
Група проекти ЗИ-6: Реклама и промоция на икономическите дейности	3 400	1 123	33,02%
Обща стойност	124 408	49 171	39,52%

Най-голям напредък във финансовото изпълнение от проектите, включени в Зона „И“, се наблюдава при обученията за управленски екип за организация и управление на проекти, услугите – информационни, експертни, комуникационни и логистични с цел гарантиране на равен и лесен достъп до информация и насърчаване активността на потенциални бенефициенти, предоставяни на бизнеса от Областния информационен център (ОИЦ) - Велико Търново. Получената изцяло безвъзмездна финансова помощ е на стойност близо 653 хиляди лева.

Съществен принос за финансовото изпълнение имат реализираните проекти на частния бизнес, финансирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР).

Община Велико Търново реализира над 3 милиона инвестиции за рехабилитация и модернизиране на градската среда в зоната.



Фигура 23. Финансово изпълнение на Зона за въздействие „Н“ (в хил.лв.)

Финансово изпълнение на други проекти, допринасящи за постигане целите и приоритетите на ИППГВР

След извършен задълбочен анализ на проектите, реализирани от Община Велико Търново през периода 2014-2020г., принос за финансовото изпълнение на ИППГВР имат и т.нар. други проекти, допринасящи за постигане целите и приоритетите на ИППГВР. Те са на стойност над 49 милиона лева.

Таблица 11. Финансово изпълнение други проекти за ИППГВР към декември 2020 г.

Група проекти в Други проекти, допринасящи за изпълнението на целите и приоритетите на ИППГВР	Изпълнение към декември 2020 (в хил. лв.)
Група проекти Д-1: Обновяване и енергийна ефективност на МФЖС и обществени сгради	9 432
Група проекти Д-2: Обновяване на образователната инфраструктура	15 632
Група проекти Д-3: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания	8 242
Група проекти Д-4: Свързаност и достъпност	15 753
Обща стойност	49 059

Актуализирана матрица – бюджет на ИППГВР

При актуализацията на матрицата бюджет на ИППГВР на град Велико Търново са спазени Методическите насоки, като е отразено и обстоятелството, че при разработване на матрицата-бюджет през 2014г. са посочени индикативни проекти и индикативни стойности. В актуализираната матрица бюджет са посочени стойностите на реализирани проекти, проекти в процес на изпълнение, както и на планирани, очакващи да получат финансиране и да бъдат отчетени до 31.12.2023г.


Стойността на актуализираната матрица – бюджет е 227 125 000 лева.

Разпределение на финансовите ресурси по източници по зони за въздействие

Разпределението на стойността по източници на финансиране показва доброто комбиниране на различни форми на финансиране. През отчетния период, Община

Велико Търново и останалите участници в общинското развитие са привлекли, кандидатствали и осигурили средства за реализиране на проектите на ИПГВР от следните източници:

- (1) Средства от структурните и инвестиционни фондове на ЕС;
- (2) Собствени средства, вкл. за съфинансиране;
- (3) Републикански бюджет
- (4) Национални програми
- (5) Други инвестиционни фондове
- (6) Частни инвеститори

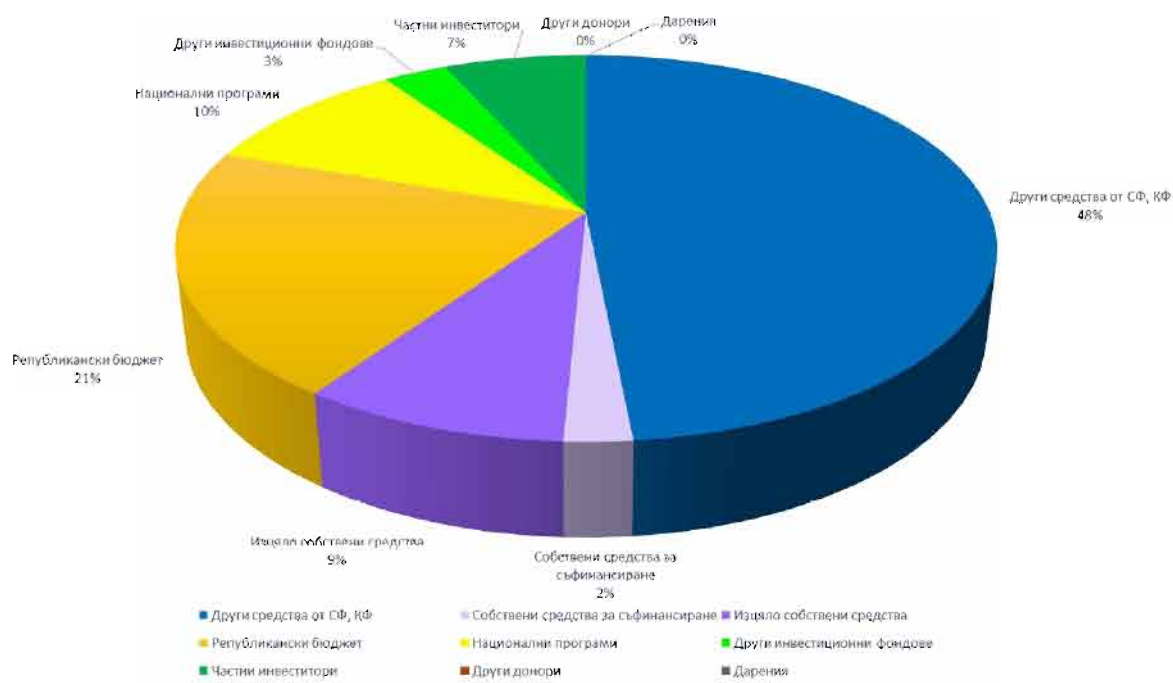

Фигура 24. Разпределение на финансовите ресурси по източници

Най-голям дял от 48% достигат получените средства от структурните и инвестиционни фондове на ЕС. Стойността на европейското финансиране за проекти в град Велико Търново е в размер на 110 091 897,46 лв., получени както от общинската администрация, така и от частния бизнес. Европейските средства в размер на близо 40% са осигурени чрез Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020. Допълнително са привлечени средства, както от действащите оперативни програми в България, така и по трансгранични програми, програми за международно сътрудничество (INTERREG), програми на Европейската комисия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), участие на общината като партньор в много международни проекти и др. Община Велико Търново успешно разработва, кандидатства и печели европейски проекти на конкурентен принцип. И това е резултат от високата експертиза в полето на управление на европейски средства на администрацията, високия професионален опит и отдаденост на експертите в общинската администрация, пряко ангажирани с работата по проекти.

Вторият по големина източник на финансиране е Републиканския бюджет – 21%. За изпълнение на проекти в ИПГВР в град Велико Търново са изразходвани средства в размер на 46 922 860,27 лева, вкл. осигуреното националното съфинансиране на проекти с европейско финансиране. Сериозен е финансовият ресурс получен чрез постановления на Министерски съвет за реализиране на инвестиционни проекти за качествено подобряване на техническата инфраструктура и изграждане на нова. С целеви субсидии от централния бюджет са реализирани и се реализират проекти като: изграждане на нова детска градина в зона „В“ - ДП „Шарения замък“, изграждане на техническа инфраструктура, ремонти на обекти от образователната инфраструктура и др.

Чрез кандидатстване с проекти по различни национални програми, предимно в сферата на инфраструктурата, социалната политика и образованието, е осигурен финансов ресурс в размер на 22 790 630,74 лева, който формира 10% от средствата за проекти, включени в ИПГВР.

Таблица 12. Разпределение на финансовите ресурси по източници

Източник на финансиране/зона за въздействие	Зона „С“	Зона „П“	Зона „И“	Други	Общо	Относителен дял на различните източници на финансиране, %
Общо	65 886	63 009	49 171	49 059	227 125	100%
Други средства от СФ, КФ	34 176	29 846	27 986	18 084	110 092	48,47%
Собствени средства за съфинансиране	802	1 954	131	2 248	5 135	2,26%
Изцяло собствени средства	1 125	17 566	488	1 028	20 207	8,90%
Републикански бюджет	18 821	12 407	5 333	10 362	46 923	20,66%
Национални програми	8 744	0	0	14 047	22 791	10,03%
Други инвестиционни фондове	2 220	1 235	0	3 290	6 745	2,97%
Частни инвеститори	0	0	15 233	0	15 233	6,71%
Други донори	0	0	0	0	0	0
Дарения	0	0	0	0	0	0

Сериозен дял във финансовото изпълнение на ИПГВР има частният бизнес на град Велико Търново, който успешно реализира проекти с европейско финансиране, насочени към подобряване на конкурентоспособността, повишаване квалификацията и осигуряване на заетост, енергийна ефективност на производствени бази. Близко 7% е финансовият ресурс, който малките, средните и големите предприятия от града са вложили като съфинансиране, явяващ се над 15 милиона лева.


Изразходените собствени средства на общината за периода 2014-2020г. достигат 25 341 948 лева, от които 5 135 229,25 лева са за съфинансиране на проекти с европейско финансиране. Съществен дял от останалите средства са използвани за капиталови разходи на общината, включително обновяване и ремонт на публични сгради общинска собственост, закупуване на оборудване и обзавеждане за различни образователни и социални обекти. Разходването им за обекти, включени в ИПГВР е осигурено чрез Инвестиционната програма на общината за съответната календарна година.

Изцяло собствени средства приоритетно са програмирани за инвестиране в зона за въздействие „П“ на публични функции с висока обществена значимост. За реализирането на 3 големи проекта, свързани с развитието на културната инфраструктура Община Велико Търново инвестира собствен ресурс в размер на близо 2,5 милиона лева, които се осигуряват чрез финансов инструмент. Това са:

- Проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище-Изграждане на Експозиционен център“ (Фаза 1) с обща стойност на проекта 14 248 105,50 лв., от които 7 048 105 лв. безвъзмездна финансова помощ от ОПРР 2014-2020 и 7 200 000 лв. финансиране от финансов инструмент по линия на ОПРР 2014-2020.

- Проект Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, с обща стойност 1 302 577,31 лв., от които 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ и 905 641,00 лв., в т.ч. 51 820,00 лв. собствено финансиране от община Велико Търново и 853 821,00 лв. – финансиране от финансов инструмент по линия на ОПРР 2014-2020.

- Проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ с обща стойност 2 850 760,62 лв., от които 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ и 799 361,26 лв., в т.ч. 68 420,00 лв. – собствено финансиране от община Велико Търново и 730 941,26 лв. – финансиране от финансов инструмент по линия на ОПРР 2014-2020.

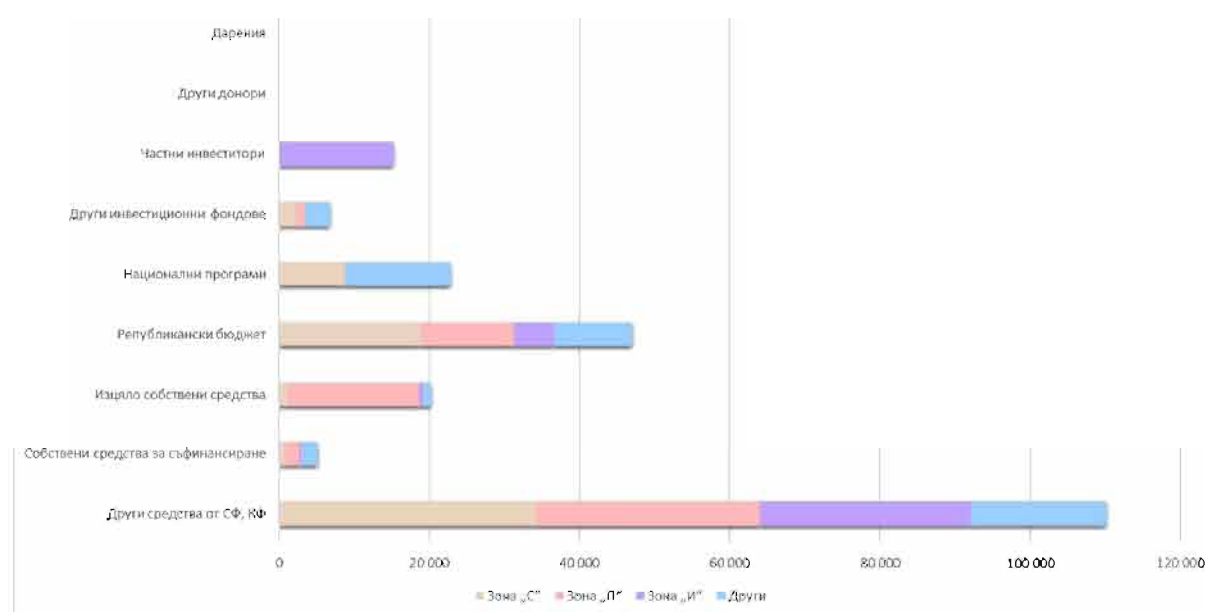


Фигура 25. Разпределение на финансовите ресурси по източници и по зони за въздействие

4.2. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси по приоритети

В настоящата раздел е разгледано финансовото изпълнение на ИПГВР по 6-те приоритета, допринасящи за изпълнението на главната стратегическа цел. Всеки един от приоритетите е свързан с конкретна приоритетна област на развитие.

Финансово изпълнение на проектите общо за ИПГВР по приоритети

Значителен ресурс е концентриран в приоритетна област „Околна среда“ – над 163 милиона лева. И това е напълно обяснимо, поради факта, че проектите, включени в тази приоритетна област са насочени към енергийна ефективност на административни, жилищни и производствени сгради и реализиране на водния цикъл (фаза 2). Изразходванията ресурс е над 75 милиона лева, което представлява малко над 46% от планираните средства.

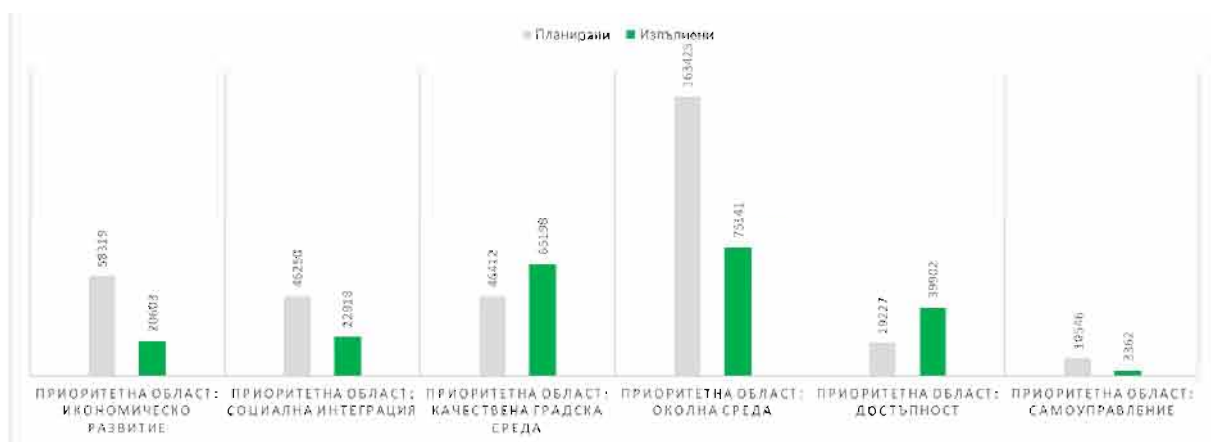

Фигура 26. Финансово изпълнение на ИПГВР към декември 2020 г. по приоритети

При две приоритетни области се наблюдава преизпълнение на планирания финансов ресурс: „Достъпност“ (211%) и „Качествена градска среда“ (114%). В приоритетна област „Качествена градска среда“ изразходваният финансов ресурс е в размер над 46 милиона лева, а за приоритетна област „Достъпност“ близо 40 милиона лева. Средствата са насочени за реализиране на проекти, свързани с благоустрояване, рехабилитация и изграждане на нова инфраструктура на градската среда, както и на конкретни обекти от туристическата инфраструктура. Планираните и реализирани проекти в по-голямата си част са обезпечени по ОПРР 2014-2020 г., като обхватът на проектите и конкретната им стойност са определени при подготовка на Инвестиционната програма по ПО 1 на ОПРР и в резултат на разработените инвестиционни проекти.

По приоритетна област „Социална интеграция“ се отчита 50% финансово изпълнение. Основната причина е отпадане необходимостта от реализиране на повечето социални обекти в резултат на приетата през 2018г. Националната стратегия за дългосрочна грижа, която дефинира нов вид услуги и стандарти за тяхното предоставяне. От друга страна при планирането са предвидени финансови ресурси за които не е имало източници от които да бъдат осигурени или са в инициативата на други бенефициенти (частни фирми,

неправителствени организации и др.). Реално финансовото изпълнение е резултат от работата на общинската администрация

По приоритетна област „Икономическо развитие“ е постигнато 36% финансово изпълнение. Проектите, които е предвидено да допринесат за изпълнение на приоритета, остават нереализирани в голямата си част. Причините са идентични с посочените по предходния приоритет.


Слабо изпълнение е постигнато при приоритетна област „Самоуправление“ – 31%, поради липса на финансиране на така предвидените проекти със средства от европейските фондове. Отчетеното изпълнение е резултат от последователната политика на Община Велико Търново за подобряване административния капацитет.

Наблюдава се дисбаланс между изпълнението на отделните приоритети. Най-голям финансов ресурс е изразходван по Приоритет 4. Устойчиво развитие и опазване на местните ресурси. За реализиране на проектите, свързани с опазване на околната среда са разходвани средства в размер на 75 141 211,27 лева, което представлява 33,08% от инвестираните средства.

Таблица 13. Финансово изпълнение на ИПГВР към декември 2020 г. по приоритети

Приоритет	Изпълнена стойност към 12.2020	Относителен дял
	(в хил. лв.)	%
Приоритет 1. Интелигентна икономика и развитие на научно-изследователска и развойна дейност	20603	9,07%
Приоритет 2. Висококачествено образование и високи нива на заетост за всички групи	22918	10,09%
Приоритет 3. Привлекателна и съхранена автентична градска среда и културни ценности	65198	28,71%
Приоритет 4. Устойчиво развитие и опазване на местните ресурси	75141	33,08%
Приоритет 5. Достъпна среда и усъвършенствана мобилност	39902	17,57%
Приоритет 6. Благоприятна бизнес среда и добро управление	3362	1,48%
Обща стойност	227125	100%

На следващо място по усвояемост на програмираните средства са проектите, допринасящи за изпълнението на Приоритет 3. Привлекателна и съхранена автентична градска среда и културни ценности, които са в размер на 65 198 437,99 лева и формират 28,71% от изразходвания ресурс. Финансовото изпълнение на проектите по Приоритет 5. Достъпна среда и усъвършенствана мобилност е размер на 39 902 381,31 лева, което е 17,57% от общо усвоените средства. Тези три приоритета включват основно инфраструктурни проекти, които са изпълнявани от Община Велико Търново. В останалите приоритети са включени проекти, които са с потенциален бенефициент различен от общинската администрация.

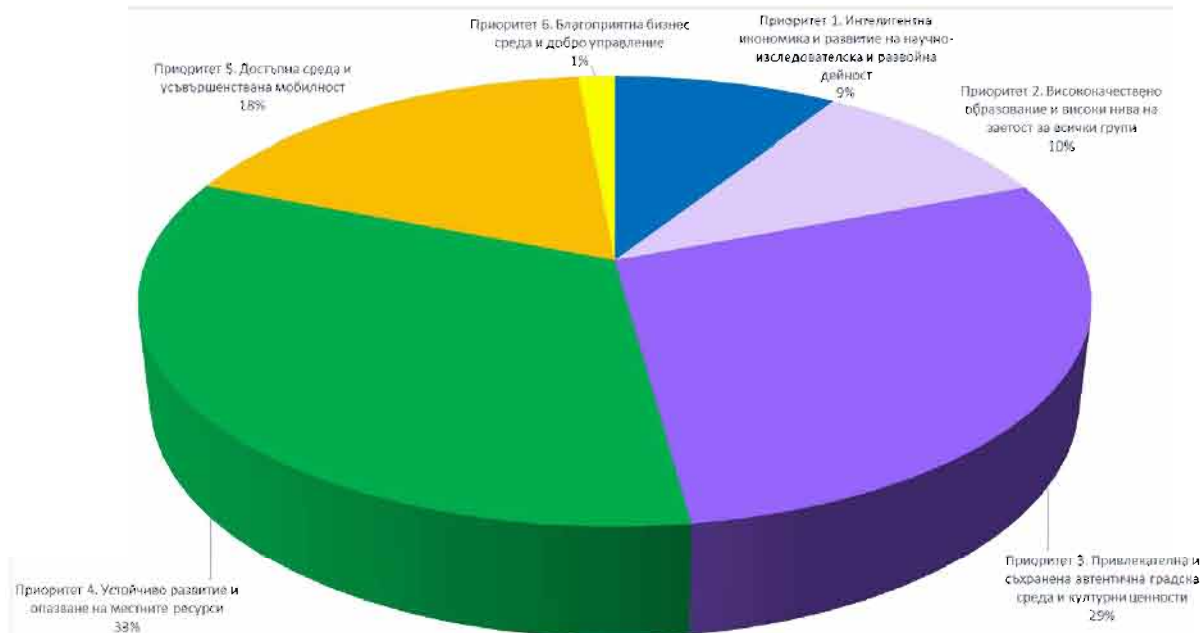

Фигура 27. Финансово изпълнение на проектите в ИПГВР по приоритети

Разпределение на финансовите ресурси по източници по приоритети


Посочените в Таблица 14 разходи попадат в обхвата на приоритетни области 1: Икономическо развитие; 2: Социална интеграция; 3: Качествена градска среда; 4: Околна среда; 5: Достъпност; 6: Самоуправление.

В таблицата се съдържа оценка на изразходваните финансови ресурси с представяне на тяхната разбивка по приоритети по финансови източници и относителния дял спрямо общия изразходван бюджет.

Таблица 14. Разпределение на финансовите ресурси по източници

приоритет	Общо		Други средства от СФ, ЕФ		Собствени средства за съфинансиране		Получено от европейски средства		Губернически бюджет		Национални програми		Други инвестиционни фондове		Частни инвеститори		Други доноси		Други	
	с	%	с	%	с	%	с	%	с	%	с	%	с	%	с	%	с	%	с	%
Приоритет 1.	20603	5,07	12742	5,61	14	0,01	126	0,06	2308	1,02	0	0	338	0,14	5085	2,24	0	0	0	0
Приоритет 2.	22918	10,09	17175	7,56	310	0,14	252	0,11	3024	1,33%	636	0,28	1353	0,60	108	0,07	0	0	0	0
Приоритет 3.	65198	28,71	23783	10,47	837	0,37	15533	6,84	19200	8,45	4444	1,96	1401	0,62	0	0	0	0	0	0
Приоритет 4.	75141	33,08	29662	13,06	1698	0,75	1522	0,67	11296	4,97	17012	7,75	3372	1,48	9980	4,39	0	0	0	0
Приоритет 5.	39902	17,57	25869	11,39	2264	1,00	904	0,40	10866	4,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приоритет 6.	3362	1,48	860	0,38	13	0,01	1869	0,82	230	0,10	58	0,04	291	0,13	0	0	0	0	0	0

Най-голям дял от получените средства от структурните и инвестиционни фондове на ЕС са реализирани за проекти от следните приоритетни области: 4: Околна среда – 13,06% в размер на повече от 29 милиона лева; 5: Достъпност – 11,39% в размер на близо 26 милиона лева и 3: Качествена градска среда – 10,47% в размер на близо 24 милиона лева. Това са приоритетните области, в които е инвестиран договорения ресурс от Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., както и от други европейски източници. Останалите приоритетни области остават с по-малко привлечени средства предимно от ОПИК2014-2020 и ОПРЧР2014-2020.

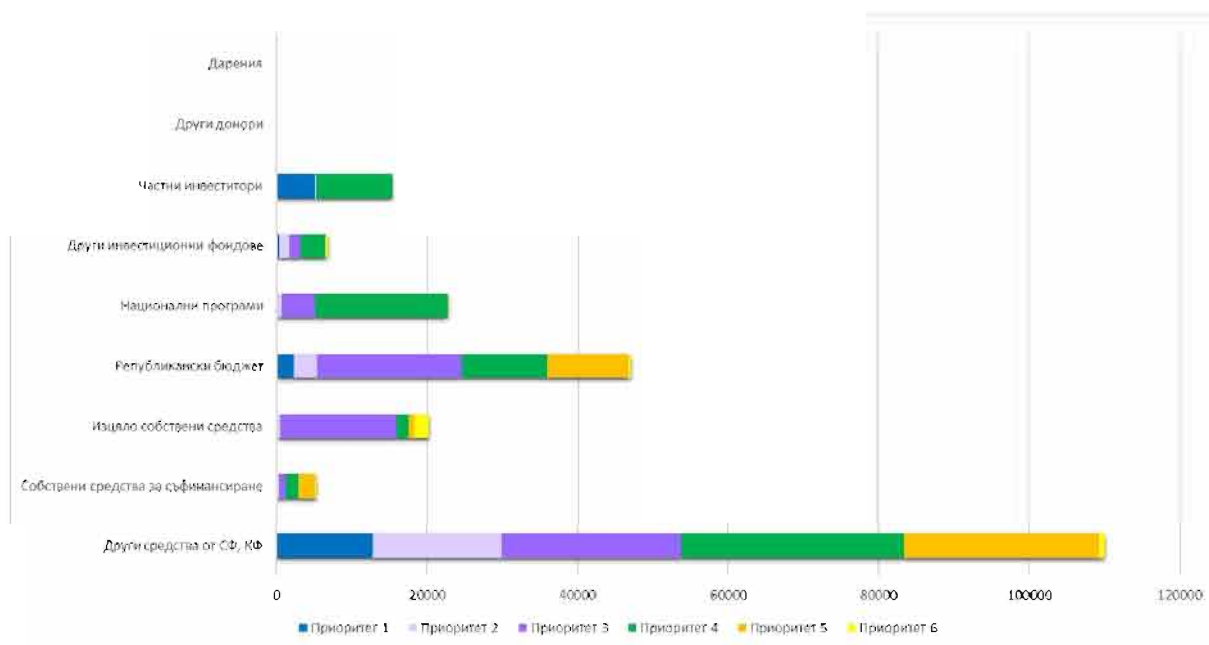

Фигура 28. Разпределение на финансовите ресурси по източници и приоритети

Сходно е разпределението и на собствените средства за съфинансиране и на изцяло собственото финансиране. Следва да се отбележи, че благодарение на разходване на собствени средства чрез инвестиционните програми на Община Велико Търново е осигурен ресурс по приоритетна област 6: Самоуправление, в която е включена групата проекти, свързани с повишаване капацитета на местната администрация, вкл. закупуване на нова техника за административните структури и изграждане на информационни системи.

Осигуреният финансов ресурс от Републиканския бюджет също е концентриран към трите приоритетни области: околна среда; достъпност и качествена градска среда. Идентично е разпределението на средства и от националните програми. Изчислената степен на финансовото изпълнение на проектите в ИПГВР по приоритети разкрива „многоцветна“ картина за различните комбинации от Приоритет, рефериращ към конкретна приоритетна област и източник на финансиране. Това се дължи както на възниквалите през годините актуални проблеми и потребности в рамките на отделните приоритетни области, така и на съответстващите им реални възможности за финансиране. Оценката потвърждава по-горните констатации по отношение на осигуреното финансиране по зони за въздействие.

4.3. Обобщение на организационните ресурси за изпълнение и наблюдение

Към момента, изпълнението на ИПГВР се осъществява чрез дейността на отделните ресори на общинска администрация при координиращата роля на дирекция „Проекти и програми“. Сред приложените инструменти за изпълнение и наблюдение на ИПГВР се открояват годишните отчети за Мандатната програма. Прави впечатление, че сравнително малкият набор на приложените инструменти е свързан с обща ефективност на плана и много висока ефективност за три от приоритетите, обвързани основно с работата на общинската администрация.

4.4. Описание на съответствието между разходите и очакваните ползи

Изпълнените проекти и постигнатите индикатори показват висока резултатност в изпълнението на ИПГВР, обвързана с подобрени показатели за интегрирано и устойчиво градско развитие. Анализираният проект в Община Велико Търново има пълно съответствие със стратегията на ИПГВР, като допринася за постигането на различните мерки на Плана.

За значителна част от мерките има преизпълнение на финансовите стойности и на реализираните проекти. Това дава основание да се даде положителна оценка относно съотношението между направените разходи и очакваните/постигнатите ползи.

**V. ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И
ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА
МЕСТНО НИВО**



В настоящия раздел е систематизирана информацията за идентифицираните проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР. Като цяло причините са комплексни и включват съчетанието от няколко компонента, като за целите на идентифицирането на проблемните области е изведена водеща причина. Изведените по-долу причини са съгласно Методическите насоки на УО на ОПРР, като за всеки обект са посочени причините, поради които идентифицираните проектни идеи не са осъществени.

Промени на фактически обстоятелства на обектите

Функция на обектите

За част от индикативните проекти, включени в ИПГВР, насочени към изграждане на нови обекти за социални услуги в Зоната за въздействие „С“ с преобладаващ социален характер, отпада необходимостта да бъдат реализирани (проекти: Зона ЗС-4.1; Зона ЗС-4.8; Зона ЗС-4.9). На 04.01.2018 г. Националният съвет за социално включване приема План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. С Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет е приет План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. След приемане на Плана за действие, Агенция за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на общините в Република България изготвят Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността, които са утвърдени от Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания през месец февруари 2018 година.

Конкретните обекти, предложени в ИПГВР не попадат в списъка с новите социални услуги и не отговарят като функция на условията за предоставяне на дългосрочна грижа.

Обективна липса на условия за реализация на проектите

Статут на имота

Реализирането на инвестиции в спортен комплекс „Юнак“ (проект Зона ЗП-2.2) не е реализиран поради факта, че обектът попада в част от територията на Старо военно училище, за което пред периода е процедиран Подробен устройствен план.

Липса на подходящ терен

Изграждане на панаирно градче за изложения и конгреси (проект Зона ЗИ-5.4) е предвидено да се реализира в Зона за въздействие „И“ с потенциал на икономическо развитие. От една страна липсата на подходящ терен е пречка за реализиране на инициативата, но от друга с реализирането на мащабните инвестиции на терена на Старо военно училище съществува риск от дублиране на функциите и нецелесъобразност на инвестициите.

Инициативата за реализиране на проекта за изграждане на тенис кортове (Дейност ЗП-2.2.2) следва да бъде на собственик на терен, подходящ за реализиране на проекта в Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост. Община Велико Търново към момента на изпълнение на ИПГВР не разполага с терен за реализиране на такава инициатива.

Липса на проектна готовност

Една от обективните пречки за реализиране на инвестиции в Зона „П“ на публични функции с висока обществена значимост е липсата на проекта готовност. За инвестиционните проекти, които попадат в обхвата на групова културна ценност „Историческо селище Велико Търново – паметник на урбанизма и културния пейзаж с национално значение“ е необходимо съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИИКН).

За обектите общинска собственост проблем е и недостигът от средства за собствено финансиране за изготвяне на инвестиционни проекти и средства за съфинансиране при тяхната реализация (Зона ЗП-2.3; Зона ЗП-6.1).

Съществена част от нереализираните проекти не са собственост на Община Велико Търново и инициативата за тяхното реализиране следва да бъде на собствениците. Това е една от сериозните слабости при определянето на индикативни проекти при разработване на ИПГВР (Дейност ЗП-5.6.2, Дейност ЗП-5.6.3 и др.). Аналогична е ситуацията и с проектите за основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по главните улици на Стария град (Зона ЗП-1.2).

Наличие на финансови ограничения

Липса на финансиране

Един от най-мощабните проекти, който не е реализиран е Проект Зона ЗП-5.1: Интегриран проект за воден цикъл на гр. Велико Търново - II част. В ИПГВР е включен през 2013 г. на база Решение №379/30.08.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г., с което е одобрено проектното предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.“ по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2007-2013г. Одобреното финансиране е размер на 38 153 162,68 лв. от които 30 522 530,14 лв. от Кохезионния фонд на ЕС и 7 630 632,54 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет и от общинския бюджет. В решението е отбелязано, че при липса на финансиране по ОПОС 2007-2013 и възможност съгласно нормативната уредба, да бъде предоставена БФП от Кохезионния и/или структурните фондове на ЕС за програмен период 2014-2020.

Съгласно обявените през периода 2014-2020 процедури за директно предоставяне на финансова помощ по Приоритетна ос „Води“ за изграждане на ВиК инфраструктура, допустими кандидати по процедурата са ВиК оператори: 1) за които, с решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството по параграф 34, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009г.) са обявени обособени територии, съвпадащи с границите на административните области, 2) които са страна по договорите по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ със съответната асоциация по ВиК и 3) за чиито обособени територии са подготвени документи за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“.

ОПОС 2014-2020 г. финансира изграждане на ВиК инфраструктура, която е в съответствие с Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), с регионалните генерални планове за ВиК и с финансираните със средства от Кохезионния фонд на ЕС регионални прединвестиционни проучвания. В подкрепа на стартиралата през 2009 г. реформа във ВиК отрасъла и ангажиментите на държавата за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО, средствата по ОПОС 2014-2020 г. се насочват към агломерации с над 10 000 екв. ж. на територията на консолидирани райони, обслужвани от един ВиК оператор

В съответствие с разпоредбите на европейското и българското законодателство по отношение на качеството на питейните и отпадните води и в подготовка на програмен период 2021-2027 МРРБ публикува обществена поръчка „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции, като Обособена позиция 1 е РПИП за „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново. В рамките на обхвата на поръчката се предвижда да се разработи техническа и икономическа документация, която да включва - събиране и анализ на данни, необходими за изготвяне на прединвестиционни проучвания за регионални ВиК проекти, дефиниране на проект за финансиране за постигане на съответствие с европейското и българското законодателство в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни води, качеството и количеството на питейните води, както и устойчивото и ефективно функциониране на ВиК системите и съоръженията. Липсват и конкретни възможности за получаване на подкрепа за реализиране на проекти от фондове и програми, напр. за църквите в публичната зона.

Недостиг на общински средства

От направения преглед на изпълнението на ИПГВР може да се направи извода, че Община Велико Търново води последователна политика при диверсифициране на източниците на финансиране с цел преодоляване недостига на общински средства за съфинансиране на проекти, както и за цялостното им финансиране. От друга страна обаче, финансовата рамка на ИПГВР е амбициозна и голяма, което не е по силите на бюджета на общината да изпълни всички заложените дейности.

Друго финансиране (частни инвестиции)

Сериозна част от предвидения финансов ресурс за проектите в ИПГВР следва да бъде осигурена от собственици на сгради, като през периода не е идентифициран напредък по изпълнението или проектна инициатива от тяхна страна за реализирането им. В тази група попадат проекти, насочени към преквалификация на кадри в различни сектори на икономиката според нуждите на пазара на труда, стажове на млади специалисти в различни направления и др.

VI. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД



Съгласно чл.13, ал.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ №21/13.03.2020, Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО), определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Плановете за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОГР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), имащи действие за периода 2014-2020 г.

ПИРО, като част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.

ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

ПИРО се разработва за 7 –годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на Интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район. Плановият период обхваща 2021 – 2027г.

Основни изводи

По отношение на проектите

- (1) значителен общ брой отчетени проекти и инициативи;
- (2) наличие на дисбаланс между изпълнението на отделните приоритетни области;
- (3) висока степен на изпълнение на приоритетни области „Качествена градска среда“; „Околна среда“; „Достъпност“;
- (4) съществен принос в общото финансово изпълнение от приоритетни области „Качествена градска среда“; „Околна среда“; „Достъпност“
- (5) по-ниска степен на изпълнение за някои приоритети и мерки поради липсата на приложим източник на финансиране през отчетния период;
- (6) привлечени средства от различни европейски източници за финансиране на проектите в ИПГВР - 48% от реализирания финансов ресурс.
- (7) важна роля на собствените средства и централния бюджет, насочен приоритетно към техническата инфраструктура, вкл. изграждане на нова;
- (8) много висока активност на Община Велико Търново в трансгранични партньорства;

(9) малък брой партньорски проекти между общинска администрация, неправителствения и частния сектор;

По отношение на индикаторите

- (1) висока степен на изпълнение на целите и приоритетите на ИПГВР според отчетените индикатори;
- (2) добро общо социално-икономическо състояние в общината;

По отношение на наблюдението и изпълнението

- (1) детайлно отчитане за изпълнението на общинските политики на годишна основа – годишни отчети на Мандатната програма на кмета на общината;
- (2) приложение на ограничен набор за планиране и регулярно отчитане изпълнението на ИПГВР;
- (3) умело използване и съчетаване на различни източници на финансиране за изпълнението на ИПГВР.

Препоръки за следващия програмен период

По отношение на съдържанието на проекти

- (1) Необходимо е проектите, които се включват в ПИРО да бъдат с ясно определени партньори и конкретни ангажименти по тяхната реализация, като фокусът на вниманието следва да бъде върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, насочени към подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
- (2) Да бъдат ясно описани проектите с готови инвестиционни проекти и да бъде прецизирана възможността за реализиране на проекти на инженеринг, съобразно тяхното местоположение, източници на финансиране и др.
- (3) Проектите да бъдат групирани в съответствие с обхвата на мерките и приоритетните области с цел по-лесна проследимост и отчетност на ефективността и ефикасността;

По отношение на наблюдението и изпълнението

- (1) Типът индикатор, за продукт или за резултат, следва да бъде съотнесен към съответен приоритет или цел в зависимост от конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в ПИРО. Това ще създаде обективна база за отчитане на напредъка на изпълнение на плана.
- (2) При разработване на системата от индикатори за наблюдение на изпълнение, следва да бъде ясно дефинирана базовата стойност, целевата стойност и конкретно посочване на източниците на обективна и измерима информация и данни, с които се отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение №1. Списък на проектите в ИПГВР по приоритети и мерки

Приоритет/мярка/група проекти/проект		Статус
Приоритет 1. Интелигентна икономика и развитие на научно –изследователска и развойна дейност		
Мярка ПЗ. Развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси		
Група проекти ЗП-8: Повишаване на образователното равнище и стимулиране на научния капацитет		
П	Проект Зона ЗП-8.1: Стимулиране на научните изследвания в Център за квалификация и преквалификация и филиал на БАН	Не е отчетен напредък
П	Проект Зона ЗП-8.2: Обновяване и дигитализиране на научен фонд и закупуване на софтуер за незрящи хора в културните и образователни институции	Цялостно изпълнение
Група проекти ЗИ-4: Стимулиране на младите предприемачи		
И	Проект Зона ЗИ-4.1: Бизнес-обучение за млади предприемачи	Не е отчетен напредък
И	Проект Зона ЗИ-4.2: Обучения за управленските екипи за организация и управление на проекти	Цялостно изпълнение
Мярка ИЗ: Икономически прогрес и развитие на иновациите		
Група проекти ЗИ-5: Стимулиране използването на интелигентни и иновативни производствени системи		
И	Проект Зона ЗИ-5.1: Иновации и технологична модернизация на предприятия	Частично изпълнение
И	Проект Зона ЗИ-5.2: Въвеждане на модерни информационно-комуникационни технологии в предприятията	Частично изпълнение
И	Проект Зона ЗИ-5.3: Повишаване ресурсната ефективност в предприятията	Цялостно изпълнение
И	Проект Зона ЗИ-5.4: Изграждане на панаирно градче за изложения и конгреси	Не е отчетен напредък
И	Проект Зона ЗИ-5.5: Ефективно третиране на отпадъците, сепариране и преработка -екоинновации	Не е отчетен напредък
Приоритет 2. Висококачествено образование и високи нива на заетост за всички групи		
Мярка С2: Интеграция на целевите групи и висока заетост		
Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализираните групи и хора с увреждания		
С	Проект Зона ЗС-4.1: Изграждане на нова сграда за развитие на специализирана социална услуга за възрастни хора и хора с увреждания с капацитет 130 човека	Не е отчетен напредък
С	Проект Зона ЗС-4.2: Изграждане на кризисен център за бездомни и социално слаби лица	Цялостно изпълнение

С	Проект Зона ЗС-4.3: Изграждане на общински комплекс за хранене, включително обществена трапезария за бездомни и социално слаби лица	Частично изпълнение
С	Проект Зона ЗС-4.4: Стимулиране образователната интеграция на рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение	Частично изпълнение
С	Проект Зона ЗС-4.5: Развитие на услугата „личен асистент“, „социален помощник“ и домашен социален патронаж“ - наемане на повече лица	Цялостно изпълнение
С	Проект Зона ЗС-4.6: Обмяна на опит и добри практики за работа с възрастни хора /за персонала на Дом за стари хора/	Не е отчетен напредък
С	Проект Зона ЗС-4.7: Създаване на Дневни центрове за възрастни, хосписи и клубове по интереси	Частично изпълнение
С	Проект Зона ЗС-4.8: Изграждане на 3 бр. „Защитени жилища“ за лица с умствена изостаналост по 10 души капацитет за деинституционализация на лица с умствена изостаналост от Домовете за възрастни с умствена изостаналост на територията на Община В. Търново в ж.к. „Чолаковци“)	Не е отчетен напредък
С	Проект Зона ЗС-4.9: Изграждане на 3 бр. „Центъра за настаняване от семеен тип“ за лица с умствена изостаналост по 15 души капацитет, във връзка със стартиране на процеса по закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с Пчелище, общ. Велико Търново в ж.к. „Зона В“ и доставка на 3 бр. специализирани транспортни средства 8+1 места /бус/ пригодени за хора с увреждания с рампа	Не е отчетен напредък
С	Проект Зона ЗС-4.10: Продължаваща социална услуга за деца с увреждания след навършване на пълнолетие към Дневен център за деца с увреждания - проектиране и изграждане на 1 бр. Дневен център за лица с увреждания - корпус „Д“ от СОУ „Г.С.Раковски“ в УПИ IV, кв. 336 гр. Велико Търново, с капацитет 40 души	Частично изпълнение
С	Проект Зона ЗС-4.11: Проектиране и изграждане на 1 /едия/ бр. „Център за социална реабилитация и интеграция“ за лица с увреждания, с капацитет 40 души като форма на съпътстваща социална услуга за предложените социални услуги от резидентен тип в обхвата на ж.к. „Зона В“	Не е отчетен напредък
С	Проект Зона ЗС-4.12Д: „Кризисен център за лица „Търновград“ (ул. „Драган Цончев“ № 8) - ЗОНА В	Цялостно изпълнение
С	Проект Зона ЗС-4.13Д: Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново	Цялостно изпълнение
С	Проект Зона ЗС-4.14Д: „Бъдеще за всяко дете“ (ул. „Илармон Драгостинов“ № 3А) - ж.к. „Бузлуджа“	Цялостно изпълнение
С	Проект Зона ЗС-4.15Д: „Инвестиция в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново“	Цялостно изпълнение
С	Проект Зона ЗС-4.16Д: „И аз имам семейство“	Цялостно изпълнение

С	Проект Зона ЗС-4.17Д: „Приеми ме 2015“	Цялостно изпълнение
Група проекти ЗС-5: Насърчаване на заетостта сред всички групи от населението		
С	Проект Зона ЗС-5.1: Насърчаване на младежката заетост и заетостта за хора над 50 години	Частично изпълнение
С	Проект Зона ЗС-5.2: Заетост и работна среда за хора с увреждания	Частично изпълнение
Група проекти Д-3: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания		
Д	Проект Д-3.1. Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВИГРАД“	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-3.2. Изграждане на комплекс от социални услуги за деца (ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3)	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-3.3. Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост (с. Церова кория)	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-3.4. Разкриване на комплекс от социални услуги за деца (ул. „Симеон Велики“ № 3)	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-3.5. Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 14	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-3.6. Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения (село Церова кория)	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-3.7. Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (с. Церова Кория)	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-3.8. Реновация и модернизация на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (с. Церова Кория)	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-3.9. Вътрешно преустройство на съществуващата сграда на Домашен социален патронаж - гр. Дебелец	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-3.10. Други инвестиции за социална инфраструктура извън зоните за въздействие	Цялостно изпълнение
Мярка ПЗ: Развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси		
Група проекти ЗП-9: Повишаване квалификацията на кадровите ресурси		
П	Проект Зона ЗП-9.1: Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за хора с увреждания	Не е отчетен напредък
П	Проект Зона ЗП-9.2: Обучение за работа със зависими хора, работа с насилници и деца жертва на насилие, превенция за изоставени деца	Не е отчетен напредък
П	Проект Зона ЗП-9.3: Преквалификация на кадри в различни сектори за адаптивност на пазара на труд	Не е отчетен напредък
Мярка И2. Повишаване квалификацията на работната сила и развитие на предприемачеството		
Група проекти ЗИ-3: Заетост, образование и преквалификация		

И	Проект Зона ЗИ-3.1: Осигуряване заетост за нискоквалифицирани кадри	Частично изпълнение
И	Проект Зона ЗИ-3.2: Преквалификация на кадри в различни сектори на икономиката според нуждите на пазара на труда	Не е отчетен напредък
И	Проект Зона ЗИ-3.3: Стажове за млади специалисти в различни направления	Не е отчетен напредък
И	Проект Зона ЗИ-3.4: Обучения за работещите за повишаване на квалификация, езикови и компютърни умения	Цялостно изпълнение
И	Проект Зона ЗИ-3.5: Осигуряване на Интернет достъп в зоната	Цялостно изпълнение
Приоритет 3. Привлекателна и съхранена автентична градска среда и културни ценности		
Мярка С1: Съживяване и модернизация на градската среда в жилищните комплекси		
Група проекти ЗС-1: Безопасна, обновения и привлекателна среда		
С	Проект Зона ЗС-1.1: Достъпна архитектурна среда и подобряване безопасността на движението, и видеонаблюдение на пешеходни и зелени пространства /рампи, сигнални светофарни уредби, скосявания, асансьори към образователни обекти, на кръстовища, пешеходни пространства и зони за отдих и социална инфраструктура; поставяне на съоръжения за спиране паркирането по тротоари на главните улици /колчета, изолираща растителност/	Цялостно изпълнение
С	Проект Зона ЗС-1.2: Паркоустройство, благоустройство, изграждане на пешеходни алеи и поставяне на градско обзавеждане в публичните пространства	Цялостно изпълнение
С	Проект Зона ЗС-1.3: Съвременни средства за ориентация и информация - указателни и информационни табели в зоната	Цялостно изпълнение
Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и спортна инфраструктура		
	ЗС-3.3.4Д. Възстановяване на църковен храм „Св.Архангел Михаил“	Цялостно изпълнение
Мярка П1. Обновяване на административна, културна и социална инфраструктура		
Група проекти ЗП-3: Опазване и промотиране на културното наследство и туризма		
	Проект Зона ЗП-3.1: Експониране и адаптация на културно наследство	Частично изпълнение
П	Проект Зона ЗП-3.2: Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, туристически център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище	Частично изпълнение
П	Проект Зона ЗП-3.3: Развитие на конгресен и фестивален туризъм - организиране на иновативни културни събития	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-3.4: Проектиране и разширяване на Мултимедийния център на ул. „Пиколо“, административната сграда на РИМ	Частично изпълнение

П	Проект Зона ЗП-3.5Д: Проект ЗП - CultTour - културно /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм	Цялостно изпълнение
Група проекти Д-2: Обновяване на образователната инфраструктура		
Д	Проект Д-2.3. Изграждане на детска градина в кв. „Картала“	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-2.4. Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев“ за осигуряване на едноменен режим на обучение	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-2.5. Реконструкция на сграда на ОУ „Бачо Киро“ - гр. Велико Търново за осигуряване на едноменен режим на обучение	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-2.6. Модернизация на образователната инфраструктура на ДГ „Първи юни“	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-2.7: Модернизация на образователна инфраструктура, вкл. дворни пространства, достъпна среда и видеонаблюдение	Цялостно изпълнение
Мярка П2. Съхранена, достъпна и модернизирана автентична градска среда		
Група проекти ЗП-4: Модернизирани публични пространства и зони за рекреация		
П	Проект Зона ЗП-4.1: Реновиране на пешеходни пространства	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-4.2: Реконструкция и рехабилитация на изгледни площадки по ул. „Стефан Стамболов“	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-4.3: Обновяване и поддръжка на улично озеленяване и градско обзавеждане	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-4.4: Реконструкция на стари автентични елементи на градското обзавеждане	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-4.5: Създаване на акценти в градската среда - галерии на открито с произведения на изкуството от хранилищата на културните институции и други.	Цялостно изпълнение
Група проекти ЗП-5: Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда		
	Проект Зона ЗП-5.3: Модернизация и изграждане на детски площадки	Частично изпълнение
П	Проект Зона ЗП-5.7: Обновяване на обществените тоалетни в публичните пространства и приспособяване за хора с увреждания	Цялостно изпълнение
Мярка И1. Обновяване на средата и производствената инфраструктура		
Група проекти ЗИ-1: Рехабилитация и модернизиране на градската среда		
И	Проект Зона ЗИ-1.1: Рехабилитация на улици и тротоари, изграждане на паркинги, шумоизолираща зеленина, съоръжения за намаляване на скоростта по основни транспортни артерии, огради, енергийно ефективно осветление и осветени пътеки, видеонаблюдение	Цялостно изпълнение
И	Проект Зона ЗИ-1.2: Паркоустройство и озеленяване на пространствата между производствените сгради	Цялостно изпълнение
И	Проект Зона ЗИ-1.3: Съвременни системи за информация и ориентация	Цялостно изпълнение

Приоритет 4. Устойчиво развитие и опазване на местните ресурси		
Мярка С1: Съживяване и модернизация на градската среда в жилищните комплекси		
Група проекти ЗС-2: Обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси		
С	Проект Зона ЗС-2.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси	Частично изпълнение
Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и социална инфраструктура		
С	Проект Зона ЗС-3.1: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на образователна инфраструктура, вкл. обновяване на дворни пространства, детски и спортни площадки, ремонт на огради, видеонаблюдение	Частично изпълнение
С	Проект Зона ЗС-3.2: Реконструкция на Народно читалище „Съзнание -1936“ и внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустройство и рехабилитация на двор и ограда	Не е отчетен напредък
С	Проект Зона ЗС-3.3: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на Дом за стари хора „В. Ботева“ (ул. „Иларион Драгостинов“ 3)	Цялостно изпълнение
Група проекти Д-1: Обновяване и енергийна ефективност на сгради		
Д	Проект Д-1.1.: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси	Цялостно изпълнение
Група проекти Д-2: Обновяване на образователната инфраструктура		
Д	Проект Д-2.1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-2.2. Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище	Цялостно изпълнение
Мярка П1: Обновяване на административна, културна и образователна инфраструктура		
Група проекти ЗП-1: Обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради		
П	Проект Зона ЗП-1.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради, достъпна среда и видеонаблюдение	Частично изпълнение
П	Проект Зона ЗП-1.2: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по главните улици на Стария град	Не е отчетен напредък
Група проекти ЗП-2: Модернизация на образователна, културна и спортна инфраструктура		

П	Проект Зона ЗП-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура, вкл. дворни пространства, достъпна среда и видеонаблюдение	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-2.2: Обновяване на спортна инфраструктура	Не е отчетен напредък
П	Проект Зона ЗП-2.3: Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура, вкл. околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение	Цялостно изпълнение
Мярка П2. Съхранена, достъпна и модернизирана автентична градска среда		
Група проекти ЗП-5: Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда		
П	Проект Зона ЗП-5.1. Интегриран проект за воден цикъл на гр. Велико Търново - II част	Частично изпълнение
П	Зона ЗП-5.8Д: Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух (интегриран проект)	Цялостно изпълнение
Мярка И1. Обновяване на средата и производствената инфраструктура		
Група проекти ЗИ-2: Енергийна ефективност и обновяване на производствени сгради		
И	Проект Зона ЗИ-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на обществени сгради	Не е отчетен напредък
И	Проект Зона ЗИ-2.2: Мерки за енергийно обновяване на производствени сгради	Цялостно изпълнение
И	Проект Зона ЗИ-2.3: Мерки за зелена икономика - изграждане на съоръжения за намаляване емисиите на вредни газове	Частично изпълнение
Приоритет 5. Достъпна среда и усъвършенствана мобилност		
Мярка С3. Повишена мобилност и достъпност		
Група проекти ЗС-6: Достъпна архитектурна среда		
С	Проект Зона ЗС - 6.1: Подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, вкл. улично озеленяване/ енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда, вкл. следните действия:	Цялостно изпълнение
С	Проект Зона ЗС-6.2: Изграждане на паркинги и подземни гаражи	Не е отчетен напредък
Група проекти ЗС-7: Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт		
С	Проект Зона ЗС-7.1: Транспортна схема с алтернативни маршрути	Цялостно изпълнение
С	Проект Зона ЗС-7.2: Развитие на интегриран градски транспорт	Цялостно изпълнение
С	Проект Зона ЗС-7.3: Изграждане на велоалеи и велостоянки в кв. „Чолаковци“	Не е отчетен напредък
Група проекти Д-4: Свързаност и достъпност		

Д	Проект Д-4.1. По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“, чрез общи мерки в трансграничния регион	Цялостно изпълнение
Д	Проект Д-4.2. Осигуряване функционална свързаност на периферията със зоните за въздействие	Цялостно изпълнение
Мярка П2. Съхранена, достъпна и модернизирана автентична градска среда		
Група проекти ЗП-5: Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда		
П	Проект Зона ЗП-5.2: Градска среда в старата градска част - реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-5.4: Поставяне на съоръжения за намаляване на скоростта и ограничаване на паркирането по пешеходни пространства и тротоари към главните улици /колчета, изолираща растителност, огради/	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-5.5: Улесняване на достъпа на хора с увреждания в градската среда и към административни и обществени сгради	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-5.6: Реконструкция на обществени паркинги	Частично изпълнение
Група проекти ЗП-6: Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт		
П	Проект Зона ЗП-6.1: Изграждане на велоалея и велостоянки по ул. „Крайбрежна“	Не е отчетен напредък
П	Проект Зона ЗП-6.2: Съвременни системи за ориентация и информация	Цялостно изпълнение
Приоритетна област 6. Благоприятна бизнес среда и добро управление		
Мярка С2. Интеграция на целевите групи и висока заетост		
Група проекти ЗС-5: Насърчаване на заетостта сред всички групи от населението		
С	Проект Зона ЗС-5.3: Повишаване квалификацията на учителите в детските градини и училищата - обучения за интерактивни методи на преподаване	Частично изпълнение
Мярка ПЗ. Развитие на научния и административния капацитет и човешките ресурси		
Група проекти ЗП-7: Повишаване капацитета на местната администрация		
П	Проект Зона ЗП-7.1: Обучение на управленските екипи и работещите в местните административни структури	Частично изпълнение
П	Проект Зона ЗП-7.2: Закупуване на нова техника в административните структури	Частично изпълнение
П	Проект Зона ЗП-7.3Д: Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-7.4Д: Европейска академия	Цялостно изпълнение

П	Проект Зона ЗП-7.5Д: Информационни системи на администрацията	Цялостно изпълнение
П	Проект Зона ЗП-7.6Д: Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново	Цялостно изпълнение
Мярка ИЗ: Икономически прогрес и развитие на иновациите		
Група проекти ЗИ-6: Реклама и промоция на икономическите дейности		
И	Проект Зона ЗИ-6.1: Бизнес маркетинг и маркетинг на възможностите за инвестиции	Цялостно изпълнение
И	Проект Зона ЗИ-6.2: Рекламирање и промоция на икономическата дейност	Цялостно изпълнение

Приложение №2. Актуализирана матрица бюджет

1	2	3	4	5	Размер на инвестициите (в хил.лв.)										
					Общо за проекта	Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за	Изцяло собствени средства	Републичански бюджет	Национални програми	Други инвест. фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
Проекти по видове зони за въздействие	Отношение към подпомогнатите операции на съответната ОП, ако е приложимо (код на операция)****	Проектна готовност (вид на проекта)**	Срок на изпълнение	Процедури по ЗОП	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР" В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, (ЗОНА С)															
Група проекти ЗС-1: Безопасна, обновена и привлекателна среда					20455	7152	25	251	12241	0	785	0	0	0	0
Проект Зона ЗС-1.1: Достъпна архитектурна среда и подобряване безопасността на движението, и видеонаблюдение на пешеходни и зелени пространства /рампи, сигнални светофарни уредби, скосвания, асансьори към образователни обекти, на кръстовища, пешеходни пространства и зони за отдих и социална инфраструктура; поставяне на съоръжения за спиране паркирането по тротоари на главните улици /колчегта, изолпираша растителност/					10 922	0	25	0	10 112	0	785	0	0	0	
Дейност ЗС-1.1.1: Достъпна среда в ж.к. "Чолаковци"					2710		25		2685						Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020, ПМС

Проект Зона ЗС-3.2: Реконструкция на Народно читалище „Съзнание -1936“ и внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустройство и рехабилитация на двор и ограда	ОПРР, ПО I																			Инвестиционната програма по ПО I на ОПРР 2014-2020 (резервен обект); Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020
Проект Зона ЗС-3.3: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на Дом за стари хора „В. Богева“ /ул.„Иларион Драгостинов“ 3/																				ФМ на ЕИП; Фонд "Социална закрила" към МТСП; Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020
ЗС-3.3.4Д. Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел Михаил“, кв. Чолаковци																				ПМС 96/25.04.2019 г.
Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания																				
Проект Зона ЗС-4.1: Изграждане на нова сграда за развитие на специализирана социална услуга за възрастни хора и хора с увреждания с капацитет 130 човека																				Не е отчетен напредък. Не попада в обхвата на Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, 2018г.
Проект Зона ЗС-4.2: Изграждане на кризисен център за бездомни и социално слаби лица (ул. Драган Цончев № 8) - ЗОНА В	ОПРР, ПО I																			Инвестиционната програма по ПО I на ОПРР 2014-2020 (основен обект)

Проект Зона ЗС-4.3: Игряждане на общински комплекс за хранене, включително обществена трапезария за бездомни и социално слаби лица	ОПХ																		Осигурено предоставяне на услуга: Оперативна програма за храна и/или основно материално подпомагане; Фонд „Социална закрила“ към МТСП; Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“
Проект Зона ЗС-4.4: Стимулиране образователната интеграция на рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение																			Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика
Проект Зона ЗС-4.5: Развитие на услугата „личен асистент“, „социален помощник“ и домашен социален патронаж“ - наемане на повече лица	ОПЧР, ПО2																		ОПЧР 2014-2020 г., ПО 2. „Намаляване на бедността и надърчаване на социалното включване“, Фонд „Социална закрила“ към МТСП; Инвестиционната програма на Община Велико Търново
Проект Зона ЗС-4.6: Обмяна на опит и добри практики за работа с възрастни хора /за персонала на Дом за стари хора/																			Не е отчетен напредък
Проект Зона ЗС-4.7: Създаване на Дневни центрове за възрастни, хосписи и клубове по интереси																			Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020

<p>Проект Зона ЗС-4.8: Изграждане на 3 бр. „Защитени жилища“ за лица с умствена изостаналост по 10 души капацитет за дейстициуонализация на лица с умствена изостаналост от Домовете за възрастни с умствена изостаналост на територията на Община В. Търново в ж.к. „Чолаковци“)</p>												<p>Не е отчетен напредък. Не попада в обхвата на Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, 2018г.</p>
<p>Проект Зона ЗС-4.9: Изграждане на 3 бр. „Центъра за настаняване от семеен тип“ за лица с умствена изостаналост по 15 души капацитет, във връзка със стартиране на процеса по закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Пчелнице, общ. Велико Търново в ж.к. „Зона В“ и доставка на 3 бр. специализирани транспортни средства 8+1 места /бус/ пригодени за хора с увреждания с рампа</p>				0	0	0	0	0	0	0		<p>Не е отчетен напредък. Не попада в обхвата на Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, 2018г.</p>
<p>Проект Зона ЗС-4.10: Продължаване социална услуга за деца с увреждания след навършване на пълнолетие към Дневен център за деца с увреждания - проектиране и изграждане на 1 бр. Дневен център за лица с увреждания - корпус „Д“ от</p>				56	0	0	0	0	0	0	0	<p>Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020</p>

Проект Зона ЗС-7.2: Развитие на интегриран градски транспорт	ОПРР, ПО 1	11 134	8 848	724	0	1 561	0	0	0	0	0	0	0	0	Инвестиционната програма по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 (основен обект), Проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"
Проект Зона ЗС-7.3: Изграждане на велоален и велостоянки в кв. "Чолаковци"	ОПРР 1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не е отчетен напредък
ОБЩО ЗА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ "С", С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР		65886	34176	802	1125	18821	8744	2220	0	0	0	0	0	0	
ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ "ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ЗОНА II)															
Група проекти ЗП-1: Обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради		114	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проект Зона ЗП-1.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради, достъпна среда и видеонаблюдение		114	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност ЗП - 1.1.1: Община Велико Търново		114			114										Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020
Дейност ЗП - 1.1.2: Централен военен архив															Не е отчетен напредък
Дейност ЗП - 1.1.3: Административен съд															

Проект Зона ЗП-5.4: Поставяне на съоръжения за намаляване на скоростта и ограничаване на паркирането по пешеходни пространства и тротоари към главните улици /колчета, изолдираща растителност, огради/																			Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020; ПМС№113/30.04.2015 г.
Проект Зона ЗП-5.5: Улесняване на достъпа на хора с увреждания в градската среда и към административни и обществени сгради																			Не е отчетен напредък
Дейност ЗП - 5.5.1: Сигнални светофари и информационни средства за незрящи хора, асансьори към административни и обществени сгради																			Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020; Агенция за хора с увреждания и др.
Дейност ЗП - 5.5.2: Достъп до културни ценности и музеи																			
Проект Зона ЗП-5.6: Реконструкция на обществени паркинги																			
Дейност ЗП - 5.6.1: на ул. „Крайбрежна“ - в УПИ IV кв.329а, вкл. реконструкция на пешеходна връзка (стъпала) - част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“																			Инвестиционната програма по ПО 1 на ОПРР 2014-2020
Дейност ЗП - 5.6.2: към сграда ТД на НАП и подход към университета																			Не е отчетен напредък

Дейност ЗП - 5.6.3: Двор на Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“																			Не е отчетен напредък
Проект Зона ЗП-5.7: Обновяване на обществените тоалетни в публичните пространства и приспособяване за хора с увреждания	10	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност ЗП - 5.7.1: обществената тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ №29, част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“	10	8			2														Инвестиционната програма по ПО 1 на ОПРР 2014-2020
Дейност ЗП - 5.7.2: УПИ IV кв.329А																			Включен в обхвата на Дейност ЗП-5 б.1: на ул. „Крайбрежна“ - в УПИ IV кв.329А
Зона ЗП-5.8Д: Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17PE/BG/000012	1 802	1 081	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Програма „LIFE“ 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия
Група проекти ЗП-6: Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт	1 002	852	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проект Зона ЗП-6.1: Изграждане на велоалея и велостоянки по ул. „Крайбрежна“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не е отчетен напредък

Проект Зона ЗИ-3.1: Осигуряване за заетост за нискоквалифицирани кадри	ОПРЧР, ПО 1	1 701	1 446	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ОПРЧР, ПО 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места - 13 проекта на частни бенефициенти
Проект Зона ЗИ-3.2: Преквалификация на кадри в различни сектори на икономиката според нуждите на пазара на труда		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не е отчетен напредък
Проект Зона ЗИ-3.3: Стажове за млади специалисти в различни направления		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не е отчетен напредък
Проект Зона ЗИ-3.4: Обучения за работещите за повишаване на квалификация, езикови и компютърни умения	ОПРЧР, ПО 1	1 232	905	0	0	0	160	0	0	168	0	0	0	0	0	0	ОПРЧР, ПО 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места - 6 проекта на частни бенефициенти
Проект Зона ЗИ-3.5: Осигуряване на Интернет достъп в зоната		29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проект - по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на Механизма за свързване на Европа (MSE).
Група проекти ЗИ-4: Стимулиране на младите предприемачи		653	555	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проект Зона ЗИ-4.1: Бизнес-обучение за млади предприемачи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не е отчетен напредък

Проект Д-3.5. Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 14	ОПРЧР, ПО2	999	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ОПРЧР, ПО 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2
Проект Д-3.6. "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" село Церова кория, общ. Велико Търново	ОПРЧР, ПО2	994	845	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ОПРЧР, ПО 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения.
Проект Д-3.7."Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Церова Кория" - 2018 г.		60	0	9	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проект „Красява България“ - част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.
Проект Д-3.8. "Реновация и модернизация на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост", с. Церова Кория - 2018 г.		30	0	3	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Фонд "Социална закрила" към МТСП
Проект Д-3.9. "Вътрешно прустройство на съществуващата сграда по Домашен социален патронаж - гр. Дебелец, общ. Велико Търново"		400	0	280	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Проект „Красява България“ - част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

Проект 3.1: Интегриран проект за воден цикъл на гр. Велико Търново - II част	ОПОС 1		4 462																Не е отчетен напредък		
Група проекти 4: Опазване и промотиране на културното наследство и туризма																					
Проект 4.1: Развитие на конгресен и фестивален туризъм - организиране на иновативни културни събития			4 868																4 868	Инвестиционната програма на Община Велико Търново	
Група проекти 5: Интеграция на маргинализиранни групи и хора с увреждания																					
Проект 5.1: Стимулиране образователната интеграция на рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение			19																19	Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика	
Проект 5.2: Развитие на услугата „личен асистент“, „социален помощник“ и домашен социален патронаж“ - наемане на повече лица			1 609																224	ОПРЧР 2014-2020 г., Фонд „Социална закрила“ към МТСП, ИП на Община Велико Търново	
Проект 5.3: Обмяна на опит и добри практики за работа с възрастни хора /за персонала на Дом за стари хора/																				Не е отчетен напредък	
Група проекти 6: Насърчаване на заетостта сред всички групи от населението																					
			2076																252	379	0

<p>Проект 11.1: Бизнес маркетинг и маркетинг на възможностите за инвестиции</p>					<p>635</p>	<p>540</p>
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------

13

83

Програма за
трансгранично
сътрудничество
INTERREG V-A
Румъния-
България 2014-
2020г. - Проект
„FairDeal –
мрежа -
платформа за
бърза доставка
на уникални
занаятчийски
продукти в
района на
трансграничното
сътрудничество”

Приложение №4. Финансово изпълнение на ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново (в хил. лв.)

Група проекти/проект	Приоритет	Мярка	ПЛАНИРАНА СТОЙНОСТ В ИПГВР 2013 г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОБЩО)	в т.ч.			% ИЗПЪЛНЕНИЕ
					Приключен (2014 г. - 2020 г.)	В процес на изпълнение	Планирани, очаквани финансиране (до 2023 г.)	
1	2	3	4	5	6	7	6	10
ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ "ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР" (ЗОНА С)								
Група проекти ЗС-1: Безопасна, обновена и привлекателна среда	ПЗ	С1	23726	20455	13531	0	6924	86,21%
Проект Зона ЗС-1.1: Достъпна архитектурна среда и подобряване безопасността на движението, и видеонаблюдение на пешеходни и зелени пространства /рампи, сигнални светофарни уредби, скосявания, асансьори към образователни обекти, на кръстовища, пешеходни пространства и зони за отдих и социална инфраструктура; поставяне на съоръжения за спиране паркирането по тротоари на главните улици /колчета, изолпираща растителност/	ПЗ	С1	235	10922	9998	0	924	4647,63%
Дейност ЗС-1.1.1: Достъпна среда в ж.к. „Чолаковци“				2710	2710			
Дейност ЗС-1.1.2: Достъпна среда в ж.к. „Зона В“				2930	2 930			
Дейност ЗС-1.1.3: Достъпна среда в ж.к. „Бузулдж“				5282	4358		924	

ЗС-1.1.3.1. Проект „Изпълнение на пряка пътна връзка между ул. Магистрална (републикански път I-4 „Севлиево – Велико Търново – Омуртаг“) и кв. Бузлуджа в гр. Велико Търново							1 848					
ЗС-1.1.3.2. Проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“									924			
ЗС-1.1.3.3. Изграждане на улици в кв. „Бузлуджа“							2 510					
Проект Зона ЗС-1.2: Паркоустрояване, благоустрояване, изграждане на пешеходни алеи и поставяване на градско обзавеждане в дубличните пространства	ПЗ	С1	23341	9533	3533	0	6000	40,84%				
Дейност ЗС-1.2.1: Зелени пространства в ж.к. „Зона В“ и ж.к. „Бузлуджа“				8069	2069		6000					
ЗС-1.2.1.1. Фаза 2. Зелени пространства в ж.к. „Зона В“ и ж.к. „Бузлуджа“							6 000					
ЗС-1.2.1.2. Изграждане на детски/спортни площадки в „Зона В“					490							
ЗС-1.2.1.3. Изграждане на детски/спортни площадки/стълбища в ж.к. „Бузлуджа“					1 579							
Дейност ЗС-1.2.2: Зелени пространства в ж.к. „Чолаковци“				1464	1464							
ЗС-1.2.2.1. Фаза 1. Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“					655							
ЗС-1.2.2.2. Изграждане на детски/спортни площадки в кв. „Чолаковци“					809							
Проект Зона ЗС-1.3: Съвременни средства за ориентация и информация - указателни и информационни табели в зоната	ПЗ	С1	150	0	0	0	0	0,00%				

Група проекти ЗС-2: Обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси	П4	С1	54300	7380	7380	0	0	13,59%
Проект Зона ЗС-2.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси	П4	С1	54300	7380	7380	0	0	13,59%
Дейност ЗС-2.1.1.: Жилищни комплекси в ж.к. „Зона В“					837			
Дейност ЗС-2.1.2.: Жилищни комплекси в ж.к. „Бузуджа“					4 577			
Дейност ЗС-2.1.3.: Жилищни комплекси в ж.к. „Чолаковци“					1 967			
Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и социална инфраструктура	П4	С1	3772	13016	8599	2500	1917	345,07%
Проект Зона ЗС-3.1: Рехабилитация, санитарен и енергийна ефективност на образователна инфраструктура, вкл. обновяване на дворини пространства, детски и спортни площадки, ремонт на огради, видеонаблюдение	П4	С1	3560	12345	8345	2500	1500	346,76%
Дейност ЗС-3.1.1: ДГ „Ален Мак“				1038	1038			
ЗС-3.1.1.1. Изграждане на инфраструктура по ОППР					913			
ЗС-3.1.1.2. Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“					125			
Дейност ЗС-3.1.2: ДГ „Рада Войвода“				1223	1223			
ЗС-3.1.2.1. Изграждане на инфраструктура по ОППР					1 222			
ЗС-3.2.1.2. Оборудване на ДГ „Рада Войвода“					1			

Проект Зона ЗС-3.2: Реконструкция на Народно читалище „Съзнание -1936“ и внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустройство и рехабилитация на двор и ограда	П4	С1	87	417	0	0	0	417	479,43%
Проект Зона ЗС-3.3: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на Дом за стари хора „В. Ботева“ /ул.„Дарион Драгостинов“ 3/	П4	С1	125	237	237	0	0	0	189,74%
ЗС-3.3.1. Подобряване на енергийната ефективност на ДСХ „В.Ботева“					128				
ЗС-3.3.2. Проект „Подмяна на част от наличното обзавеждане в Дом за стари хора „Венета Ботева“					39				
ЗС-3.3.3. Ремонт и оборудване на ДСХ „В.Ботева“					71				
ЗС-3.3.4.Д. Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел Михаил“, кв. Чолаковци	П4	С1		17	17	0	0	0	
Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания	П2	С2	20758	9732	7668	2064	0	0	46,88%
Проект Зона ЗС-4.1: Изграждане на нова сграда за развитие на специализирана социална услуга за възрастни хора и хора с увреждания с капацитет 130 човека	П2	С2	4276	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗС-4.2: Изграждане на кризисен център за бездомни и социално слаби лица	П2	С2	1150	2169	2169				188,62%
Проект Зона ЗС-4.3: Изграждане на общински комплекс за хранене, включително обществена трапезария за бездомни и социално слаби лица	П2	С2	1200	287	287	0	0	0	23,92%

ЗС-4.3.1. Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново							11			
ЗС-4.3.2. Предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ (2015г. – 2020г)							246			
ЗС-4.3.3. Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Велико Търново“							30			
Проект Зона ЗС-4.4: Стимулиране образователната интеграция на рисков групи, малцинства и хора в неравностойно положение	П2	С2	1200	118	118	0	0	0	0	9,84%
Проект Зона ЗС-4.5: Развитие на услугата „личен асистент“, „социален помощник“ и домашен социален патронаж“ - наемане на повече лица	П2	С2	1256	1639	1026	613	0	0	0	130,50%
ЗС-4.5.1. Проект „Подкрепа за независим живот“							500			
ЗС-4.5.2. Проект „Нови възможности за грижа“							377			
ЗС-4.5.3. Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“								41		
ЗС-4.5.4. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – компонент 2								399		
ЗС-4.5.5. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ - Компонент 3							47			
ЗС-4.5.6. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ - Компонент 4								172		

ЗС-4.5.7. Проект „Модернизирание на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - В. Търново“ - 2015 г.								21					
ЗС-4.5.8. Подобряване на материалната база на домашния патронаж								81					
Проект Зона ЗС-4.6: Обмяна на опит и добри практики за работа с възрастни хора /за персонала на Дом за стари хора/	П2	С2	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗС-4.7: Създаване на Дневни центрове за възрастни, хосписи и клубове по интереси	П2	С2	3670	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0,41%
Проект Зона ЗС-4.8: Изграждане на 3 бр. „Защитени жилища“ за лица с умствена изостаналост по 10 души капацитет за деинституционализация на лица с умствена изостаналост от Домовете за възрастни с умствена изостаналост на територията на Община В. Търново в ж.к. „Чолаковци“)	П2	С2	1870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗС-4.9: Изграждане на 3 бр. „Центъра за настаняване от семеен тип“ за лица с умствена изостаналост по 15 души капацитет, във връзка със стартиране на процеса по закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Пчелнице, общ. Велико Търново в ж.к. „Зона В“ и доставка на 3 бр. специализирани транспортни средства 8+1 места /бус/ пригодени за хора с увреждания с рампа	П2	С2	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Проект Зона ЗС-4.10: Продължаваща социална услуга за деца с увреждания след навършване на пълнолетие към Дневен център за деца с увреждания - проектиране и изграждане на 1 бр. Дневен център за лица с увреждания - корпус „Д“ от СОУ „Г.С.Раковски“ в УПИ IV, кв. 336 гр. Велико Търново, с капацитет 40 души	П2	С2	978	56	56	0	0	5,73%
Проект Зона ЗС-4.11: Проектиране и изграждане на 1 /едни/ бр. „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за лица с увреждания, с капацитет 40 души като форма на съвместваща социална услуга за проектовете социални услуги от резидентен тип в обхвата на ж.к. „Зона В“	П2	С2	1234	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗС-4.12Д: „Кризисен център за лица „Търновград“ (ул. „Драган Дончев“ № 8) - ЗОНА В	П2	С2	254	254	254	0	0	
Проект Зона ЗС-4.13Д: Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново	П2	С2	2008	2008	2 008	0	0	
Проект Зона ЗС-4.14Д: "Бъдеще за всяко дете" (ул. "Иларион Драгостинов" № 3А) - ж.к. "Бузлуджа"	П2	С2	307	307	307	0	0	
Проект Зона ЗС-4.15Д: "Ивестници в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново"	П2	С2	1050	1050	1 050	0	0	
Проект Зона ЗС-4.16Д: "И аз имам семейство"	П2	С2	377	377	377	0	0	

Проект Зона ЗС-4.17Д: „Приемни ме 2015“	П2	С2	1451	1451	1451	1451	0	0
Група проекти ЗС-5: Насърчаване на заетостта сред всички групи от населението	П6	С2	8325	2104	1366	738	0	25,27%
Проект Зона ЗС-5.1: Насърчаване на младежката заетост и заетостта за хора над 50 години	П6	С2	6235	1220	1179	42	0	19,57%
ЗС-5.1.1. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ 2014-2015 г.					84			
ЗС-5.1.2. Проект „Шанс за работа - 2014 г.“					7			
ЗС-5.1.3. Проект „Шанс за работа - 2015 г.“					16			
ЗС-5.1.4. Проект „Шанс за работа – 2016 г.“					6			
ЗС-5.1.5. Проект „Шанс за работа - 2017 г.“					3			
ЗС-5.1.6. Проект „Ние също можем - 2018 г.“					2			
ЗС-5.1.7. Програма за обучение и заетост „Клио“					14			
ЗС-5.1.8. Национална програма „Клио“					7			
ЗС-5.1.9. Регионална програма за заетост - 2014 г.					13			
ЗС-5.1.10. Регионална програма за заетост - 2015 г.					13			
ЗС-5.1.11. Регионална програма за заетост и обучение - 2016 г.					18			

3С-5.1.1.12. Регионална програма за заетост - 2017 г.									10				
3С-5.1.1.13. Регионална програма за заетост - 2018 г.									18				
3С-5.1.1.14. Регионална програма за заетост - 2019 г.									20				
3С-5.1.1.15. Регионална програма за заетост - 2020 г.									15				
3С-5.1.1.16. Национална програма „Активирание на неактивни лица“										42			
3С-5.1.1.17. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - Компонент №3									5				
3С-5.1.1.18. Проект ВГО51РО001-1.1.11 „Подкрепа за заетост“									137				
3С-5.1.1.19. Проект ВГО5М90РО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“									276				
3С-5.1.20. Проект ВГО5М90РО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“ - етап 2									85				
3С-5.1.21. Проект „Повярвай в себе си“									134				
3С-5.1.22. Проект „Осигуряване на заетост за достоен и независим живот“									295				
Проект Зона 3С-5.2: Заетост и работна среда за хора с увреждания	П6	С2	967	762	66	0	696	78,81%					
3С-5.2.1. Проект ВГО5М90РО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“ - Компонент II					66								
3С-5.2.2. Проект ВГО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“ - Компонент II							688						
3С-5.2.3. Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“							8						

Проект Зона ЗС-5.3: Повишаване квалификацията на учителите в детските градини и училищата - обучения за интерактивни методи на преподаване	П6	С2	1123	121	121	121				10,80%
Група проекти ЗС-6: Достъпна архитектурна среда	П3	С1	4403	1954	954	1000				44,37%
Проект Зона ЗС - 6.1: Подобриване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“; реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алеина връзка с ж.к. „Бузлуджа“, вкл. уллично озеленяване/ енергоспестяващо уллично осветление и достъпна среда, вкл. следните действия:	П3	С1	4233	1954	954	1000				46,15%
ЗС-6.1.1. Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново (фаза 1)					954					
ЗС-6.1.2. Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново (фаза 2)						1000				
Проект Зона ЗС-6.2: Изграждане на паркинги и подземни гаражи	П3	С1	170	0	0	0				0,00%
Група проекти ЗС-7: Подобриване на мобилността и развитие на мекс форми на транспорт	П5	С3	5970	11246	11204	0				188,38%
Проект Зона ЗС-7.1: Транспортна схема с алтернативни маршрути	П5	С3	50	113	71	0				225,36%
ЗС-7.1.1. Генерален план за организация на движението на град Велико Търново						42				

ЗС-7.1.2. Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Велико Търново"									71				
Проект Зона ЗС-7.2: Развитие на интегриран градски транспорт	П5	С3	5134	11134	11134				11134	0	0		216,86%
Проект Зона ЗС-7.3: Изграждане на велоален и велосъйоанки в кв. „Чолаковци“	П5	С3	786	0	0				0	0	0		0,00%
ОБЩО ЗА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ "С", С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР			121254	65886	50702				5343	9841			54,34%
ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ "ЗОНА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ" (ЗОНА II)													
Група проекти ЗП-1: Обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради	П4	П1	6590	114	0				114	0			1,74%
Проект Зона ЗП-1.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради, достъпна среда и видеонаблюдение	П4	П1	4750	114	0				114	0			2,41%
Дейност ЗП - 1.1.1: Община Велико Търново									114				
Дейност ЗП - 1.1.2: Централен военен архив													
Дейност ЗП - 1.1.3: Административен съд													
Дейност ЗП - 1.1.4: Областна администрация													

Проект Зона ЗП-3.2: Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, туристически център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище	ПЗ	П1	5200	23945	4	1 200	22 741	460,48%
Проект ЗП-3.2.1: „Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, културно - информационен център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище (Фаза 1)				14248	0	0	14 248	
Проект Зона ЗП-3.2.2: „Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, културно - информационен център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище (Фаза 2)				8493	0	0	8 493	
Проект Зона ЗП-3.2.3: Подобен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж"				4	4	0	0	
Проект Зона ЗП-3.2.4: Проектиране на сграда за Старо военно училище				600	0	600	0	
Проект Зона ЗП-3.2.5: Изграждане на комуникации и техническа инфраструктура				600	0	600	0	
Проект Зона ЗП-3.3: Развитие на конгресен и фестивален туризъм - организиране на иновативни културни събития	ПЗ	П1	3500	4868	4868	0	0	139,08%
Проект Зона ЗП-3.4: Проектиране и разширяване на Мултимедийния център на ул. „Николю“, административната сграда на РИМ	ПЗ	П1	350	1381	78	0	1 303	394,58%
ЗП-3.4.1. Разширяване на "Мултимедийен посетителски център" Царевград Търнов" –II-ри етап;				1303	0	0	1 303	
ЗП-3.4.2 Ремонти и оборудване на „Мултимедийен посетителски център „Царевград Търнов“				78	78	0	0	

Проект Зона ЗП-3.5Д: Проект ЗП - CityTour - културно /градско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм	ПЗ	П1			516	516	0	0	
Група проекти ЗП-4: Модернизирани на публични пространства и зони за рекреация	ПЗ	П2	517		1344	1434	90	0	277,34%
Проект Зона ЗП-4.1: Реновиране на пешеходни пространства	ПЗ	П2	160		806	806	0	0	503,55%
Дейност ЗП - 4.1.1: пл. „Съединение“ - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; проектиране на дъждовна канализация; поставяне на указателни и информационни табели); елементи на градското обзавеждане					217	217	0	0	
Дейност ЗП - 4.1.2: пл. „Велчова завера“					69	69	0	0	
Дейност ЗП - 4.1.3: пл. „Поборнически“					381	381	0	0	
Дейност ЗП - 4.1.4: Възрожденския площад „Самоводски пазар“, чешмата, осветлението и зелената площ при паметника на „Ем. Станев“					102	102	0	0	
Дейност ЗП - 4.1.5Д: Осигуряване на пешеходен достъп					38	38	0	0	
Проект Зона ЗП-4.2: Реконструкция и рехабилитация на изгледни площадки по ул. „Стефан Стамболов“	ПЗ	П2	75		200	200	0	0	266,80%
Дейност ЗП - 4.2.1: Реконструкция на изгледна площадка (като част от пешеходната зона).									
Дейност ЗП - 4.2.2: Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление.									

Втори етап							1177	0	0	
Трети етап							755	0	0	
Четвърти етап							1728	0	0	
Проект Зона ЗП-5.2: Градска среда в старата градска част -Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане	ПЗ	П2	6376	8242	8242		8242	0	0	129,27%
ЗП-5.2.1. Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДФП № BG16RFOP001-1.009-0004-S01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.)							6741	0	0	
ЗП-5.2.2. Рехабилитация на улици в зоната							1 501	0	0	
Проект Зона ЗП-5.3: Модернизация и изграждане на детски площадки	ПЗ	П2	143	56	56		56	0	0	39,03%
Проект Зона ЗП-5.4: Поставяне на съоръжения за намаляване на скоростта и ограничаване на паркирането по пешеходни пространства и тротоари към главните улици /колчета, изолтираща растителност, огради/	ПЗ	П2	398	1258	1258		1258	0	0	316,13%
ЗП-5.4.1. Поставяне на сигнализация и прегради							292			
ЗП 5.4.2. Ремонт на тротоарна мрежа в централна градска част							966			

Проект Зона ЗП-5.5: Улесняване на достъпа на хора с увреждания в градската среда и към административни и обществени сгради	ПЗ	П2	120	124	124	124	0	0	103,24%
Дейност ЗП - 5.5.1: Сигнални светофари и информационни средства за незрящи хора, асансьори към административни и обществени сгради									
Дейност ЗП - 5.5.2: Достъп до културни ценности и музеи						124			
Проект Зона ЗП-5.6: Реконструкция на обществени паркинги	ПЗ	П2	510	323	323	323	0	0	63,36%
Дейност ЗП - 5.6.1: на ул. „Крайбрежна“ - в УПИ IV кв.329а, вкл. реконструкция на пешеходна връзка (стъпала)						323			
Дейност ЗП - 5.6.2: към сграда ТД на НАП и подход към университета									
Дейност ЗП - 5.6.3: Двор на Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“									
Проект Зона ЗП-5.7: Обновяване на обществените тоалетни в публичните пространства и приспособяване за хора с увреждания	ПЗ	П2	248	10	10	10	0	0	4,01%
Дейност ЗП - 5.7.1: обществената тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ №29						10			
Дейност ЗП - 5.7.2: УПИ IV кв.329А									
Зона ЗП-5.8Д: Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“	П4	П2		1802	1802	0	1802	0	

Група проекти ЗП-6: Подобриване на мобилността и развитието на местни форми на транспорт	П5	П2	1450	1002	0	1002	0	69,10%
Проект Зона ЗП-6.1: Изграждане на велоалея и велоостоянки по ул. „Крайбрежна“	П5	П2	1300	0	0	0	0,00%	
Проект Зона ЗП-6.2: Съвременни системи за ориентация и информация	П5	П2	150	1002	0	1002	0	66,795%
Група проекти ЗП-7: Повишаване капацитета на местната администрация	П6	П3	6023	2117	1593	524	0	35,15%
Проект Зона ЗП-7.1: Обучение на управленските екипи и работещите в местните административни структури	П6	П3	2678	164	164	0	0	6,11%
Проект Зона ЗП-7.2: Закупуване на нова техника в административните структури	П6	П3	3345	541	541	0	0	16,18%
Проект Зона ЗП-7.3Д: Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020	П6	П3	233	233	0	233	0	
Проект Зона ЗП-7.4Д: Европейска академия	П6	П3	291	291	0	291	0	
Проект Зона ЗП-7.5Д: Информационни системи на администрацията	П6	П3	748	748	748	0	0	
Проект Зона ЗП-7.6Д: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в община Велико Търново	П6	П3	140	140	140	0	0	

Група проекти ЗП-8: Повишаване на образователното равнище и стимулиране на научния капацитет	П1	П3	3514	527	527	0	0	0	15,01%
Проект Зона ЗП-8.1: Стимулиране на научните изследвания в Център за квалификация и преквалификация и филиал на БАН	П1	П3	2754	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗП-8.2: Обновяване и дигитализиране на научен фонд и закупуване на софтуер за пезарщи хора в културните и образователни институции	П1	П3	760	527	527	0	0	0	69,39%
ЗП-8.2.1. Проект „Дигитална културна съкровищница "Север +": документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България"					386				
ЗП-8.2.2. Оборудване на РБ "П.Р.Славейков"					141				
Група проекти ЗП-9: Повишаване квалификацията на кадровите ресурси	П2	П3	4450	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗП-9.1: Осигуряване на загост и достъпна работна среда за хора с увреждания	П2	П3	3200	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗП-9.2: Обучение за работа със зависими хора, работа с наследници и деца жертва на насилие, превенция за изоставени деца	П2	П3	150	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗП-9.3: Преквалификация на кадри в различни сектори за адаптивност на пазара на труд	П2	П3	1100	0	0	0	0	0	0,00%

Проект Зона ЗИ-1.3: Съвременни системи за информация и ориентация	ПЗ	И1	54	0	0	0	0	0	0,00%
Група проекти ЗИ-2: Енергийна ефективност и обновяване на производствени сгради			45795	21958	21779	179	0	0	47,95%
Проект Зона ЗИ-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на обществени сгради	П4	И1	2450	0	0	0	0	0	0,00%
Дейност ЗИ - 2.1.1: АРР на ОДМВР									
Дейност ЗИ - 2.1.2: Промислена енергетика ВТ									
Дейност ЗИ - 2.1.3: Толлофикация ВТ									
Проект Зона ЗИ-2.2: Мерки за енергийно обновяване на производствени сгради	П4	И1	32000	21609	21609	0	0	0	67,53%
Проект Зона ЗИ-2.3: Мерки за зелена икономика - изграждане на съоръжения за намаляване емисиите на вредни газове	П4	И1	11345	349	170	179	0	0	3,08%
Проект Зона ЗИ-2.3.1: "Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново"						179			
Проект Зона ЗИ-2.3.2: Автоматична станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух					170				
Проект Зона ЗИ-2.3.3: Изграждане на съоръжения за намаляване емисиите на вредни газове									
Група проекти ЗИ-3: Застост, образование и преквалификация	П2	И2	13840	2962	2962	0	0	0	21,40%

Проект Зона ЗИ-3.1: Осигуряване заетост за нискоквалифицирани кадри	П2	И2	4400	1701	1701	0	0	0	38,65%
Проект Зона ЗИ-3.2: Преквалификация на кадри в различни сектори на икономиката според нуждите на пазара на труда	П2	И2	1180	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗИ-3.3: Стажове за млади специалисти в различни направления	П2	И2	6480	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗИ-3.4: Обучение за работещите за повишаване на квалификация, езикови и компютърни умения	П2	И2	1560	1232	1232	0	0	0	78,99%
Проект Зона ЗИ-3.5: Осигуряване на Интернет достъп в зоната	П2	И2	220	29	29	0	0	0	13,34%
Група проекти ЗИ-4: Стимулиране на младите предприемачи	П1	И2	605	653	283	370	0	0	107,91%
Проект Зона ЗИ-4.1: Бизнес-обучение за млади предприемачи	П1	И2	180	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗИ-4.2: Обучение за управленските екипи за организация и управление на проекти	П1	И2	425	653	283	370	0	0	153,61%
Група проекти ЗИ-5: Стимулиране използването на интелективни и иновативни производствени системи	П1	И3	54200	19423	15799	3623	0	0	35,84%
Проект Зона ЗИ-5.1: Иновации и технологична модернизация на предприятия	П1	И3	20000	1027	1027	0	0	0	5,13%

Проект Зона ЗИ-5.2: Въвеждане на модерни информационно-комуникационни технологии в предприятията	П1	ИЗ	10000	507	507	507	0	0	5,07%
Проект Зона ЗИ-5.3: Повишаване ресурсната ефективност в предприятията	П1	ИЗ	2400	17889	14266	3623	0	0	745,39%
Проект Зона ЗИ-5.4: Изграждане на панаирно градче за изложния и конгреси	П1	ИЗ	800	0	0	0	0	0	0,00%
Проект Зона ЗИ-5.5: Ефективно третиране на отпадъците, сенариране и преработка - екоиновации	П1	ИЗ	21000	0	0	0	0	0	0,00%
Група проекти ЗИ-6: Реклама и промоция на икономическите дейности	П6	ИЗ	3400	1123	1123	0	0	0	33,02%
Проект Зона ЗИ-6.1: Бизнес маркетинг и маркетинг на възможностите за инвестиции	П6	ИЗ	1800	635	635	0	0	0	35,27%
Проект Зона ЗИ-6.2: Рекламирање и промоция на икономическата дейност	П6	ИЗ	1600	488	488	0	0	0	30,50%
ОБЩО ЗА ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТИП "ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"			124408	49171	43999	4172	1000	1000	39,52%
ОБЩО ИПГВР			344179	178066	120405	15715	41947	41947	51,74%
ДРУГИ ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ИПГВР									

Група проекти Д-1: Обновяване и енергийна ефективност на МФЖС и обществени сгради	П4	С1		9432	9432	0	0	0
Проект Д-1.1.: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси	П4	С1		9432	9432	0	0	0
Група проекти Д-2: Обновяване на образователната инфраструктура	П4	С1		15632	5165	3413	7054	
Проект Д-2.1. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“	П4	С1		3840	1 221	0	2 618	
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Велико Търново“;							2 618	
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилция Станев“ гр. Велико Търново“.					1 221			
Проект Д-2.2. „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“	П4	С1		3356	0	3 356	0	
ПП по електроника „Александър С. Попов“ - Велико Търново						1 296		
ПП по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Велико Търново						419		
ПП по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“						1 640		
Проект Д-2.3. „Изграждане на детска градина в кв. „Картала“, гр. Велико Търново	П4	С1		2972	0	0	2 972	

Проект Д-2.4. „Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев“ за осигуряване на едноменен режим на обучение - гр. В. Търново“	П4	С1				1366	0	0	1 366
Проект Д-2.5. „Реконструкция на сграда на ОУ „Бачо Киро“ - гр. Велико Търново за осигуряване на едноменен режим на обучение“	П4	С1			98	0	0	0	98
Проект Д-2.6. Модернизация на образователната инфраструктура на ДГ „Първи юни“	П4	С1			218	218	0	0	0
Проект Д-2.7: Модернизация на образователна инфраструктура, вкл. дворни пространства, достъпна среда и видеонаблюдение	П4	С1			3783	3 726	57	0	0
Група проекти Д-3: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания	П2	С1			8242	2601	3647	1993	
Проект Д-3.1. "Общостен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД"	П2	С2			1192	1 192	0	0	0
Проект Д-3.2. "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" (ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3)	П2	С2			820	820	0	0	0
Проект Д-3.3. "Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост" (с. Церова кория)	П2	С2			2706	0	2 706	0	0
Проект Д-3.4. „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ (ул. „Симеон Велики“ № 3)	П2	С2			941	0	941	0	0

Проект Д-3.5. Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 14	П2	С2		999	0	0	999
Проект Д-3.6. "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" село Церова кория, общ. Велико Търново	П2	С2		994	0	0	994
Проект Д-3.7."Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Церова Кория" - 2018 г.	П2	С2		60	60	0	0
Проект Д-3.8. "Реновация и модернизация на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост", с. Церова Кория - 2018 г.	П2	С2		30	30	0	0
Проект Д-3.9. "Вътрешно преустройство на съществуващата сграда по Домашен социален патронаж - гр. Дебелец, общ. Велико Търново"	П2	С2		400	400	0	0
Проект Д-3.10. Други инвестиции за социална инфраструктура извън зоните за въздействие	П2	С2		99	99	0	0
Група проекти 4: Съвръзаност и достъпност	П5	П2		15753	4368	11385	0
Проект Д-4.1. "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“, чрез общи мерки в трансграничния регион“, чийто общ бюджет възлиза на 12 966 342,32 лв.	П5	П2		11385		11385	

**ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ,
ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР
И ИДЕНТИФИЦИРАНИ ДРУГИ ПРОЕКТИ,
ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
НА ИПГВР НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.**

БЕЛЕЖКА

В настоящото приложение са използвани наименованията на проектите, така както са формулирани при приемане на ИПГВР. Когато проект/обект/дейност са финансирани чрез проект, с наименование различно от това в ИПГВР е посочено и конкретното наименование на проектното предложение, чрез което е получено финансиране. За обекти, които са с променени наименования (напр. ОДЗ) да използвани актуалните наименования в съответствие с нормативната уредба.

1. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

1.1. Група проекти ЗС-1: Безопасна, обновена и привлекателна среда

Проект Зона ЗС-1.1: Достъпна архитектурна среда и подобряване безопасността на движението, и видеонаблюдение на пешеходни и зелени пространства /рампи, сигнални светофарни уредби, скосявания, асансьори към образователни обекти, на кръстовища, пешеходни пространства и зони за отдих и социална инфраструктура; поставяне на съоръжения за спиране паркирането по тротоари на главните улици /колчета, изолираща растителност/

В обхвата на проекта са включени 3 обекта (т.нар. дейност):

Дейност ЗС-1.1.1: Достъпна среда в ж.к. „Чолаковци“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г./ПМС

Размер на инвестицията: 2 709 812 лв.

Период на изпълнение: 2016-2020 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. Община Велико Търново инвестира в реконструкция на улична мрежа в следните обекти:

Реконструкция улична мрежа, в т.ч. довършителни строителни дейности на парк в кв. „Чолаковци“ (2016 г.)

Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. „Чолаковци“, гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. и ПМС 160/04.08.2017 г. (2017г.)

Изграждане на улици в кв. „Чолаковци“ - кв. „7“, УПИ II, В и кв. „14“, УПИ 1 и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на уличната настилка и асфалтиране, нов парк в източната част на квартала със средства по ПМС 260/24.11.2017 г. (2017-2018г.)

Възстановяване на стоманобетонен мост за кв. „Чолаковци“ над река Белица на общински път VTR1010 /I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. „Чолаковци“, ул. „Сан Стефано“ (GAB 3110) по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г. (2019г.)

Източник на информация: Община Велико Търново

Дейност ЗС-1.1.2: Достъпна среда в ж.к. „Зона В“

ЗС-1.1.2.1. Изграждане на ул. „Драган Цончев“, кв. Зона В

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г./ПМС

Размер на инвестицията: 2 929 902 лв.

Период на изпълнение: 2018 г.

Кратко описание: За периода

Изграждане на ул. „Драган Цончев“, кв. Зона В, ОК8504- ОК8602-ОК8607-ОК8613 (ПМС 315/19.12.2018); Изграждане на ул. „Димитър Рашев“ и улици около новострояща се ДГ „Шареният замък“ в кв. „Зона В“; Изграждане на ул. „Димитър Рашев“ (ОК 8161 - ОК 8160 - ОК 8478 - ОК 8479 - ОК 8481) в района на Ел. подстанция и връзката и с новия участък на ул. „Ил. Драгостинов“ в кв. „Зона В“

Източник на информация: Община Велико Търново

Дейност ЗС-1.1.3: Достъпна среда в ж.к. „Бузлуджа“

ЗС-1.1.3.1. Проект „Изпълнение на пряка пътна връзка между ул. „Магистрална“ и кв. „Бузлуджа“ в гр. Велико Търново

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ПМС 165/7.08.2018г.

Размер на инвестицията: 1 848 300 лв.

Период на изпълнение: 2018 -2020г.

Кратко описание: Изграждане на пряка пътна връзка между ул. „Магистрална“ (републикански път I-4 „Севлиево – Велико Търново – Омуртаг“) и кв. „Бузлуджа“ в гр. Велико Търново

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-1.1.3.2. Проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Статус: Планиран (в оценка, очаква финансиране)

Източник на финансиране: Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

Размер на инвестицията: 923 837,56 лв.

Период на изпълнение: 18 месеца

Дата на сключване на БФП: На 16.03.2020г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGENERGY-2.001-0003 „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“. Към датата на настоящия отчет проектното предложение е в процес на оценка, като се очаква до средата на месец август решение за финансиране от Управляващия орган на финансиращата програма.

Кратко описание: Целта на проекта е да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на община Велико Търново и да подобри условията на живот на населението. Качеството на уличното осветление, неговото изграждане, експлоатация и поддръжка изцяло зависят от това до каква степен са спазени изискванията на съответната нормативна база: нормите за яркост, осветеност, обща и надлъжна равномерност, заслепяване и други параметри.

Проектът ще се реализира: въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни; подмяна на осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение; използване на електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия; подмяна на конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на новите осветителни тела; подмяна за захранващите кабели в металните стълбове за намаляване на повреди заради кабелни аварии в стълбовете;

Предвижда се интервенцията да се реализира в най-населените жилищни квартали на Велико Търново - кв. „Бузлуджа“, кв. „Зона – Б“, кв. „Кольо Фичето“, кв. „Картала“ с над 37 000 жители.

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-1.1.3.3. Изграждане на улици в кв. „Бузлуджа“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г. (Други извънбюджетни средства)

Размер на инвестицията: 2 510 077 лв.

Период на изпълнение: 2020 г.

Кратко описание: Доизграждане на ул. „Димитър Благоев“ в участъка (ОК 8153 - ОК 8157 - ОК 8154) и връзката и с новия участък на ул. „Ил. Драгостинов“ в кв. „Бузлуджа“ Доизграждане на ул. „Иван Хаджидимитров“ в участъка (ОК 2081 - ОК 8361 - ОК 8354 - ОК 8157) и връзката и с ул. „Д.Благоев“ в кв. „Бузлуджа“; Изграждане на ул. „Народни Будители“ в участъка (ОК 8752 - ОК 8134 - ОК 8166) и връзката и с новия участък на ул. „Ил. Драгостинов“ в кв. 608, кв. „Бузлуджа“; Изграждане на ул. „Народни Будители“ в участъка (ОК 8122 - ОК 8120 - ОК 8121 - ОК 8119) между кв. 607, кв. 611, кв. 612 и кв. 602 кв. „Бузлуджа“ - Лидл - механа „Петлето“)

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-1.2: Паркоустройство, благоустройство, изграждане на пешеходни алеи и поставяне на градско обзавеждане в публичните пространства

В обхвата на проекта са включени 2 обекта (т.нар. дейност):

Дейност ЗС-1.2.1: Зелени пространства в ж.к. „Зона В“ и ж.к. „Бузлуджа“

ЗС-1.1.2.1. Фаза 2. Зелени пространства в ж.к. „Зона В“ и ж.к. „Бузлуджа“

Статус: Планиран (резервен проект в ИП по ОПРР)

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 6 000 000 лв.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-1.2.1.2. Изграждане на детски/спортни площадки в „Зона В“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, ОП „Регионално развитие“ (2007-2013)

Размер на инвестицията: 490 397,75 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. е изпълнен следния инфраструктурен обект: „Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Зона В“

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-1.2.1.3. Изграждане на детски/спортни площадки/стълбища в ж.к. „Бузлуджа“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г., ПМС, ОПРР

Размер на инвестицията: 1 578 944,23 лв.

Период на изпълнение: 2014-2019 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. Община Велико Търново инвестира в следните обекти: Изграждане на детски площадки в парк „Бузлуджа“ и на ул. „Хр. Донеv“ №11(2016г.); Основен ремонт на детски площадки (2019г.); „Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на „Спортно училище – Велико Търново“ (2019г.) – ПМС 165/7.08.2018г.; Мобилни покрити скамейки за футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище „Г. Живков“ (2019г.) - ОП „Спортни имоти и прояви“; Мултифункционален контейнер за футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище „Г. Живков“ (2019г.) - ОП „Спортни имоти и прояви“; Изграждане на площадка и паркова чешма в парк „Руски гробища“, ж.к. „Бузлуджа“ (2017г.); Парк „Руски“ в кв. „Бузлуджа“ – изграждане на улично осветление, поливна система и ограда (2015г.); Извършен ремонт на стълбището от Спортно училище „Георги Живков“ към футболно игрище (2019г.), „Благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бузлуджа, кв.353-І, кв. 636-І, кв.637-V, VI, VII“ (2015г.)

Източник на информация: Община Велико Търново

Дейност ЗС-1.2.2: Зелени пространства в ж.к. „Чолаковци“

ЗС-1.2.2.1. Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ Фаза 1.

Статус: Приключен (от основния списък на ИЦ на ОПРР)

Източник на финансиране: Приоритетна ос І на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 654 896,84 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 17.07.2019

Кратко описание: Подобряване на градската среда в кв. „Чолаковци“. През 2019 всички СМР са приключени и обектите въведени в експлоатация. Принос на обекта към общите индикатори по проекта - 17 600 м² зелени площи; 678,10 м² паркови настилки. Извършена е реконструкция на пешеходна пътека между кв. „Бузлуджа“ и кв. „Чолаковци“; обновяване на площадките за отдих, а осветлението е изпълнено с паркови осветителни тела, поставени през разстояние от около 15-20 м., с по-голяма концентрация в района на площадките; доставени и монтирани са елементи от градското обзавеждане, както и озеленителни работи.

ЗС-1.2.2.2. Изграждане на детски/спортни площадки в кв. „Чолаковци“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г., ОПРР

Размер на инвестицията: 808 813,33 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. са изпълнени следните инфраструктурни обекти: „Изграждане на спортна площадка в кв. „Чолаковци“; „Изграждане на парк и детска площадка в кв. „Чолаковци“ (кв.7 УПИ II, V, кв.14, УПИ I); Допълнителни дейности по реализация на Парк „Чолаковци“, съгласно сключен ДБФП (2015г.)

Проект Зона ЗС-1.3: Съвременни средства за ориентация и информация - указателни и информационни табели в зоната

Статус: Приключен

Включен в обхвата на проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.) – фаза 1

1.2. Група проекти ЗС-2: Обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси

Проект Зона ЗС-2.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на жилищните комплекси

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМФЖС)

Кратко описание: Изпълнени са 8 проекта, както следва:

Дейност ЗС-2.1.1.: Жилищни комплекси в ж.к. „Зона В“

ул. „Драган Цончев“ №23, вх.„А“, вх.„Б“, вх.„В“

Размер на инвестицията: 836 676,71 лв.

Дейност ЗС-2.1.2.: Жилищни комплекси в ж.к. „Бузлуджа“

ул. „Генерал Иван Сарафов“ №5

ул. „Георги Измирлиев“ №16 вх.„А“, вх.„Б“ вх.„В“, вх.„Г“

ул. „Георги Измирлиев“ № 15 бл.2 вх.„А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“, „Е“, „Ж“

ул. „Георги Измирлиев“ № 12, вх. „А“, „Б“, „В“

Размер на инвестицията: 4 576 545,95 лв.

Дейност ЗС-2.1.3.: Жилищни комплекси в ж.к. „Чолаковци“

ул. „Райчо Николов“ № 1, вх. „А“

ул. „Райчо Николов“ №3

ул. „Бяла Бона“ №15, вх.„А“, вх.„Б“

Размер на инвестицията: 1 966 787,98 лв.

Източник на информация: НПЕЕМФЖС

1.3. Група проекти ЗС-3: Обновяване на образователна, културна и социална инфраструктура

Проект Зона ЗС-3.1: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на образователна инфраструктура, вкл. обновяване на дворни пространства, детски и спортни площадки, ремонт на огради, видеонаблюдение

В обхвата на проекта са включени 5 самостоятелни обекта (т.нар. дейности).

Дейност ЗС- 3.1.1: ДГ „Ален Мак“

ЗС-3.1.1.1. Изграждане на инфраструктура по ОПРР

Проектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Образователна инфраструктура“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от Проект № BG16RFOP001-1.009-0001-C01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C02. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 912 709 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 04.10.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 04.04.2020

Кратко описание: В обхвата на проекта са включени дейности, свързани с постигането на енергийна ефективност; с постигането на модерна образователна инфраструктура чрез конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, достъпна

среда на сградите, водещи до устойчиво градско развитие; изготвяне на работен проект и др.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-3.1.1.2. Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 124 962 лв.

Период на изпълнение: 2015-2017 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. са изпълнени следните дейности: реконструкция и модернизация (2015г., 2016 г.); основен ремонт детска площадка (2017г.); закупуване на интерактивна дъска и проектор (2017г.).

Източник на информация: Община Велико Търново

Дейност ЗС- 3.1.2: ДГ „Рада Войвода“

ЗС-3.1.2.1. ЗС-3.1.2.1. Изграждане на инфраструктура по ОПРР

Проектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Образователна инфраструктура“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от Проект № BG16RFOP001-1.009-0001-C01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C02. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 1 221 938,35 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДФФП: 04.10.2017г.

Дата на приключване на АДФФП: 04.04.2020

Кратко описание: В обхвата на проекта са включени дейности, свързани с постигането на енергийна ефективност; с постигането на модерна образователна инфраструктура чрез конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, достъпна среда на сградите, водещи до устойчиво градско развитие и др.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-3.2.1.2. Оборудване на ДГ „Рада Войвода“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 635 000 лв.

Период на изпълнение: 2017 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. са изпълнени следните дейности: закупуване на компютърна конфигурация (2017г.).

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-3.1.3: СУ „Вела Благоева“

ЗС-3.1.3.1. Инвестиции по ОПРР - резервен обект

Статус: Планиран (резервен проект в ИП по ОПРР)

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 1 500 000 лв.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-3.1.3.2. Модернизация на образователната инфраструктура на СУ „В. Благоева“

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект №BG161PO001/1.1-09/2010/033 „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Източник на финансиране: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010 - Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1: „Социална инфраструктура“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Размер на инвестицията: 1 047 504,74 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

Кратко описание: Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност
Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-3.1.3.3. Ремонт и оборудване на СУ „Вела Благоева“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 173 090 лв.

Период на изпълнение: 2014-2018 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. са изпълнени следните дейности: Компютърно оборудване и проектор (2014г.); Безжична мрежа (2014г.); Климатични системи (2014г.); Изграждане на газова инсталация и газификация на котелно помещение (2014г.); Копирна машина (2015г.); Изграждане на газова инсталация и газификация на котелно помещение (2015г.); Основен ремонт санитарни помещения (2016г.); Компютри (2017г.); Безжична мрежа (2017г.); Лиценз софтуерен продукт (2017г.); Компютри и хардуер (2018г.); Климатични системи (2018г.); Частичен ремонт на ограда (2018г.); лаптопи, подопочистваща машина (2020)

Източник на информация: Община Велико Търново

Дейност ЗС-3.1.4: СУ „Г. Сава Раковски“ и спортно училище

В дейността са включени 2 подобекта: СУ „Георги Сава Раковски“ и спортно училище „Г. Живков“.

ЗС-3.1.4.1. Изграждане на инфраструктура по ОПРР

Проектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Образователна инфраструктура“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от Проект № BG16RFOP001-1.009-0001-C01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C02. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново“, част от процедура

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 1 095 609,31 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 04.10.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 04.04.2020

Кратко описание: В обхвата на проекта са включени дейности, свързани с постигането на енергийна ефективност; с постигането на модерна образователна инфраструктура чрез конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, достъпна среда на сградите, водещи до устойчиво градско развитие, работен проект и др.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-3.1.4.2. Оборудване в СУ „Г.С.Раковски“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 6 350 лв.

Период на изпълнение: 2018 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. са изпълнени следните дейности: изграждане на безжична интернет мрежа (2018г.).

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-3.1.4.3. Ремонт и оборудване в Спортно училище „Г. Живков“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 135 936 лв.

Период на изпълнение: 2018 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. са изпълнени следните дейности: Дограма Спортно училище В. Търново (2014г.); Компютърна конфигурация, хардуер, преносим компютър (2014г.); Безжично оборудване (2014г.); Преустройство на помещения (2015г.); Софтуерна програма (2015г.); Ученическо общежитие към Спортно училище ВТ - преустройство на помещение в три броя класни стаи със санитарни възли (2016г.); Компютърни конфигурации (2016г.); Климатична система (2016г.); Компютърни конфигурации и лаптоп (2017г.); Система за гласово уведомяване (2017г.); Лаптоп и интерактивна дъска (2018г.); Изграждане на Wi-Fi мрежа (2019г.); Закупуване на интерактивни дъски (2019г.); Изграждане на компютърна конфигурация (2019г.)

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-3.1.5.1. Изграждане на инфраструктура по ОПРР

Проектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Образователна инфраструктура“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от Проект № BG16RFOP001-1.009-0001-C01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C02. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 2 407 819, 84 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 04.10.2017г

Дата на приключване на АДБФП: 04.04.2020

Кратко описание: В обхвата на проекта са включени дейности, свързани с постигането на енергийна ефективност; с постигането на модерна образователна инфраструктура чрез конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, достъпна среда на сградите, водещи до устойчиво градско развитие и др.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-3.1.5.2. Модернизация на образователната инфраструктура на СУ „Владимир Комаров“

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект №BG161PO001/1.1-09/2010/033 „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Източник на финансиране: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010 - Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1: „Социална инфраструктура“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Размер на инвестицията: 1 098 140,64 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

Кратко описание: Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-3.1.5.3. Ремонт и оборудване на СУ „Владимир Комаров“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 119 861 лв.

Период на изпълнение: 2018 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. са изпълнени следните дейности: ремонт на покрив (2014-2015г.); закупуване на компютърна конфигурация и интерактивна дъска и софтуер за управление на класна стая (2014г.); закупуване на проектор, антивирусен софтуер (2015г.); изграждане на безжична интернет мрежа (2018г.); климатици (2020).

Източник на информация: Община Велико Търново

Дейност ЗС- 3.1.6Д: Изграждане на нова детска градина в зона „В“ - ДГ „Шарения замък“

ЗС-3.1.6.1. Изграждане на нова детска градина

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ПМС 260/24.11.2017

Размер на инвестицията: 1 700 000 лв.

Период на изпълнение: 2018 – 2021 г.

Кратко описание: Строителството е върху терен от 4,6 декара. Застроената площ ще е близо 950 кв. метра. Проектът на община Велико Търново предвижда оформянето на голяма спортна площадка, умален амфитеатър, зона за ролеви игри, кътове с беседки и парково пространство. В новата детска градина ще бъдат разкрити пет нови групи за общо 120 деца. Нова детска градина се строи за първи път от 40 години насам, припомниха от общината.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-3.1.6.2. „Доизграждане на детска градина „Шареният замък“

Статус: Планиран (одобрен, очаква подписване на договор)

Източник на финансиране: Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 на Министерство на образованието, Модул 1 – Детски ясли и градини, Модул 2 – Неспециализирани училища, професионални гимназии

Размер на инвестицията: 800 000 лв.

Период на изпълнение: 2021 – 2022 г.

Кратко описание: През 2019 г. Община В. Търново стартира изграждането на новата детска градина. Поради недостиг на финансов ресурс СМР за доизграждането на градината са временно преустановени. С осигурения допълнителен финансов ресурс ще стане възможно въвеждането в експлоатация на сградата, като след завършването ѝ ще се разкрийт нови 120 места за прием на деца от 3 до 7 години, с което ще се даде реална възможност за преодоляване на недостига при приема на деца в града. Ще се създадат условия за здравословна жизнена среда за нормално физическо и психическо развитие на децата и възможност всички деца да получат предучилищното си образование в по-голяма близост до местоживеенето им.

С оглед на пълната проектна готовност, проведените процедури и стартиралото строителство, при осигуреното вече допълнително финансиране Община В. Търново гарантира реализиране на инвестицията в най-кратки срокове, за да може през учебната 2021/2022 година детска градина „Шареният Замък“, гр. Велико Търново да приеме своите първи възпитаници.

Източник на информация: МОН, Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-3.2: Реконструкция на Народно читалище „Съзнание – 1936“ и внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда

Статус: Планиран (резервен проект в ИП по ОПРР)

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 417 099,98 лв.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-3.3: Рехабилитация, саниране и енергийна ефективност на Дом за стари хора „В. Ботева“ /ул. „Иларион Драгостинов“ 3/

Проектът е изпълнен чрез реализирането на 2 проекта с външно финансиране и 1 от Инвестиционната програма на Община Велико Търново.

ЗС-3.3.1. Подобряване на енергийната ефективност на ДСХ „В.Ботева“

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Обектът е част от проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Грантова схема BG04-02-03: „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“

Размер на инвестицията: 127 873,52 лв.

Период на изпълнение: 2016-2017 г.

Кратко описание: Внедрените мерки за енергийна ефективност касаят преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащи съоръжения.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-3.3.2. Проект „Подмяна на част от наличното обзавеждане в Дом за стари хора „Венета Ботева“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Размер на инвестицията: 38 528,86 лв.

Период на изпълнение: 5 месеца (30.06.2020 - 30.11.2020 г.)

Кратко описание: Обновено остарялото и амортизирано обзавеждане в сградата на специализираната институция, част от което не е подменяно повече от 40 години. Във всяко от 86-те индивидуални помещения, обитавани от потребителите са доставени нови гардероби, скринове, шкафове и трапезни маси. Осигурена е по-комфортна и уютна среда за възрастните хора, настанени в специализираната институция.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-3.3.3. Ремонт и оборудване на ДСХ „В.Ботева“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 70 775 лв.

Период на изпълнение: 2015-2019 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. са изпълнени следните дейности: закупуване на компютри (2015г.); Основен ремонт на кухненски блок (2016г.); Изграждане на пожароизвестителна инсталация (2016г.); Апарат за магнитотерапия (2016г.); Компютри (2018г.); Климатични системи (2018г.); Вътрешно адаптиране и обособяване на помещения, част от административна сграда на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. Търново (2019г.); Професионална електрическа фурна (2019г.); професионални сушилни и пералня, професионална електрическа фурна (2020).

Източник на информация: *Община Велико Търново*

ЗС-3.3.4Д. Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел Михаил“, кв. Чолаковци

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ПМС 96/25.04.2019 г.

Размер на инвестицията: 17 145 лв.

Период на изпълнение: 2015-2019 г.

Кратко описание: Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел Михаил“, кв. Чолаковци, гр. Велико Търново

Източник на информация: *Община Велико Търново*

1.4. Група проекти ЗС-4: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания

Проект Зона ЗС-4.1: Изграждане на нова сграда за развитие на специализирана социална услуга за възрастни хора и хора с увреждания с капацитет 130 човека

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Промяна в държавната политика в областта на социалните услуги.

На 04.01.2018 г. Националният съвет за социално включване приема План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа.

С Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет е приет План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. След приемане на Плана за действие, Агенция за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на общините в Република България изготвят Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността, които са утвърдени от Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания през месец февруари 2018 година. Конкретният обект не попада в списъка с новите социални услуги и затова не е изпълнен.

Проект Зона ЗС-4.2: Изграждане на кризисен център за бездомни и социално слаби лица¹⁷

Проектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Социална инфраструктура“; Група дейности „Социална инфраструктура“

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: „Изграждане на Кризисен център за лица“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Размер на инвестицията: 2 169 124 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДФП: 17.1.2017г.

Дата на приключване на АДФП: 04.12.2019г.

Кратко описание: Изграден „Кризисен център за лица“ с общ капацитет 30 лица (места), разположен в две сгради тип пасивна къща, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства. „Кризисен център“ е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-4.3: Изграждане на общински комплекс за хранене, включително обществена трапезария за бездомни и социално слаби лица

През периода не е реализиран инвестиционен проект за изграждането на общински комплекс за хранене, включително обществена трапезария за бездомни и социално слаби лица поради липса на подходяща сграда/терен. Но община Велико Търново реализира проекти, които гарантират предоставянето на социалната услуга - обществена трапезария.

¹⁷ Бележка: Запазено е наименованието на дейността, съгл. ИПТВР.

ЗС-4.3.1. Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“, Процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020“, Номер от ИСУН BG05FMOP001-3.002-0023-C01 от 19.07.2016

Размер на инвестицията: 10 624,16 лв.

Период на изпълнение: 5 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 19.07.2016

Дата на стартиране: 16.05.2016

Дата на приключване: 30.09.2016

Кратко описание: Осигурена е възможност за надграждането и осигуряването на непрекъснатост при предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила“.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-4.3.2. Предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ (2015г. – 2020г.)

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Размер на инвестицията (2015-2020г.): 246 328,50 лв.

Предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ (2015 г.)

Размер на инвестицията: 9 568 лв.

Кратко описание: Предоставяне на социалната услугата чрез Домашен социален патронаж - Велико Търново - капацитет 65 лица

Предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ (2016 г.)

Размер на инвестицията: 22 965,50 лв.

Кратко описание: Предоставяне на социалната услугата чрез Домашен социален патронаж - Велико Търново - капацитет 65 лица

Предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ (2017-2018г.)

Размер на инвестицията: 60 240,00 лв.

Кратко описание: Предоставяне на социалната услугата чрез Домашен социален патронаж - Велико Търново - капацитет 75 лица

Предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ (2018 г.)

Размер на инвестицията: 45 022,50 лв.

Кратко описание: Предоставяне на социалната услугата чрез Домашен социален патронаж - Велико Търново - капацитет 75 лица

Предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ (2019 г.)

Размер на инвестицията: 54 157,50 лв.

Кратко описание: Предоставяне на социалната услуга чрез Домашен социален патронаж - Велико Търново - капацитет 75 лица

Предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ (2020 г.)

Размер на инвестицията: 54 375,00 лв.

Кратко описание: Предоставяне на социалната услуга чрез Домашен социален патронаж - Велико Търново - капацитет 75 лица

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-4.3.3. Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Велико Търново“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Размер на инвестицията: 30 102 лв.

Период на изпълнение: общо 5 месеца

Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Велико Търново“

Размер на инвестицията: 9 568 лв.

Кратко описание: В изпълнение на сключен Договор № ФС01-0471/24.04.2020 г., сключен между Община Велико Търново и Агенция за социално подпомагане за подпомагане на 200 лица от целевата група.

Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Велико Търново“ - Етап 2

Размер на инвестицията: 22 965,50 лв.

Кратко описание: В изпълнение на сключен Договор № ФС01-1249/24.09.2020 г., сключен между Община Велико Търново и Агенция за социално подпомагане за подпомагане на 60 лица от целевата група

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-4.4: Стимулиране образователната интеграция на рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I и XII клас“.

Размер на инвестицията: 19 100 лв.

Период на изпълнение: 3 месеца

Дата на сключване: 15.08.2020 г.

Дата на приключване: 15.11 2020 г.

Кратко описание: Предоставени са 34 безплатни дигитални устройства на 40 деца, настанени в 5 социални услуги от резидентен тип в гр. Велико Търново, ЦНСТ за деца без увреждания I и II ул. „Цветарска“ № 14, ЦНСТ за деца без увреждания ул. „Ил. Драгостинов“ № 3а, вх. Б, ЦНСТ за деца без увреждания ул. „Колоня товар“ № 14, ЦНСТ за младежи с увреждания ул. „Иларион Драгостинов“ № 3а, вх. А

Източник на информация: *Община Велико Търново*

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към МОН

Размер на инвестицията: 99 000 лв.

Период на изпълнение: 2014-2016 г.

Кратко описание: Реализирани са следните проекти с Бенефициент Община Велико Търново:

Проект „Мостове към света“ за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства;

По проект „Цветна фантазия“ за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;

Проект „Близо един до друг“ за осигуряване на по-високо ниво на образованост на учениците от ромски и турски етноси;

Проект „Богатство на различията“ за развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици

Проект „Пътят към по-добро бъдеще минава през училището“ за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства;

Проект „Партньорство-Успех-Устойчивост“ за създаване на благоприятна среда в училище за привличане и задържане на децата от етническите малцинства.

Източник на информация: *Община Велико Търново*

Проект Зона ЗС-4.5: Развитие на услугата „личен асистент“, „социален помощник“ и домашен социален патронаж“ - наемане на повече лица

Изпълнението е осигурено чрез 6 самостоятелни проекта и дейности, финансирани от бюджета на Община Велико Търново.

ЗС-4.5.1. Проект „Подкрепа за независим живот“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ПО 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M90OP001-2.002 „Независим живот”, Проект BG05M90OP001-2.002 -0152-C001 „Подкрепа за независим живот“

Размер на инвестицията: 499 599,45 лв.

Период на изпълнение: 22 месеца

Дата на сключване на АДФП: 11.12.2015г.

Дата на стартиране: 01.02.2016г.

Дата на приключване: 01.12.2017г.

Кратко описание: Предоставяне на по-широк обхват и спектър на интегрирани социално-здравни услуги и други, според специфичната потребност на човека с увреждане. По проекта е изграден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, с капацитет 75 лица и осигуряване на трудова заетост на 58 лица.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-4.5.2. Проект „Нови възможности за грижа“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура 2014BG05M90OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“, Партньорско споразумение № BG05-0401-1 от 24.03.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Велико Търново.

Размер на инвестицията: 377 252,64 лв.

Период на изпълнение: 13 месеца

Дата на подписване на партньорско споразумение: 24.03.2015 г.

Дата на приключване: 24.04.2016г.

Кратко описание: Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ включва осигуряване на достъп до интегрирани социални и здравни услуги на основание извършена индивидуална оценка на кандидат-потребителите от служителите на Дирекция „Социално подпомагане“ - Велико Търново. По проекта са обхванати 86 лица от целевата група

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-4.5.3. Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, в изпълнение на сключен Договор, между Община Велико Търново и Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 40 794,19 лв.

Период на изпълнение: 7 месеца

Дата на приключване: 31.12.2020 г.

Кратко описание: Назначени са 7 безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на 9 лица от целевата група - хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване.

Източник на информация: *Община Велико Търново*

ЗС-4.5.4. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – компонент 2

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“.

Размер на инвестицията: 399 498,08 лв.

Период на изпълнение: 17 месеца

Дата на сключване на АДФП: 09.05.2019

Дата на приключване на АДФП: 03.11.2020

Кратко описание: Подобряване на достъпа до мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда; оказване на психологическа подкрепа на потребителите и техните семейства; постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждания. В рамките на проекта се предоставят услуги в две основни направления: социални услуги и здравни грижи. В Центъра за патронажна грижа работят служители на следните длъжности: Специалист, социални дейности – 2 бр.; Психолог – 1 бр.; Медицинска сестра – 3 бр., от тях: 2 бр. на пълен 8-часов работен ден и 1 бр. на непълен 4-часов работен ден; Домашен санитар – 23 бр., от тях: 21 бр. на пълен 8-часов работен ден и 2 бр. на непълен 4-часов работен ден; Шофьор – 1 бр.

Източник на информация: *ИСУН, Община Велико Търново*

ЗС-4.5.5. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ - Компонент 3

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ за

изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3.

Размер на инвестицията: 47 064 лв.

Период на изпълнение: 10 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 21.04.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2020

Кратко описание: Със средства от бюджета на проекта, е доставено следното оборудване и обзавеждане за нуждите на проекта: 2 бр. компютърни конфигурации с монитор, мишка и клавиатура; 1 бр. лазерно мултифункционално печатащо устройство; 1 бр. лаптоп; назначени са служителите на следните длъжности: Социални асистенти – 36 бр. и Шофьор – 1 бр. на пълен работен ден; Оператор, център за обаждания – 2 бр., до 80 часа месечно. За периода от 01.04.2020г. до 30.06.2020 г., е доставена храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на 291 лица от 23 населени места на територията на общината.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-4.5.6. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ - Компонент 4

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Допълнително споразумение към Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0085-C01 по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Допълнителното споразумение е в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.103-0070-C01 по Процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд,

Размер на инвестицията: 172 499,04 лв.

Период на изпълнение: 6 месеца

Дата на приключване: 04.05.2021 г.

Кратко описание: с капацитет 157 лица от целевата група.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-4.5.7. Проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - В. Търново“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Размер на инвестицията: 21 393,38 лв.

Период на изпълнение: 2015г.

Кратко описание: В изпълнение на Договор за съвместна дейност № РД04-125 от 03.07.2015 г. между Община Велико Търново и Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика и Договори за сътрудничество № РД04 – 324/23.09.2015 г. и № РД04 – 325/23.09.2015 г. между Община Велико Търново, Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика и фирмите изпълнители за реализиране на Проект „Модернизирание на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Велико Търново” е подменено част от наличното кухненско оборудване в базата на Домашен социален патронаж - Велико Търново, в гр. Дебелец

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-4.5.8. Подобряване на материалната база на домашния патронаж

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 80 963 лв.

Период на изпълнение: 2014-2016г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. са изпълнени следните дейности: подобряване на материално-техническата база: хладилен шкаф (2014г.); закупуване на компютри и два броя автомобили (2016г.). Автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж (2020)

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-4.6: Обмяна на опит и добри практики за работа с възрастни хора /за персонала на Дом за стари хора/

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране за подобен тип проекти.

Проект Зона ЗС-4.7: Създаване на Дневни центрове за възрастни, хосписи и клубове по интереси

Община Велико Търново реализира инвестицията извън обхвата на социалната зона за въздействие, като проектите са представени в допълнителните проекти, включени при изготвяне на настоящия отчет и са изведени като функционални връзки.

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 15 146 лв.

Период на изпълнение: 2015-2018 г.

Кратко описание: за пенсионерски клуб в кв. „Чолаковци“ (2015г.); климатична система за клуб на Пенсионера и инвалида (2018г.).

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-4.8: Изграждане на 3 бр. „Защитени жилища“ за лица с умствена изостаналост по 10 души капацитет за деинституционализация на лица с умствена изостаналост от Домовете за възрастни с умствена изостаналост на територията на Община В. Търново в ж.к. „Чолаковци“)

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Промяна в държавната политика в областта на социалните услуги.

На 04.01.2018 г. Националният съвет за социално включване приема План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа.

С Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет е приет План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. След приемане на Плана за действие, Агенция за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на общините в Република България изготвят Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността, които са утвърдени от Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания през месец февруари 2018 година.

Не попада в обхвата на Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, разработени в изпълнение на План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа, приет с Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет

Проект Зона ЗС-4.9: Изграждане на 3 бр. „Центъра за настаняване от семеен тип“ за лица с умствена изостаналост по 15 души капацитет, във връзка със стартиране на процеса по закриване на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Пчелище, общ. Велико Търново в ж.к. „Зона В“ и доставка на 3 бр. специализирани транспортни средства 8+1 места /бус/ пригодени за хора с увреждания с рампа

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Промяна в държавната политика в областта на социалните услуги.

На 04.01.2018 г. Националният съвет за социално включване приема План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа.

С Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет е приет План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. След приемане на Плана за действие, Агенция за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на общините в Република България изготвят Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността, които са утвърдени от Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания през месец февруари 2018 година.

Не попада в обхвата на Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, разработени в изпълнение на План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа, приет с Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет

Проект Зона ЗС-4.10: Продължаваща социална услуга за деца с увреждания след навършване на пълнолетие към Дневен център за деца с увреждания - проектиране и изграждане на 1 бр. Дневен център за лица с увреждания - корпус „Д“ от СОУ „Г. С. Раковски“ в УПИ IV, кв.336 гр. Велико Търново, с капацитет 40 души

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 55 992 лв.

Период на изпълнение: 2017-2018 г.

Кратко описание: „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ е социална услуга, предоставяща дневни грижи за деца и младежи с различни по вид и степен увреждания. Потребителите на услугата са деца на възраст от 7 до 18 години и младежи от 18 до 35 години с физически, ментални и множествени увреждания. В обекта са инвестирани средства за следните дейности: Ремонт на покривна конструкция и климатици (2017г.); климатици (2018г.).

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-4.11: Проектиране и изграждане на 1 /един/ бр. „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за лица с увреждания, с капацитет 40 души като форма на съпътстваща социална услуга за предложените социални услуги от резидентен тип в обхвата на ж.к. „Зона В“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Промяна в държавната политика в областта на социалните услуги.

На 04.01.2018 г. Националният съвет за социално включване приема План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа.

С Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет е приет План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа. След приемане на Плана за действие, Агенция за социално подпомагане (АСП) и Националното сдружение на общините в Република България изготвят Карта на резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността, които са утвърдени от Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания през месец февруари 2018 година.

Не попада в обхвата на Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, разработени в изпълнение на План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа, приет с Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет

Проект Зона ЗС-4.12Д: „Кризисен център за лица „Търновград“ (ул. „Драган Цончев“ № 8) - ЗОНА В

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ за изпълнението на проект „Кризисен център за лица „ТЪРНОВГРАД“ по АДФФП № BG05M9OP001-2.029-0003-C01

Размер на инвестицията: 254 113,15 лв.

Период на изпълнение: 10 месеца

Дата на сключване на АДФФП: 14.02.2020 г.

Дата на стартиране: 01.03.2020г.

Дата на приключване: 01.01 2021г.

Кратко описание: Разкриване и функциониране на социалните услуги в общността от резидентен тип, в новоизградени сгради. След провеждане на конкурсна процедура са назначени 20 души персонал, които са обучени за предоставяне на социалните услуги от резидентен тип.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-4.13Д: Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Оперативна програма „Регионално развитие“2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1 „Социална

инфраструктура", по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"

Размер на инвестицията: 2 008 058 лева

Период на изпълнение: 24 месеца

Дата на приключване: 28.02.2015 г.

Кратко описание: Изграждане на 3 бр. ЦНСТ в гр. Велико Търново с цел осигуряване подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. - гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ № 3А, вх. Б и ул. „Колоня товар“ кв.545.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-4.14Д: „Бъдеще за всяко дете“ (ул. „Иларион Драгостинов“ № 3А) - ж.к. „Бузлуджа“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“ Компонент 2, „Разкриване на социални услуги в общността“, в изпълнение на Договор за БФП № BG051PO001-5.2.12-0075-C0001 от 03.04.2015г. между Община Велико Търново и Агенция за социално подпомагане, Приоритетна ос Социално включване и насърчаване на социалната икономика.

Размер на инвестицията: 307 369,38 лв.

Период на изпълнение: 8 месеца

Начална дата: 24.09.2014г.

Дата на приключване: 01.11.2015г.

Кратко описание: Разкриване на 3 бр. ЦНСТ в гр. Велико Търново. Създаване на социална услуга в общността от резидентен тип в гр. Велико Търново като елемент от устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания. По проекта се предоставят социални услуги от три Центъра за настаняване от семеен тип, с общ капацитет 42 места - един за деца и младежи с увреждания, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ № 3А, вх. А и два за деца и младежи без увреждания, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ № 3А, вх. Б и ул. „Колоня товар“ кв.545, като за целта ще бъде осигурена заетост на общо 44 лица.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-4.15Д: „Инвестиция в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Проект за социално включване на Министерството на труда и социалната политика, финансиран със Заем № 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка)

Размер на инвестицията: 1 049 524,34 лв.

Период на изпълнение:

Дата на приключване: 30 септември 2015 г.

Кратко описание: Проектът е насочен към деца от 0 до 7 години /в риска от изоставане, с увреждания, не посещаващи детски заведение, отглеждани в крайна бедност и др./ и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи /етнически общности с висок социален и здравен риск. Община Велико Търново получава специализиран автомобил 11+1 места „Рено мастър“, пригоден за деца с увреждания.

Източник на информация: Община Велико Търново;

<https://www.mlsp.government.bg/proekt-za-sotsialno-vklyuchvane>

Проект Зона ЗС-4.16Д: „И аз имам семейство“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, бюджетна линия BG51PO001-5.2.11 „Приеми ме“. Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане, в изпълнени на Партньорско споразумение от 08.12.2011 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Велико Търново във връзка с изпълнение на Проект „И аз имам семейство“.

Размер на инвестицията: 377 252,64 лв.

Период на изпълнение:

Дата на приключване: 2015 г.

Кратко описание: Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-4.17Д: „Приеми ме 2015“

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос: № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“; Инвестиционен приоритет: Инвестиционен приоритет № 3 (ИПЗ): „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, Процедура BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“, с конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане и подписано Споразумение за партньорство за изпълнение на Проект „Приеми ме 2015“ - № BG05M9OP001-2.002-0132-C01/ 11.12.2015 г. между Агенцията за социално подпомагане и Община Велико Търново.

Размер на инвестицията: 1 450 782,02 лв.

Период на изпълнение:

Дата на стартиране: 01.12.2015

Дата на приключване: 31.12.2020

Кратко описание: Усъвършенстване модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и разширяване на обхвата ѝ, както в страната, така и по отношение на целевите групи, чрез временно предоставяне на грижи в домашна среда на деца и юноши, които поради различни причини не могат да бъдат отглеждани в биологичното си семейство.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

1.5. Група проекти ЗС-5: Насърчаване на заетостта сред всички групи от населението

Проект Зона ЗС-5.1: Насърчаване на младежката заетост и заетостта за хора над 50 години

Проектът е изпълнен чрез 22 самостоятелни проекта, от които 20 са на Община Велико Търново и 2 на неправителствени организации.

ЗС-5.1.1. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ 2014-2015 г.

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ 2014-2015 г.

Размер на инвестицията: 84 081 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

Кратко описание: След разработено и одобрено проектно предложение на Община Велико Търново по НП „ОСПОЗ“, през 2014 г. е сключен договор с Дирекция „Бюро по труда“, гр. Велико Търново. Целта на проекта е осигуряване на заетост и социална интеграция на 30 безработни лица, обект на месечно социално подпомагане.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.2. Проект „Шанс за работа - 2014 г.“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Държавен бюджет чрез Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 7 227,72 лв.

Период на изпълнение: 3 месеца

Кратко описание: Съгласно сключен Договор с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново и в партньорство с РС на КНСБ – гр. Велико

Търново, Община Велико Търново реализира проекта, по който е осигурена заетост на 6 лица на длъжност „Санитар“ в ДСХ „В. Ботева“ - гр. В. Търново

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.3. Проект „Шанс за работа - 2015 г.“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Държавен бюджет чрез Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 16 054,32 лв.

Период на изпълнение: 3 месеца

Кратко описание: Съгласно сключен Договор с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново и в партньорство с РС на КНСБ – гр. Велико Търново, Община Велико Търново реализира проекта, по който е осигурена заетост на 12 безработни младежи до 29 г. на длъжност „Помощник-възпитател“ и „Социален асистент“ в детски градини и социални услуги за деца.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.4. Проект „Шанс за работа – 2016 г.“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Държавен бюджет чрез Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 5 953 лв.

Период на изпълнение: 3 месеца

Кратко описание: Съгласно сключен Договор с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново и в партньорство с РС на КНСБ – гр. Велико Търново, Община Велико Търново реализира проекта, по който е осигурена заетост на 4 безработни лица на длъжност „Помощник-възпитател“ и „Санитар“ в детски градини и ДСХ „В. Ботева“ - гр. В. Търново.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.5. Проект „Шанс за работа - 2017 г.“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Държавен бюджет чрез Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 3 275 лв.

Период на изпълнение: 3 месеца

Кратко описание: Съгласно сключен Договор с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново и в партньорство с РС на КНСБ – гр. Велико Търново, Община Велико Търново реализира проекта, по който е осигурена заетост на 2 безработни лица на длъжност „Помощник-възпитател“ в ЦНСТ за деца без увреждания.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.6. Проект „Ние също можем - 2018 г.“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Държавен бюджет чрез Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 2 007 лв.

Период на изпълнение: 3 месеца

Кратко описание: Съгласно сключен Договор с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново и в партньорство с РС на КНСБ – гр. Велико Търново, Община Велико Търново реализира проекта, който е продължение на Проект „Шанс за работа“. Назначено е 1 безработно лице на длъжност „Социален асистент“ в ЦНСТ II за деца без увреждания – гр. Велико Търново.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.7. Програма за обучение и заетост „Клио“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Националната програма за насърчаване на заетостта - „Клио“

Размер на инвестицията: 13 964,72 лв.

Период на изпълнение: 6 месеца

Кратко описание: Приоритетна целева група по проекта са безработни лица над 50 г., продължително безработни лица и хора с увреждания, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.8. Национална програма „Клио“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Националната програма за насърчаване на заетостта - „Клио“.

Размер на инвестицията: 7 455,76 лв.

Период на изпълнение: 6 месеца

Кратко описание: По проекта е осигурена заетост на 2 безработни лица за период от 6 месеца в дейност „Строително-ремонтни дейности“ в НИАР „Никополис ад Иструм“.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.9. Регионална програма за заетост - 2014 г.

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Регионална програма за заетост

Размер на инвестицията: 13 260 лв.

Период на изпълнение: 6 месеца

Кратко описание: Обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Социален асистент“ на 15 безработни лица, организирани по групи по обекти – ЦНСТ за деца без увреждания.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.10. Регионална програма за заетост - 2015 г.

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Регионална програма за заетост

Размер на инвестицията: 12 910 лв.

Период на изпълнение: 6 месеца

Кратко описание: След приключване на обучението, безработните лица положили изпит и едно от лицата, успешно завършили курса, е насочено за заемане на обявеното свободно работно място по проекта.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.11. Регионална програма за заетост и обучение - 2016 г.

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Регионална програма за заетост

Размер на инвестицията: 17 514 лв.

Период на изпълнение: 5 месеца

Кратко описание: Съгласно сключения договор с Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново, е назначено 1 безработно лице на длъжност „Социален асистент“ в ЦНСТ II за деца без увреждания – гр. Велико Търново.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.12. Регионална програма за заетост - 2017 г.

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Регионална програма за заетост

Размер на инвестицията: 9 825 лв.

Период на изпълнение: 6 месеца

Кратко описание: Назначени са 3 безработни лица на длъжност „Общ работник“, ангажирани в изпълнението на общополезни дейности – хигиенизиране и облагородяване на обществени места, зимна поддръжка и др.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.13. Регионална програма за заетост - 2018 г.

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Регионална програма за заетост

Размер на инвестицията: 18 240 лв.

Период на изпълнение: 6 месеца

Кратко описание: Назначени 5 безработни лица на длъжност „Общ работник“.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.14. Регионална програма за заетост - 2019 г.

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Регионална програма за заетост

Размер на инвестицията: 20 030 лв.

Период на изпълнение: 6 месеца

Кратко описание: Назначени 5 безработни лица в 5 населени места на общината на длъжност „Общ работник“.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.15. Регионална програма за заетост - 2020 г.

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Регионална програма за заетост

Размер на инвестицията: 14 544,80 лв.

Период на изпълнение: 4 месеца

Кратко описание: Назначени 5 безработни лица в 5 населени места на общината на длъжност „Общ работник“.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.16. Национална програма „Активирание на неактивни лица“

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Национална програма „Активирание на неактивни лица“

Размер на инвестицията: 41 726 лв.

Период на изпълнение: 80 месеца

Кратко описание: В изпълнение на ангажиментите по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, на 07.05.2015 г. е сключен Договор между Община Велико Търново и Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – гр Велико Търново, за реализация на Национална програма „Активиране на неактивни лица“. От 11.05.2015 г. в Община Велико Търново, в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ е назначен 1 лице на длъжност "Младши специалист, младежки медиатор“.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.17. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - Компонент №3

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Агенция по заетостта, Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица - Компонент №3

Размер на инвестицията: 5 117 лв.

Период на изпълнение: 1 месец

Кратко описание: По Програма за обучения и заетост на продължително безработни лица – Компонент 3 през 2016 г. е създадена заетост на 15 продължително безработни лица - сформирани са аварийни групи от безработните лица за предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия – дейности по снегопочистване и опесъчаване, разчистване на паднали клони, шум, наноси и др.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.18. Проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, конкретен бенефициент Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 136 879,26 лв.

Период на изпълнение: 12 месеца

Кратко описание: Осигурена заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда – безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ над 12 месеца, безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства. За период от 12 месеца на длъжност „Общ работник“ са назначени 50 лица.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.19. Проект BGO5M90PO01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, конкретен бенефициент Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 276 204,60 лв.

Период на изпълнение: 6 месеца

Кратко описание: Основната цел на проекта е интеграция на безработни младежи до 29 г., регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидии за продължителна заетост. Съгласно утвърдената процедура и сключен договор с Агенция по заетостта, Община Велико Търново осигури заетост на 83 безработни младежи до 29-годишна възраст вкл. на следните различни длъжности в общинска администрация, социални услуги, кметства, детски градини.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.20. Проект BGO5M9PO01-1.005-0001, „Обучения и заетост за младите хора“ - етап 2

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, конкретен бенефициент Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 85 438,08 лв.

Период на изпълнение: 10 месеца

Кратко описание: Съгласно сключени два договора с Агенция по заетостта от 19.04.2017 г. и 08.09.2017 г., Община Велико Търново осигури заетост на 23 безработни младежи на възраст до 29 г. Лицата са назначени на длъжност „Помощник-възпитател“ в ЦНСТ за деца/младежи без увреждания, „Технически сътрудник“ в общинска администрация, „Портиер“ в детски учебни заведения, „Работник, озеленяване“ в кметства.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.1.21. Проект „Повярвай в себе си“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПРЧР, Приоритетна ос 1

Размер на инвестицията: 133 879,69 лв.

Кратко описание: Изпълнен 1 проект на НПО, ОПРЧР, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Процедура BG05M9OP001-1.002
Активни

Източник на информация: ИСУН

ЗС-5.1.22. Проект „Осигуряване на заетост за достоен и независим живот“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПРЧР, Приоритетна ос 2

Размер на инвестицията: 294 770,83 лв.

Кратко описание: Изпълнен 1 проект с бенефициент НПО, ОПРЧР, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Процедура BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество

Източник на информация: ИСУН

Проект Зона ЗС-5.2: Заетост и работна среда за хора с увреждания

ЗС-5.2.1. Проект BG05M9OP001-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“- Компонент II

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, конкретен бенефициент Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 65 886,48 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца

Кратко описание: Съгласно сключен договор с Агенция по заетостта № ОЗМ-ХУ-04-01-44-17 от 18.12.2018 г., Община Велико Търново осигури заетост на 5 безработни младежи с трайни увреждания за срок от 2 години. Лицата са назначени на длъжности „Работник, кухня“ и „Социален асистент“ в социални услуги.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.2.2. Проект BG05M9OP001-1.010-0001 „Обучения и заетост“ - Компонент II

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, конкретен бенефициент Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 688 147,68 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца

Кратко описание: В изпълнение на сключен Договор № ОЗ-ХУ-04-01-280-31 от 14.01.2019 г. с Агенция по заетостта, Община Велико Търново назначи 50 безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г., със срок на заетост 2 г. Лицата работят в социални услуги, детски ясли, детски градини, училища, кметства на територията на общината.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-5.2.3. Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, Агенция по заетостта

Размер на инвестицията: 8 012 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца

Кратко описание: Съгласно сключен договор с Агенция по заетостта, по програмата е осигурена заетост за срок от 2 години на 1 лице с трайни увреждания на длъжност „Социален асистент“ в Дом за стари хора „Венета Ботева“ – гр. Велико Търново.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-5.3: Повишаване квалификацията на учителите в детските градини и училищата - обучения за интерактивни методи на преподаване

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Национални програми на МОН

Размер на инвестицията: 121 332 лв.

Кратко описание: Проекти на училища от град Велико Търново по национални програми: „Заедно за всяко дете“; „Иновации в действие“; Национална програма „Без свободен час“; „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и др. Информацията е само за 2019 г., поради липса на публично достъпни данни. Вкл. „Повишаване квалификацията на педагогическия персонал в СУ „Емилян Станев“ (ТГС); Програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ (Държавен бюджет); програма „Добре дошли в училище за съвместна дейност между родители, учители и ученици“ (ЦОИДУЕМ) и др.

Източник на информация: Община Велико Търново

1.6. Група проекти ЗС-6: Достъпна архитектурна среда

Проект Зона ЗС -6.1: Подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, вкл. улично озеленяване/ енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда

Проектът е включен в списъка с основни и резервните проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“, като се предвижда реализирането им на 2 фази.

ЗС-6.1.1. Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново (фаза 1)

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 953 600,82 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 06.10.2020г.

Кратко описание: Подобряване на градската среда в кв. „Чолаковци“. През 2019 всички СМР са приключени и обектите въведени в експлоатация. Принос на обекта към общите индикатори по проекта - тротоарна настилка 14 203,51 м²; паркинги 1 666,47 м²; 6 046,00 м² улични настилки; 17 600 м² зелени площи; 678,10 м² паркови настилки. Извършена е реконструкция на пешеходна пътека между кв. „Бузлуджа“ и кв. „Чолаковци“; обновяване на площадките за отдих, а осветлението е изпълнено с паркови осветителни тела, поставени през разстояние от около 15-20 м., с по-голяма концентрация в района на площадките; доставени и монтирани са елементи от градското обзавеждане, както и озеленителни работи. Алеята може да бъде ползвана и от лица със специални потребности, за които е предвидена водещата тактилна ивица по цялата дължина, а наличието на парапет по цялата дължина на пешеходния маршрут е улеснение за възрастни, деца и други хора със затруднения в придвижването.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗС-6.1.2. Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново (фаза 2)

Статус: Планиран (резервен проект в ИП по ОПРР)

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 1 000 000 лв.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-6.2: Изграждане на паркинги и подземни гаражи

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране

Бележка: При реализиране на проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново (фаза 1)“, в частта описана към предходния проект Зона ЗС-6.1 е отчетено изграждане на паркинги - 1 666,47 м².

1.7. Група проекти ЗС-7: Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт

Проект Зона ЗС-7.1: Транспортна схема с алтернативни маршрути

ЗС-7.1.1. Генерален план за организация на движението на град Велико Търново

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 42 000 лв.

Период на изпълнение: 2019-2021 г.

Кратко описание: С Генералния план за организация на движението на град Велико Търново (ГПОД) следва да се определят условията и реда за организирането на движението по цялата улична и пътна мрежа на град Велико Търново и да се разработят за целта съответните схемни проектни решения.

Чрез ГПОД се цели: Подобряване условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на гр. Велико Търново; Подобряване уличния график и намаляване на задръжките на автомобилите по кръстовищата на пътната и улична мрежа на гр. Велико Търново; Подобряване екологичните условия в града,

вследствие намаляването на шума и газовите емисии от автомобилите; Подобряване функционирането на МОПТ (масовия обществен пътнически транспорт) и подобряване на услугата за гражданите на гр. Велико Търново. Предвидено е да се анализира действащата в момента организация на движението, способите и средствата за нейното реализиране (включително мотивите за прилагането им), степента на обслужване на провежданото движение при конкретната пътна обстановка, както и ефективността от нейното приложение.

Като резултат от изготвения План се очакват решения за: проектна улична мрежа – класификация, конфигурация, връзки с републиканските и общинските пътища, изисквания към новите настилки; Организация на транзитното движение – трасета, пътеуказване. Изготвяне на списък на вътрешни, външни и туристически цели по улиците, далечни, близки и туристически цели по общинските пътища, съгласно изискванията на чл.138б от Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци. Разположение и съдържание на пътеуказателните табели, осигуряващи непрекъснатост и еднаквост на целите; Режими за движение на определени видове пътни превозни средства – забрани за движение на товарни автомобили, на каруци и на други видове пътни превозни средства по улиците на гр. Велико Търново; Трасета на редовните линии на обществения превоз на пътници, места на спирките и пешеходната им достъпност, бус-ленти; Режими за движение на пешеходци и велосипедисти. Пешеходни зони и велосипедни алеи; Посочност и предимство на движение на пътните превозни средства по отделните улици; Режими за престой и паркиране на моторни превозни средства. Зона за платено паркиране, буферни паркинги. Режими на изпреварване на пътните превозни средства по отделните улици; Режими на работа на светофарните уредби; предложения за подобряването им; Скоростни режимы на движение – местни ограничения на скоростта, изкуствени неравности, повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища, зони за движение с до 30 км/час в територии с преобладаващо жилищно застрояване; Предложение за организационни и инженерно-технически мероприятия.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗС-7.1.2. Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Велико Търново

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 70 680 лв.

Период на изпълнение: 2016 – 2017г.

Кратко описание: Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на град Велико Търново в съответствие с изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано

градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Прединвестиционното проучване изследва и отчита въздействието на всички мерки, предприети на територията на Община Велико Търново за управление на транспорта, включително такива, които се изпълняват със собствени средства или частни инвестиции. В ПИП са разгледани предложения за няколко компонента и техни варианти, които се анализират и обосновават като най-подходящи за решаването на основните проблеми и постигането на заложените цели на интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново. ПИП съдържа и препоръка за избор на най-добрия и възможен вариант за развитието на обществените транспортни услуги в град Велико Търново.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-7.2: Развитие на интегриран градски транспорт

Проектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“.

Статус: В изпълнение

Наименование на проекта, получил финансиране: „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Размер на инвестицията: 11 133 732,52 лева, от които 10 409 573,31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159,20 лева – възстановим ДДС.

Период на изпълнение:

Дата на сключване на АДБФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 19.07.2022 г.

Кратко описание: Обектите, включени в обхвата на проектното предложение се явяват компоненти от транспортната инфраструктура и системи на градския транспорт на гр. Велико Търново. Проектът предвижда изпълнение на СМР в т.ч. и на инженеринг за изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура, което включва следните обекти на интервенция: рехабилитация на бул. „България“; изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“; реконструкция на 2 пътни кръстовища: между улици „Хр. Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“, което да подобри пропускателната му способност и кръстовището между улиците „Беляковско шосе“, „България“, „Полтава“, „Освобождение“, „Краков“; изграждане на буферни паркинги: паркинг „Сержантско училище“ и паркинг „Френкхисар“; модернизация на светофарни уредби на кръстовищата: ул. „Никола Габровски“ – ул. „Славянска“; ул. „Никола Габровски“ – ул. „Георги Измирлиев“; ул. „Магистрална“ – ул. „Мармарлийска“. Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново чрез

доставка и монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/ и изграждане на контролен център, внедряване на паркинг система и информационни табла за паркиране. Доставка на подвижен състав - 3 бр. електробуси, които ще изпълняват разписание по утвърдената нова основна линия от общинската транспортна схема, която включва в маршрута си и спирки в близост до главните туристически забележителности на града. Предвижда се и монтирането на зарядна станция за зареждане на батериите на електробусите на предварително определеното за това място на територията на буферен паркинг „Сержантско училище“.

В ИЩГВР към проекта е записана Дейност ЗС-7.2.1: закупуване на 10 броя превозни средства, като поради ограничен финансов ресурс в обхвата на проекта се закупуват 3 броя електробуси.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Зона ЗС-7.3: Изграждане на велоалеи и велостоянки в кв. „Чолаковци“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за изпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране
- Липса на проектна готовност

2. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

2.1. Група проекти ЗП-1: Обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради

Проект Зона ЗП-1.1: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на административни и обществени сгради, достъпна среда и видеонаблюдение

В обхвата на проекта са 10 самостоятелни обекта, които са общинска/държавна собственост.

Дейност ЗП-1.1.1: Община Велико Търново – извършен ремонт и отчетен частичен напредък.

Дейност ЗП-1.1.2: Централен военен архив

Дейност ЗП-1.1.3: Административен съд

Дейност ЗП-1.1.4: Областна администрация

Дейност ЗП-1.1.5: ТД на НАП

Дейност ЗП-1.1.6: РЗОК

Дейност ЗП-1.1.7: Административна сграда КНСБ - ул. „Хр. Ботев“ 2

Дейност ЗП-1.1.8: Държавен архив, ул. „Читалищна“ 2
Дейност ЗП-1.1.9: Архивохранилищна сграда, пл. „Съединение“ 1
Дейност ЗП-1.1.10: Архивохранилище, пл. „Съединение“ 2

Статус: Не е отчетен напредък за 9 от обектите.

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране
- Инициативата за реализиране на проектите следва да бъде на собствениците на сградите.

Проект Зона ЗП-1.2: Основен ремонт, обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по главните улици на Стария град

В обхвата на проекта са 8 самостоятелни обекта, които са частна собственост.

Дейност ЗП-1.2.1.: Многофамилни жилищни сгради по ул. „Независимост“
Дейност ЗП-1.2.2.: Многофамилни жилищни сгради по ул. „Ст. Стамболов“
Дейност ЗП-1.2.3.: Многофамилни жилищни сгради по ул. „Опълченска“
Дейност ЗП-1.2.4.: Многофамилни жилищни сгради по ул. „Ив. Вазов“
Дейност ЗП-1.2.5.: Многофамилни жилищни сгради по ул. „Читалищна“
Дейност ЗП-1.2.6.: Многофамилни жилищни сгради на пл. „Цар Асен“
Дейност ЗП-1.2.7.: Многофамилни жилищни сгради по ул. „Н. Пиколо“
Дейност ЗП-1.2.8.: Многофамилни жилищни сгради по ул. „Гурко“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Инициативата за реализиране на проектите следва да бъде на собствениците на сградите.
- Проектна готовност (съгл. процедура НИНКН)
- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране

2.2. Група проекти ЗП-2: Модернизиране на образователна, културна и спортна инфраструктура

Проект Зона ЗП-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура, вкл. дворни пространства, достъпна среда и видеонаблюдение

В обхвата на проекта са включени 5 самостоятелни обекта на образователната инфраструктура.

Дейност ЗП-2.1.1: ВТУ, Стопански факултет

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Инициативата за реализиране на проекта следва да бъде на собственика на сградата
- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране

Дейност ЗП-2.1.2: ВТУ, Факултет по изобразително изкуство

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Инициативата за реализиране на проекта следва да бъде на собственика на сградата
- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране

Дейност ЗП-2.1.3: Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Ботев“

ЗП-2.1.3.1. Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново (фаза 2)

Статус: Планиран (резервен проект в ИП на ОПРР)

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 2 071 293 лв.

Източник на информация: *Община Велико Търново*

ЗП-2.1.3.2. Оборудване на ХГ „Св.св. Кирил и Методий“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 10 542 лв.

Период на изпълнение: 2017-2019г.

Кратко описание: В Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“: система за видеонаблюдение; лиценз софтуерен продукт (2017г.); оборудване на телевизионно студио и на специализиран кабинет по „Журналистика - телевизионно студио“ (2019г.).
Източник на информация: Община Велико Търново

ЗП-2.1.3.3. Оборудване на ОУ „Христо Ботев“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 10 968 лв.

Период на изпълнение: 2017-2019г.

Кратко описание: В ОУ „Христо Ботев“: компютърна конфигурация (2014г.); климатик (2017г.); Wi-Fi мрежа (2019г.)

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗП-2.1.3.4. Ремонт на част от сградния фонд, предоставена на МУ-Варна

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Медицински университет - Варна

Размер на инвестицията: 40 811,30 лв.

Период на изпълнение: 2020г.

Кратко описание: извършване на строително-ремонтни работи на учебни зали, кабинети и общи части в сградата на Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Велико Търново, предоставени за управление на МУ–Варна, реф. № 2020-019.

Източник на информация: Медицински университет - Варна

Дейност ЗП-2.1.4: Старопрестолна гимназия по икономика

Статус: В изпълнение

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от Проект № BG16RFOP001-3.002-0004-C04 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България

Размер на инвестицията: 712 689,97 лв.

Период на изпълнение:

Дата на стартиране: 21.12.2016

Дата на приключване: 21.12.2021

Кратко описание: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново. Инвестициите в образователните институции е с цел обновяване и модернизация на учебните кабинети, лабораториите, спортните съоръжения и учебните работилници и ще допринесат за осъществяване на по-качествено професионално образование.

Източник на информация: ИСУН, МОН

Дейност ЗП-2.1.5: ДГ „Пролет“

ЗП-2.5.1.1. Част от проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ (фаза 1)

Проектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Образователна инфраструктура“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от Проект № BG16RFOP001-1.009-0001-C01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C02. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 427 309,19 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 04.10.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 04.04.2020

Кратко описание: В обхвата на проекта са включени дейности, свързани с постигането на енергийна ефективност; с постигането на модерна образователна инфраструктура чрез конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, достъпна среда на сградите, водещи до устойчиво градско развитие и др.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗП-2.5.1.2. Оборудване на ДГ „Пролет“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 12 758 лв.

Период на изпълнение: 2017-2018г.

Кратко описание: В обекта са инвестирани средства за следните дейности: закупуване на интерактивна дъска и проектор (2017г.); кухненско обзавеждане (2018г.); стълбищен гъсеничен подежник (2020).

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-2.2: Обновяване на спортна инфраструктура

В обхвата на проекта са включени 2 самостоятелни обекта на спортната инфраструктура.

Дейност ЗП-2.2.1: Спортен комплекс „Юнак“

Дейност ЗП-2.2.2: Тенис кортове

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- За Дейност ЗП-2.2.1: Спортен комплекс „Юнак“: Обективна липса и наличие на условия за реализация на проектите: липса на подходящ урегулиран терен. Обектът попада в част от територията на Старо военно училище, който подлежи на устройствено процедиране.
- За Дейност ЗП-2.2.2: Тенис кортове: Инициативата за реализиране на проекта следва да бъде на собственик на терен, подходящ за реализиране на проекта.

Проект Зона ЗП-2.3: Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура, вкл. околно пространство, достъпна среда и видеонаблюдение

В обхвата на проекта са включени 6 самостоятелни обекти (т.нар. дейности):

Дейност ЗП-2.3.1: Къща-музей „Леон Филипов“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - недостиг на общински средства за финансиране
- Липса на проектна готовност

Дейност ЗП-2.3.2: Музей „Нова история“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за изпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - недостиг на общински средства за финансиране
- Липса на проектна готовност
-

Дейност ЗП-2.3.3: Музей „Възраждане и учредително събрание“, Археологически музей, Народна библиотека „П.Р.Славейков“

ЗП-2.3.3.1. „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“ (фаза 1 на ИП)

Проектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Социална инфраструктура“, група проекти „Културна инфраструктура“.

Статус: Планиран (одобрен за финансиране, в процес на договаряне)

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 2 850 761 лв.

Кратко описание: Проектът основно цели реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което ще се намалят разходите и ще улесни експлоатирането на сградата. Посредством инвестицията, в уникалния архитектурен паметник ще се осигури сигурна и съвременна среда за излагане и популяризиране на културното - историческото наследство, намиращ се в музея, както и привличане на по-голям брой туристи с интерес към Възраждането. Предвижда се обновяване на системите за техническа охрана, видеонаблюдение и пожароизвестяване, които да отговарят на съвременните нормативни изисквания.

Инвестицията е насочена към възстановяване и опазване на културните и историческите ценности, с насочено внимание към отношението между историческата култура, местни традиции и модерни интервенции.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗП-2.3.3.2. Археологически музей и Народна библиотека „П.Р.Славейков“ (фаза 2 ИП)

Статус: Планиран (резервен в ИП на ОПРР)

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 2 139 893,93 лв.

Източник на информация: Община Велико Търново

Дейност ЗП-2.3.4: Читалище „Надежда 1869“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - недостиг на общински средства за финансиране
- Липса на проектна готовност

Дейност ЗП-2.3.5: Читалище „Ц.Р.Славейков“, кв. „Варуша“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - недостиг на общински средства за финансиране
- Липса на проектна готовност

Дейност ЗП-2.3.6: Художествена галерия „Иван Христов“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - недостиг на общински средства за финансиране
- Липса на проектна готовност

ЗП - 2.3.7Д: Изграждане на система за видеонаблюдение на културна инфраструктура

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 12 756 лв.

Период на изпълнение: 2018г.

Кратко описание: Доизграждане на система за видеонаблюдение на обществени места и обекти общинска собственост. Система за видеонаблюдение на АМР Трапезица; Система за видеонаблюдение на църква „Св. равноапостола Петър и Павел“; Система за видеонаблюдение на Патриаршията на АМР Царевец.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗП-2.3.8.Д „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1. Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“ - гр. Плевен.

Размер на инвестицията: 1 466 787,56 лв. (за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956,57 евро за всички дейности)

Стойност на проекта по бюджет: 1 487 271,41 евро за всички партньори

Стойност на проекта по бюджети на партньори: за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 – 574 944,65 евро за всички дейности; за Фондация „Лице за изкуство и култура“, гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162 370,19 евро за всички дейности.

Период на изпълнение:

Дата на сключване на ДБФП: 13.09.2018 г.

Срок за изпълнение: 13.09.2021 г.

Кратко описание: Общата цел на проекта е да валоризира и подобри устойчивото икономическо използване на културните ценности и общото културно наследство в трансграничния регион чрез разработване на съвместен интегриран туристически продукт, основан на популяризирането на нов общ тематичен маршрут „Изкуство и култура“. Проектът включва: Разработване на съвместен интегриран тематичен маршрут

„Изкуство и култура“, иновативни съвместни туристически услуги и маркетингова стратегия на интегрирания туристически продукт „Изкуство и култура“; Организиране на рекламна кампания; Разработване на интерактивен уъркшоп „Работа и игра: Арт-терапия“, интерактивен семинар „Археолог за един ден“; Организиране и провеждане на културно събитие на открито „Градско изкуство“ в Калафат и на културно събитие на открито „Градско изкуство“ във Велико Търново.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗП-2.3.9.Д Оборудване на културна инфраструктура

ЗП-2.3.9.1.Д ХГ „Борис Денев“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 10 059 лв.

Период на изпълнение: 2015-2018г.

Кратко описание: Изпълнени са следните дейности: Компютри и хардуер за нуждите на Художествена галерия (2015г.); Климатични системи (2015г.); Климатични системи (2016г.); Лаптоп за нуждите (2018г)

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗП-2.3.9.2.Д Изложбени зали „Рафаел Михайлов“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 31 961 лв.

Период на изпълнение: 2015-2018г.

Кратко описание: Изпълнени са следните дейности: Подмяна на външната дограма с PVC стъклопакети (2015.г, 2016г.); Ремонт Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ - евакуационно осветление (2018г); Климатик (2018г); Озвучителна апаратура (2018г)

Източник на информация: Община Велико Търново

2.3. Група проекти ЗП-3: Опазване и промотиране на културното наследство и туризма

Проект Зона ЗП-3.1: Експониране и адаптация на културно наследство

Дейност ЗП-3.1.1: Архитектурно - музеен резерват „Царевец“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 238 475 лв.

Период на изпълнение: 2014-2020 г.

Кратко описание: Изпълнени са следните дейности: Аварийно - възстановителни работи комплекс Балдуинова кула и туристическа алея (2014г.); Възстановяване на пешеходни алеи и прощадки за наблюдение на хълм Царевец (2014г.); Аварийно - възстановителни работи комплекс Балдуинова кула и туристическа алея (2015г.); Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм „Трапезица“ (2015г.); Експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13, Хълм „Трапезица“ (2015г.); Модерен център за интерпретация на културното наследство, Хълм „Трапезица“ (2015г.); Изграждане на покритие над машинна част на фуникуляр на АМР „Трапезица“, РИМ ВТ (2016г.); „Аудио-визуална програма Царевград търнов - Звук и светлина“ -РИМ В. Търново (2016г.); Изграждане на покритие над машинна част на фуникуляр на АМР "Трапезица", РИМ ВТ (2016г.); Климатични системи Командна зала „Звук и светлина“, РИМ В. Търново (2017г.); Високоговорители за Аудио-визуална програма „Звук и светлина“ (2017г.); "Аудио-визуална програма Царевград търнов -Звук и светлина" - Първи етап, РИМ (2017г.); Реактор съоръжение „Звук и светлина“, РИМ В. Търново (2017г.); Светодиодна осветителна инсталация на АМР „Царевец“, РИМ В. Търново (2018г.); Основен ремонт осветителна техника АВП Звук и светлина (обследване техническо състояние, изготвяне на енергийно ефективно осветление) РИМ ВТ (2020г.)

Източник на информация: Община Велико Търново

Дейност ЗП-3.1.2: Църквата „Св. Св. Константин и Елена“ и камбанарията

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране

Дейност ЗП-3.1.3: Църквата „Св. Спас“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране

Дейност ЗП-3.1.4: Шишманова баня

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014

Наименование на проекта: „Културното наследство на Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“

Размер на инвестицията: 724 935,82 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца

Дата на сключване на ДБФП: 23.04.2015

Дата на приключване на ДБФП: 30.04.2017 г.

Кратко описание: Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на „Шишманова баня“, гр. Велико Търново. Обектът е публична общинска собственост (Акт № 5726) и със статут на „единична недвижима културна ценност“ с категория „национално значение“. Аварийните мерки започват с укрепване на основните ѝ зидове от запад. Консервационната намеса се изразява в моделирано надзиждане на останалите зидове, възстановяване на пилоните от хипокаустната система до действителна височина. Въз основа на запазените останки и наблюденията по време на археологическите проучвания ще бъде осъществено: възстановяване на полуцилиндричното покритие на северното помещение и на същинския под; моделирано надзиждане при входа на южния зид и на източния зид; изграждане на „преграда“, която да изолира обекта от улицата; изграждане на стабилна покривна конструкция, гарантираща защита на оригинала; мерки за благоустрояване на терена около паметника и мерки, които да подчертаят уникалността му.

Източник на информация: Община Велико Търново

Дейност ЗП-3.1.5: Паметник на Обесените поборници в кв. „Варуша“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране

ЗП - 3.1.6.Д. Оборудване на РИМ

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 64 596 лв.

Период на изпълнение: 2015-2020г.

Кратко описание: Изпълнени са следните дейности: доставка на компютър (2015г.); Климатик (2017г.); Системи за видеонаблюдение - РИМ В. Търново - Държавна дейност

(2018г.); Хардуерно осигуряване на електронен достъп до музейни обекти - по бюджета на Общината (2019г.); Електронна система за продажба на билети в РИМ В. Търново - по бюджета на РИМ дофинансиране (2020г.)

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-3.2: Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, туристически център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище

Проектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура, Група проекти „Културна инфраструктура. Състои се от 5 следните 5 обекта:

Дейност ЗП-3.2.1: Изграждане на военен музей

Дейност ЗП-3.2.2: Изграждане на нова библиотека

Дейност ЗП-3.2.3: Изграждане на младежки арт център

Дейност ЗП-3.2.4: Изграждане на туристически център

Дейност ЗП-3.2.5: Изграждане на музей на фотографията и експозиционен център

Проект ЗП-3.2.1: „Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, културно - информационен център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище (Фаза 1)

Статус: Планиран (основен проект в ИП на ОПРР)

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 14 248 105,50 лв.

БФП от ОПРР 2014-2020: 7 048 105 лв.; **Финансов инструмент (инвестиционен кредит):** 7 200 000 лв.

Кратко описание: Изграждане на Експозиционен център, представляващ мултифункционална сграда и намиращ се на територията на Старото военно училище в града. Към момента на територията на Община Велико Търново не съществува подобен център. Изграждането му е продиктувано от факта, че културният календар на Общината включва около 700 различни културни събития годишно, за които е необходимо да бъдат изградени различни културни пространства. Експозиционният център се очаква да е мултифункционално пространство, което се предвижда да се ползва за събития от всички жанрове – сценични изкуства с оборудвана сцена, сценична техника, депо за декори и костюми, гримьорни; визуални изкуства – пространства, подходящо оборудвани за изложби, виртуални представяния, прожекции; пространство за наука и литература – за

научни форуми; културни, търговски и други изложения и борси, оборудвани офиси; пространство за книжарница, галерия, приложни изкуства. Наред с това се очаква Експозиционният център да обслужва деловия и конгресния туризъм, в допълнение на всички други туристически възможности на града, предлагайки оборудвани зали, кабинки за преводачи, техника, възможности за кетъринг, места за хранене.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-3.2.2: „Изграждане и оборудване на военен музей, нова библиотека, младежки арт център, културно - информационен център, музей на фотографията и експозиционен център в Старото военно училище (Фаза 2)

Статус: Планиран (резервен проект в ИП на ОПРР)

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 8 493 150,80 лв.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-3.2.3: Подробен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП „Региони в растеж“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 4 000 лв.

Период на изпълнение: 2018г.

Кратко описание: Изготвен Подробен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище.

Проект Зона ЗП-3.2.4: Проектиране на сграда за Старо военно училище

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 600 000 лв.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-3.2.5: Изграждане на комуникации и техническа инфраструктура

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 600 000 лв.

Кратко описание: Изграждане на комуникации и техническа инфраструктура - ОК 8000 - ОК 8006, поземлен имот 10447.513.453 по КККР на гр. Велико Търново, с цел обслужване на нуждите на сградите намиращи се в ПИ 10447.513.298 и ПИ 10447.513.299 по КККР на гр. В. Търново - Старо военно училище

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-3.3: Развитие на конгресен и фестивален туризъм - организиране на иновативни културни събития

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 4 867 942 лв.

Период на изпълнение: 2014-2020г.

Кратко описание: Организиране на международни, национални, регионални фестивали от Културния календар на Община Велико Търново.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-3.4: Проектиране и разширяване на Мултимедийния център на ул. „Пиколо“, административната сграда на РИМ

Обектът е включен в списъка с основни проекти в одобрената Инвестиционна програма по ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“2014-2020 /ОПРР/.

Статус: Планиран (одобрен, подписване на договор)

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Наименование на проекта: „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Размер на инвестицията: 1 302 577,31 лв.

Период на изпълнение на проекта – 30 месеца от подписване на ДБФП

Кратко описание: В обхвата на проектното предложение са включени интегрирани мерки и дейности съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект. Проектът цели разширяване на съществуващ мултимедиен посетителски център, с което ще се повиши въздействието от предлаганата туристическа атракция. Предвижда се визуализиране живота на различните социални слоеве във Второто българско царство, техните нрави, обичаи, бит и одежди. С помощта на съвременната аудио – визуална техника по-пълно ще се възприеме богатата история на града от този период, неговата царственост, войнска слава и духовна мощ. Интериорът ще е разнообразен от богато декорирани фигури, с множество архитектурни детайли, атрибути и аксесоари, подходящо осветление и озвучаване на отделните елементи и композиции.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗП-3.4.2. Ремонти и оборудване на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 78 440 лв.

Период на изпълнение: 2015-2019г.

Кратко описание: Изпълнени са следните дейности: основен ремонт покрив (2015г.); система за видеонаблюдение (2019г.) и др.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-3.5Д: Проект ЗП - CultTour - културно /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV B, финансирана от Европейския съюз (ЕС), в рамките на Европейско териториално сътрудничество (ETC) и Оперативна програма за Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа (SEE), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Размер на инвестицията: 516 240,45 лв. (бюджет за община В. Търново)

Период на изпълнение: 2014-2015г.

Кратко описание: Проектът е насочен към изпълнение на стратегия за опазване и поддържане на културното наследство (архитектура, паркове, открити пространства (градини) прилежащи към културни наследства и т.н.), и тяхното социализиране и модернизиране, обвързано с професионално обучение в сферата на туризма, покриващо международни стандарти, чиято необходимост се разраства непрекъснато в района на Югоизточна Европа. Планираните дейности за пилотните обекти, включени в проекта за

местност „Боруна“ във Велико Търново (България), лятна резиденция Самуел фон Брюкентал (Румъния), национален парк на независимостта Александруполис (Гърция), градините на Перипато в Таранто (Италия), които ще се реализират през 2014 – 2019 година.

Партньори: Община Авриг, Румъния- водещ партньор, Община В.Търново, България; Окръжен съвет, Сибиу, Румъния; „Фондация „Самюел Брюкентал”, Сибиу, Румъния; Специализирано висше училище Кремс, Австрия; Институт по ландшафтна архитектура, Австрия; Технически университет, Берлин, Германия; Община Александрополис, Гърция; Регионален отдел за културно наследство - Регион Пулия , Италия.

Източник на информация: Община Велико Търново

2.4. Група проекти ЗП-4: Модернизирани публични пространства и зони за рекреация

Проект Зона ЗП-4.1: Реновиране на пешеходни пространства

В обхвата на проекта са включени 4 самостоятелни проекта (т.нар. дейности)

Дейност ЗП-4.1.1: пл. „Съединение“

Обектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОЦРР в инвестиционен приоритет: „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 216 521,50 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 17.07.2019

Кратко описание: През 2019 всички СМР са приключени и обектите въведени в експлоатация. Принос на обекта към общите индикатори по проекта - тротоарна настилка 549 м²; зелени площи 5181,75 м².

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Дейност ЗП-4.1.2: пл. „Велчова завера“

Обектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 68 580 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 17.07.2019

Кратко описание: През 2019 всички СМР са приключени и обекта е въведен в експлоатация.

Дейност ЗП-4.1.3: пл. „Поборнически“

Обектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 381 455 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДФФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДФФП: 17.07.2019

Кратко описание: През 2019 всички СМР са приключени и обекта е въведен в експлоатация.

Дейност ЗП-4.1.4: Възрожденския площад „Самоводски пазар“, чешмата, осветлението и зелената площ при паметника на „Ем. Станев“

Обектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДФФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 101 500 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДФФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДФФП: 17.07.2019

Кратко описание: През 2019 всички СМР са приключени и обекта е въведен в експлоатация.

Дейност ЗП - 4.1.5: Осигуряване на пешеходен достъп

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 37 621 лв.

Период на изпълнение: 2017-2019г.

Кратко описание: Изпълнени са следните дейности: Изграждане на тротоари и стълбища (2017г.); Ремонт стълбищна мрежа, гр. В. Търново (2019г.)

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-4.2: Реконструкция и рехабилитация на изгледни площадки по ул. „Стефан Стамболов“

Проектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 200 098,47 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 17.07.2019

Кратко описание: В обхвата на проекта са включени 4 дейности, които са изпълнени:

Дейност ЗП-4.2.1: Реконструкция на изгледна площадка (като част от пешеходната зона).

Дейност ЗП-4.2.2: Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление.

Дейност ЗП-4.2.3: Поставяне на указателни и информационни табели

Дейност ЗП-4.2.4: Елементи на градското обзавеждане

През 2019 всички СМР са приключени и обектите въведени в експлоатация.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-4.3: Обновяване и поддръжка на улично озеленяване и градско обзавеждане

Дейност ЗП-4.3.1: Ремонт и реставрация на сграфитопана - 4 бр. при изгледни площадки на ул. „Ст. Стамболов“, пл. „Велчова Завера“ и ул. „Опълченска“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 20 475 лв.

Период на изпълнение: 2019г.

Кратко описание: Ремонт и реставрация на сграфитопана - 4 бр. при изгледни площадки на ул. „Ст. Стамболов“, пл. „Велчова Завера“ и ул. „Опълченска“

Източник на информация: Община Велико Търново

Дейност ЗП-4.3.2Д. Улично озеленяване и градско обзавеждане

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 244 000 лв.

Период на изпълнение: 2014-2020

Кратко описание: Ежегодно зацветяване и градско обзавеждане. (изграждане на подземна система за сметосъбиране)

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-4.4: Реконструкция на стари автентични елементи на градското обзавеждане

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДФФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Проект Зона ЗП-4.5: Създаване на акценти в градската среда – галерии на открито с произведения на изкуството от хранилищата на културните институции и други.

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 163 686 лв.

Период на изпълнение: 2014-2020г.

Кратко описание: Изпълнени са следните дейности: Гримборни и санитарен възел за Летен театър в парк „Марно поле“ (2014г.); Санитарен възел за Летен театър в парк „Марно поле“ (2015г.); Монтиране на гримборна в Летен театър (2015г.); Покривна преместваема конструкция на сцена на Летен театър (2019г.); Изготвяне на проект за

покривна конструкция на Сцена на Летен театър (2019г.); Изработване на покривна конструкция на Сцена на Летен театър (2020г.)

Източник на информация: Община Велико Търново

2.5. Група проекти ЗП-5: Достъпна, безопасна и приобщаваща физическа среда

Проект Зона ЗП-5.1: Интегриран проект за воден цикъл на гр. Велико Търново - II част

ЗП-5.1.1.: Интегриран проект за воден цикъл на гр. Велико Търново - II част

Статус: Не е отчетен напредък

Проект Зона ЗП-5.1: Интегриран проект за воден цикъл на гр. Велико Търново - II част е включен през 2013 г. на база Решение №379/30.08.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г., с което е одобрено проектното предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.“ по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2007-2013г.

Одобреното финансиране е размер на 38 153 162,68 лв. от които 30 522 530,14 лв. от Кохезионния фонд на ЕС и 7 630 632,54 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет и от общинския бюджет. В решението е отбелязано, че при липса на финансиране по ОПОС 2007-2013 и възможност съгласно нормативната уредба, да бъде предоставена БФП от Кохезионния и/или структурните фондове на ЕС за програмен период 2014-2020.

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране;
- Проектът е одобрен за финансиране от УО на ОПОС за новия програмен период при условие на наличен финансов ресурс по ОПОС 2014-2020

ЗП-5.1.2.: Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Споразумения за предоставяне на средства №РД-02-30-84/20.12.17г. и №РД-02-30-12/18.04.2018г., изменено с Допълнително споразумение №1 РД-02-30-12(1) от 18.09.2018г. и Допълнително споразумение №2 РД-02-30-12(2) от 19.12.2018г., между МРРБ и Община Велико Търново

Размер на инвестицията: Балансова стойност на актива (ПОС, съгл. чл. 19), (без ДДС)
Първи етап: 801 849,54 лв.;

Втори етап: 1 177 019,16 лв.;

Трети етап: 755 439,27 лв.;

Четвърти етап: 1 728 009,24 лв.

Период на изпълнение: 2018-2019г.

Кратко описание: Изпълнени СМР на строеж: „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Независимост“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Колю Фичето“, ул. „10-ти февруари“, ул. „Пролет“, ул. „Митрополит Панарет Рашев“, ул. „Велчо Джамджията“, ул. „Александър Добринов“, ул. „Ефрем Попхристов“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Максим Райкович“, ул. „Тунел“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Читалищна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо Йв. Войводата“, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Шейново“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „8-ма дружина“, ул. „Цани Гинчев“, ул. „Силвестър Пенев“, ул. „Георги Сава Раковски“, ул. „Георги Мамарчев“, ул. „Поп Матей Преображенски“, пл. „Самоводски пазар“, ул. „Въстаническа“, ул. „Капитан Дядо Никола“, ул. „Драгоман“, ул. „Медникарска“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Поборническа“, ул. „П.Р. Славейков“, гр. Велико Търново“ Строежът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-ВТ-74/26.11.2019г., издадено от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Велико Търново.

Проект Зона ЗП-5.2: Градска среда в старата градска част - Реконструкция, рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане

ЗП-5.2.1. Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДФФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.)

Обектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДФФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 6 741 037,72 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 17.07.2019 г.

Кратко описание: За подобряване на градската среда в Централна градска част са извършени дейности по реконструкция на уличната мрежа и прилежащата инфраструктура, приключил през 2019 г. В обхвата на проекта са включени всички планирани 41 обекта (дейности), както следва: Дейност ЗП-5.2.1: ул. „Независимост“; Дейност ЗП-5.2.2: ул. „Стефан Стамболов“; Дейност ЗП-5.2.3: ул. „Генерал Гурко“; Дейност ЗП-5.2.4: ул. „Колю Фичето“; Дейност ЗП-5.2.5: ул. „10-ти февруари“; Дейност ЗП-5.2.6: ул. „Пролет“; Дейност ЗП-5.2.7: ул. „Митрополит Панарет Рашев“; Дейност ЗП-5.2.8: ул. „Велчо Джамджията“; Дейност ЗП-5.2.9: ул. „Александър Добринов“; Дейност ЗП-5.2.10: ул. „Ефрем Попхристов“; Дейност ЗП-5.2.11: ул. „Д-р Лонг“; Дейност ЗП-5.2.12: ул. „Крайбрежна“; Дейност ЗП-5.2.13: ул. „Максим Райкович“; Дейност ЗП-5.2.14: ул. „Тунел“; Дейност ЗП-5.2.15: ул. „Иван Вазов“; Дейност ЗП-5.2.16: ул. „Читалищна“; Дейност ЗП-5.2.17: ул. „Йордан Инджето“; Дейност ЗП-5.2.18: ул. „Христо Иванов Войводата“; Дейност ЗП-5.2.19: ул. „Михаил Кефалов“; Дейност ЗП-5.2.20: ул. „П. Богданов“; Дейност ЗП-5.2.21: ул. „Шейново“; Дейност ЗП-5.2.22: ул. „Киро Толешков“; Дейност ЗП-5.2.23: ул. „8 - ма дружина“; Дейност ЗП-5.2.24: ул. „Цани Гинчев“; Дейност ЗП-5.2.25: ул. „Силвестър Пенев“; Дейност ЗП-5.2.26: пл. „Съединение“; Дейност ЗП-5.2.27: ул. „Георги Сава Раковски“; Дейност ЗП-5.2.29: ул. „Поп Матей Преображенски“; Дейност ЗП-5.2.30: пл. „Самоводски пазар“; Дейност ЗП-5.2.31: ул. „Въстаническа“; Дейност ЗП-5.2.32: ул. „Капитан Дядо Никола“; Дейност ЗП-5.2.33: ул. „Драгоман“; Дейност ЗП-5.2.34: ул. „Медникарска“; Дейност ЗП-5.2.35: ул. „Кирил и Методий“; Дейност ЗП-5.2.36: ул. „Поборническа“; Дейност ЗП-5.2.37: ул. „П.Р. Славейков“; Дейност ЗП-5.2.38: Благоустройство на ул. „Гурко“, като един от туристическите маршрути, на парапети, осветление, каменна настилка; Дейност ЗП-5.2.39: ул. „Г. Мамарчев“, включително разрушените стъпала до пл. „Велчова завера“; Дейност ЗП-5.2.40: ул. „Крайбрежна“ като атрактивна комуникация; Дейност ЗП-5.2.41: главните улици на Стария град.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗП-5.2.2. Рехабилитация на улици в зоната

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.; ПМС

Размер на инвестицията: 1 501 231 лв.

Период на изпълнение: (2016-2020г.)

Кратко описание: Изпълнени са следните дейности: Демонтажни и строително - монтажни работи на улица „П.Типографов“ №29 и №31 гр. В. Търново (2016г., 2017г); Възстановяване на ул. „Климент Охридски“ (път Ш-514) при манастирски комплекс

„Великата Лавра” до църквата „Св. Четиридесет мъченици”, гр. Велико Търново, частично по ПМС 96 от 25.04.2019 г. (2019г.); Основен ремонт Улична осветителна мрежа (2019г.); 2019 - Изграждане на подземна тръбна мрежа 5206 Инфраструктурни обекти - по улици в стара градска част на гр. Велико Търново (2019г.); основен ремонт на улична осветителна мрежа и изграждане на нова, изграждане на подземна тръбна мрежа (2020).

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-5.3: Модернизация и изграждане на детски площадки

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 55 814 лв.

Период на изпълнение: 2014-2019 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. Община Велико Търново е инвестирала в изграждане на детски площадки в обхвата на зоната.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-5.4: Доставка на съоръжения за намаляване на скоростта и ограничаване на паркирането по пешеходни пространства и тротоари към главните улици /колчета, изолираща растителност, огради/

ЗП-5.4.1. Доставка на сигнализация и прегради

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 48 969 лв.

Период на изпълнение: 2014-2019 г.

Кратко описание: Изпълнени са следните дейности: Сигнализация за регулиране на уличното движение (2017г.); Автоматична потъваща преграда за контрол на достъп на МПС-та (2019г.)

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗП 5.4.2. Ремонт на тротоарна мрежа в централна градска част

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ПМС№113/30.04.2015 г.

Размер на инвестицията: 966 209 лв.

Период на изпълнение: 2015-2016 г.

Кратко описание: Изпълнени са следните дейности: Ремонт на тротоарна мрежа в гр. Велико Търново в централната градска част - ул. „Васил Левски“, ул. „България“, ул. „Никола Габровски“; в кв. „Бузлуджа“ – „Зона В“; ул. „Драган Цончев“ и др.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-5.5: Улесняване на достъпа на хора с увреждания в градската среда и към административни и обществени сгради

Дейност ЗП-5.5.1: Сигнални светофари и информационни средства за незрящи хора, асансьори към административни и обществени сгради

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране;

Дейност ЗП-5.5.2: Достъп до културни ценности и музеи

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.; Агенция за хора с увреждания и др.

Размер на инвестицията: 123 887 лв.

Период на изпълнение: 2016-2020г.

Кратко описание: През периода са изпълнени следните дейности: Изграждане на стълбище от алея до каса на АМР „Трапезица“, РИМ ВТ (2016г.); Подемници за инвалиди за Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ (2020г.); Изграждане на рампа БИЦ „Славейче“ - РБ „П.Р.Славейков“ (2020г.); Изграждане на подход за инвалиди към музей Учредително събрание - РИМ ВТ (2020г.)

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-5.6: Реконструкция на обществени паркинги

В обхвата на проекта са включени 3 самостоятелни обекта (т.нар. дейност).

Дейност ЗП-5.6.1: на ул. „Крайбрежна“ - в УЩИ IV КВ.329А, вкл. реконструкция на пешеходна връзка (стъпала)

Обектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 323 159,25 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 17.07.2019

Кратко описание: Реконструкция на обществен паркинг на ул. „Крайбрежна“. През 2019 всички СМР са приключени и обекта въведен в експлоатация. Постигнати резултати в резултат от осъществената реконструкция: изградени 48 бр. паркоместа за автомобили, както и 8 бр. паркоместа за автобуси и 2 бр. паркоместа за хора с увреждания. Доставени и монтирани автоматични бариери, изградена кабинка за охрана, както и обществена тоалетна, облагородено пешеходно пространство. Принос на обекта към общите индикатори по проекта - 87 м² тротоарни настилки; 2 556,00 м² паркинги; 44,38 м² улични настилки; 319,00 м² зелени площи;

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Дейност ЗП-5.6.2: към сграда ТД на НАП и подход към университета

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране
- Липса на проектна готовност

Дейност ЗП-5.6.3: Двор на Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифициран проблем за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране
- Липса на проектна готовност

Проект Зона ЗП-5.7: Обновяване на обществените тоалетни в публичните пространства и приспособяване за хора с увреждания

Проектът се състои от 2 самостоятелни обекта (т. нар. дейности).

Дейност ЗП-5.7.1: Обществената тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ № 29

Обектът е включен в списъка с основни проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Градска среда“, Група дейности „Градска среда“.

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Част от проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 9 932,50 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 17.07.2019

Кратко описание: Всички строително-монтажни работи са изпълнени и обектът е въведен в експлоатация през 2019 год.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Дейност ЗП-5.7.2: УПИ IV кв.329А

Статус: Приключен

Изградена е обществена тоалетна, която е включена в обхвата на Дейност ЗП-5.6.1: на ул. „Крайбрежна“ - в УПИ IV КВ.329А, вкл. реконструкция на пешеходна връзка (стъпала)

Зона ЗП-5.8Д: Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IFE/BG/000012

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Програма „LIFE“ 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Размер на инвестицията за Община Велико Търново: 1 802 014,923 лв.

Период на изпълнение: 6 години

Дата на сключване на ДБФП: 02.10.2018 г.

Дата на приключване на ДБФП: 02.10.2024 г.

Кратко описание: Главната цел на интегрирания проект е подобряване качеството на въздуха в общините София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. Основният инструмент за постигане на целта е разработване и прилагане на схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в шестте общини. Схемата включва преминаване от отопление на дърва и въглища към отопление на пелети, газ или използване на централна топлофикация.

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Източник на информация: Община Велико Търново; <http://www.lifeipcleanair.eu/>

2.6. Група проекти ЗП-6: Подобряване на мобилността и развитие на меки форми на транспорт

Проект Зона ЗП-6.1: Изграждане на велоалея и велостоянки по ул. „Крайбрежна“

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране;
- Липса на проектна готовност

Проект Зона ЗП-6.2: Съвременни системи за ориентация и информация

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Размер на инвестицията: 1 001 932 лв.

Дата на сключване на АДБФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 19.07.2022 г.

Кратко описание: Обектите „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ , „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ и Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Паркинг система и информационни табла за паркиране са част от проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на информация: Община Велико Търново

2.7. Група проекти ЗП-7: Повишаване капацитета на местната администрация

Проект Зона ЗП-7.1: Обучение на управленските екипи и работещите в местните административни структури

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Бюджет на общината

Размер на инвестицията: 163 572,16 лв.

Период на изпълнение: 2014-2020г.

Кратко описание: В ИПГВР са посочени 3 основни дейности за изпълнение:

Дейност ЗП-7.1.1: езикови обучения за хора, ангажирани с международна дейност;

Дейност ЗП-7.1.2: Работа с хора в неравностойно положение

Дейност ЗП-7.1.3: Информационно-комуникационни технологии

В посочената информация са включени всички обучения на администрацията за периода 2014-2020г.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-7.2: Закупуване на нова техника в административните структури

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 458 682 лв.

Период на изпълнение: 2014-2020г.

Кратко описание: Текущо модернизиране и обновяване на материално техническата база

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-7.3Д: „Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020“ с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016 г.

Размер на инвестицията: 233 208,72 лв.

Период на изпълнение: 84 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 09.09 2016 г.

Дата на приключване на АДБФП: 09.09.2023г.

Кратко описание: Проектът има за цел да повиши капацитета на Общината за изпълнение на ролята ѝ на бенефициент и на междинно звено за ефикасно и ефективно използване на възможностите за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за постигане на интегриран подход при градското възстановяване и развитие на Велико Търново. Основните дейности, предвидени за изпълнение са: възнаграждения на екипа за изпълнение на инвестиционната програма на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“; възнаграждения на екипа на Междинното звено; наемане на външни за Междинното звено оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.; участие в програми за обмен на опит и добри практики; управление на проекта.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-7.4Д: „Европейска академия“

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: „Европейска памет за миналото“

Размер на инвестицията: 290 792,8044 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца

Дата на сключване на споразумението за финансиране: 20.02.2020 г.

Продължителност на проектните дейности: 02.03.2020 – 01.03.2022 г.

Кратко описание: Предвидените дейности в рамките на проект „Европейска академия“ са фокусирани върху европейското гражданско образование и гражданска ангажираност. Инициативата ще предостави на граждани, местни и регионални и политици от 13 държави знания и инструменти, подкрепящи активното гражданство и философията на демократичния съюз. Благодарение на състава на партньорството група от 1270 граждани ще може да се включи в процес, обхващащ симулационни дейности в реалния живот. Така всеки ще може да провери от първа ръка как функционират институциите на Европейския съюз и да опознае тънкостите на политиката на общността - Европейски парламент, Европейски съвет, Европейска комисия, Комитет на регионите, Съвет на ЕС.

Проектът ще даде възможност на различни обществени групи да участват в политическите процеси на ЕС, обединяващи Европа. Академията ще популяризира

добрите практики и възможности как политици и граждани могат да се ангажират с въпроси на Съюза.

Партньори по проекта са институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-7.5Д: Информационни системи на администрацията

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 748 000 лв.

Период на изпълнение: 2014-2020г.

Кратко описание: Реализирана е криптирана VPN мрежа между изнесените центрове за услуги и информация на гражданите, кметства на територията на Община Велико Търново и общинска администрация: дирекция „Местни данъци и такси“, гарантираща оптимална сигурност при обслужване на гражданите и бизнеса. През 2019 г. са подготвени електронни списъци с допълнени кадастрални данни на предоставените от НИИЖК-София списъци за ЕНКЦ на територията на общината с цел тяхното актуализиране. Предоставени са актуализирани кадастрални данни за ЕНКЦ в списъците на Историческо селище Арбанаси и Историческо селище Велико Търново, като предстои подготовката на такива за 25 населени места на общината. Като продукт от проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния-България” бе разработена териториална база данни и картографска подкрепа, както и доставен ArcGIS (специализиран софтуер). Този продукт се използва от администрацията за визуализация на проекти от висок обществен интерес по Общия устройствен план на Община Велико Търново.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-7.6Д: Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Оперативна програма „Административен капацитет“, Договор за безвъзмездна финансова помощ N: M 13-22-30/12.08.2014 г

Размер на инвестицията: 140 099,28 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015г.

Кратко описание: Повишаване на професионалната квалификация и развитие на специфични компетентности на служители и ръководители от общинската администрация в община Велико Търново.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

2.8. Група проекти ЗП-8: Повишаване на образователното равнище и стимулиране на научния капацитет

Проект Зона ЗП-8.1: Стимулиране на научните изследвания в Център за квалификация и преквалификация и филиал на БАН

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране;
- Инициативата за реализиране на проектите следва да бъде външен бенефициент, а не на Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-8.2: Обновяване и дигитализиране на научен фонд и закупуване на софтуер за незрящи хора в културните и образователни институции

ЗП-8.2.1. Проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). Програмен оператор - Министерство на културата.

Размер на инвестицията: 386 454,84 лв.

Период на изпълнение: 2014-2020г.

Кратко описание: Проектът цели да направи достъпни за широката аудитория периодични издания, излизали в края на 19 и началото на 20 век, притежаващи неопценимо информационно съдържание за живота, бита, обичаите, исторически и политически щрихи на ежедневието в споменатите области от онова време. Съществувайки само в книжен оригинал, тези издания са изправени пред сериозната опасност да изчезнат - хартията се разрушава както от времето, така и от активното ползване.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗП-8.2.2. Оборудване на РБ „П.Р.Славейков“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 140 885 лв.

Период на изпълнение: 2014-2020г.

Кратко описание: Текущо оборудване през периода 2014-2020 г.

Източник на информация: Община Велико Търново

2.9. Група проекти ЗП-9: Повишаване квалификацията на кадровите ресурси

Проект Зона ЗП-9.1: Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за хора с увреждания

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране;
- Инициативата за реализиране на проектите следва да бъде външен бенефициент, а не на Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-9.2: Обучение за работа със зависими хора, работа с насилници и деца жертва на насилие, превенция за изоставени деца

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране;
- Инициативата за реализиране на проектите следва да бъде външен бенефициент, а не на Община Велико Търново

Проект Зона ЗП-9.3: Преквалификация на кадри в различни сектори за адаптивност на пазара на труда

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране;
- Инициативата за реализиране на проектите следва да бъде външен бенефициент, а не на Община Велико Търново

3. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

3.1. Група проекти ЗИ-1: Рехабилитация и модернизиране на градската среда

Проект Зона ЗИ-1.1: Рехабилитация на улици и тротоари, изграждане на паркинги, шумоизолираща зеленина, съоръжения за намаляване на скоростта по основни транспортни артерии, огради, енергийно ефективно осветление и осветени пътеки, видеонаблюдение

Проектът е предвиден за реализация на 2 фази и е включен в списъка с основни и в резервните проекти на Инвестиционната програма по ОПРР в инвестиционен приоритет: „Градска среда“, Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“.

В неговата реализация допринася и изпълнението на още 2 проекта, които са допълнени.

ЗИ-1.1.1. Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ (фаза 1)

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 1 571 124,63 лв.

Период на изпълнение: 30 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Дата на приключване на АДБФП: 17.07.2019г.

Кратко описание: Основната цел на проекта е чрез възстановяване на Западна промишлена зона – зона с потенциал за икономическо развитие, да се подобри инвестиционната активност в град Велико Търново. Дейностите са свързани с подобряване и реконструкция на съществуващата техническа инфраструктурна мрежа, свързана с бизнеса; обособяване на терени за инвестиции „на зелено“ за организация и насочване на бизнес дейностите и прехвърляне в Западна промишлена зона на производства, които не отговарят на критериите за безопасност; обновяване, почистване и възстановяване на територията на Западна промишлена зона; конструкция и рехабилитация на кратки участъци от общинската пътна мрежа, осигуряваща достъп до Западна промишлена зона; създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда; повишаване на

безопасността и сигурността в района на Западна промишлена зона чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите; поставяне на знаци и указателни табели до и в рамките на Западна промишлена зона

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗИ-1.1.2. Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ (фаза 2)

Статус: Планиран (резервен проект в ИП на ОПРР)

Източник на финансиране: Приоритетна ос I на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Размер на инвестицията: 1 000 000 лв.

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗИ-1.1.3. Д. Път промишлена зона (ОК 283 - ОК258 - ОК257)

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 59 107 лв.

Период на изпълнение: 2019г.

Кратко описание: Рехабилитация на път в западната промишлена зона на квартал „Чолаковци“ (пътя към бетонов възел)

Източник на информация: Община Велико Търново

ЗИ-1.1.4.Д. Възстановяване на водосток и общински път в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ПМС 96 от 25.04.2019 г. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.

Размер на инвестицията: 421 667 лв.

Период на изпълнение: 2020 – 2021г.

Кратко описание: Възстановяване на водосток и общински път ГАВ 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново – Велико Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗИ-1.2: Паркоустройство и озеленяване на пространствата между производствените сгради

Статус: Приключен

Включен в обхвата на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ (фаза 1)

Проект Зона ЗИ-1.3: Съвременни системи за информация и ориентация

Статус: Приключен

Включен в обхвата на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ (фаза 1)

3.2. Група проекти ЗИ-2: Енергийна ефективност и обновяване на производствени сгради

Проект Зона ЗИ-2.1: Обновяване и енергийна ефективност на обществени сгради:

В обхвата на проекта са включени 3 обекта (т.нар. дейност):

Дейност ЗИ-2.1.1: АРР на ОДМВР (бел. Обектът е държавна собственост)

Дейност ЗИ-2.1.2: „Промислена енергетика ВТ“ АД (бел. Дружеството е със 100% частен капитал)

Дейност ЗИ-2.1.3: „Топлофикация ВТ“ АД (бел. Дружеството е със 100% частен капитал)

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за изпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране;
- Липса на проектна готовност;
- Инициативата за реализиране на проектите следва да бъде на собствениците на сградите.

Проект Зона ЗИ-2.2: Мерки за енергийно обновяване на производствени сгради

Проектът е изпълнен чрез реализирането на 7 проекта на предприятия от гр. Велико Търново:

ЗИ-2.2.1. Проекти за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПИК, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

Размер на инвестицията: 17 432 891,08 лв.

Кратко описание: Изпълнени 4 проекта на частни бенефициенти, ОПИК, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Процедура BG16RFOP002-3.002 Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Източник на информация: ИСУН

ЗИ-2.2.2. Проекти за енергийна ефективност за малките и средни предприятия

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПИК, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

Размер на инвестицията: 4 176 030,29 лв.

Кратко описание: Изпълнени 3 проекта на частни бенефициенти, ОПИК, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

Източник на информация: ИСУН

Проект Зона ЗИ-2.3: Мерки за зелена икономика - изграждане на съоръжения за намаляване емисиите на вредни газове

Община Велико Търново реализира следните проекти съобразно своите правомощия и компетенции:

Проект Зона ЗИ-2.3.1: „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019 г.

Размер на инвестицията: 179 268,75 лв.

Период на изпълнение: 23 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 11.04.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 11.03.2021 г.

Кратко описание: Проектните дейности включват актуализация на общинската програма за намаляване емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново, съгласно чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Зона ЗИ-2.3.2: Автоматична станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г./Проект Life+

Размер на инвестицията: 170 000 лв.

Период на изпълнение: 2019 – 2020 г.

Кратко описание: През 2019г. Община Велико Търново монтира автоматична станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Станцията е оборудвана със сензори за следене на следните параметри: NO₂, CO, SO₂, O₃, ФПЧ, температура, влажност и налягане. Едновременно с това се осигурява визуализация на данните в реално време, чрез софтуерно приложение, което събира данните, предадени в реално време и осигурява визуализация с графични и цифрови изгледи на измерените стойности за всеки газ и суспендирани частици. Визуализацията е цветно кодирана, за да позволи на потребителите бързо да разберат текущото състояние на различните параметри за качеството на въздуха.

Планирано е закупуването на още две устройства за реален мониторинг на вредните емисии. Мярката е заложена за проекта на Община Велико Търново по програма Life+ за подобряване на чистотата на атмосферния въздух.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Зона ЗИ-2.3.3.: Изграждане на съоръжения за намаляване емисиите на вредни газове

Реализирането на проекта е в компетенциите на частни инвеститори и към момента на изготвяне на настоящия доклад няма налична информация.

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Наличие на финансови ограничения - липса на финансиране;
- Инициативата за реализиране на проектите следва да бъде на собствениците на сградите.

3.3. Група проекти ЗИ-3: Заетост, образование и преквалификация

Проект Зона ЗИ-3.1: Осигуряване заетост за нискоквалифицирани кадри

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПРЧР, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Размер на инвестицията: 1 700 738,88 лв.

Кратко описание: Изпълнени 13 проекта на частни бенефициенти, ОПРЧР, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Процедура BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015

Източник на информация: ИСУН

Проект Зона ЗИ-3.2: Преквалификация на кадри в различни сектори на икономиката според нуждите на пазара на труда

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за изпълнение:

- Инициативата за реализиране на проектите следва да бъде на частни фирми

Проект Зона ЗИ-3.3: Стажове за млади специалисти в различни направления

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за изпълнение:

- Инициативата за реализиране на проектите следва да бъде на частни фирми

Проект Зона ЗИ-3.4: Обучения за работещите за повишаване на квалификация, езикови и компютърни умения

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПРЧР, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Размер на инвестицията: 1 232 265,60 лв.

Кратко описание: Изпълнени 6 проекта на частни бенефициенти, ОПРЧР, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Процедура BG05M9OP001-1.021 Обучения на заети лица.

Източник на информация: ИСУН

Проект Зона ЗИ-3.5: Осигуряване на Интернет достъп в зоната

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инициативата WiFi4EU на Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на Механизма за свързване на Европа (MCE).

Наименование на проекта: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на цялостна система за предоставяне на Wi-Fi зона

Размер на инвестицията: 29 337,45 лв.

Период на изпълнение: 2019 г.

Кратко описание: През 2019 г. е осигурена устойчивост с последваща техническа поддръжка на оборудване от страна на общината, съгласно проект WiFi4EU на Европейската комисия, Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA), относно реализирана доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на цялостна система за предоставяне на Wi-Fi зона, свързана с 13 точки на достъп за територията на град Велико Търново: Площад „Цар Асен I“: пред АМР „Царевец“; Панорамни площадки на улица „Стефан Стамболов“; Паметник „Асеневци“; Площад „Съединение“: пред музей „Възраждане и Учредително събрание“; Паметник „Майка България“; Парк „Марно поле“; Парк „Никола Габровски“; Парк „Бузлуджа“; Парк „Зона В“; Парк „Чолаковци“; Парк до църква „Възкресение Христово“; Парк „Картала“: нова детска площадка; Парк „Акация“.

Източник на информация: *Община Велико Търново*

3.4. Група проекти ЗИ-4: Стимулиране на младите предприемачи

Проект Зона ЗИ-4.1: Бизнес- обучение за млади предприемачи

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Реализирането на проектите следва да се осъществява по частна инициатива.

Проект Зона ЗИ-4.2: Обучения за управленските екипи за организация и управление на проекти

През периода проектът се осъществява чрез 2 конкретни проекти, свързани с функционирането на Областния информационен център – Велико Търново.

ЗИ-4.2.1. Проект „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.; Процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“;

Размер на инвестицията: 283 249,33 лв.

Период на изпълнение: 37 месеца

Начало на изпълнение: 13.12.2015г.

Дата на сключване на АДБФП: 25.02.2016г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2018г.

Кратко описание: Продължаване подкрепата за развитието и ефективното функциониране на Областен информационен център – Велико Търново, като част от Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Проектът ще осигури устойчивост и непрекъсваемост на дейностите за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и Споразумението за партньорство, предоставяне на актуална и достоверна информация за възможностите по програмите, в периода 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ. ОИЦ – Велико Търново предоставя четири основни вида услуги – информационни, експертни, комуникационни и логистични с цел гарантиране на равен и лесен достъп до информация и насърчаване активността на потенциални бенефициенти.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

ЗИ-4.2.2. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново“

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

Размер на инвестицията: 369 600 лв.

Период на изпълнение: 36 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 15.01.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2021 г.

Кратко описание: Проектът осигурява устойчивост и непрекъсваемост на дейностите за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС, новия програмен период и многогодишната финансова рамка 2021-2027, предоставяне на актуална и достоверна информация за възможностите по програмите, в периода 2014-2020 г., повишаване разпознаваемостта на Европейските фондове програми, представяне на успешно реализирани проекти в област В. Търново и популяризиране на добри практики. ОИЦ – Велико Търново предоставя четири основни вида услуги – информационни, експертни, комуникационни и логистични с цел гарантиране на равен и лесен достъп до информация и насърчаване активността на потенциални бенефициенти.

ОИЦ–Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 62 души.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

3.5. Група проекти ЗИ-5: Стимулиране използването на интелигентни и иновативни производствени системи

Проект Зона ЗИ-5.1: Иновации и технологична модернизация на предприятия

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПИК, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

Размер на инвестицията: 1 026 826,98 лв.

Кратко описание: Изпълнен 1 проект на частен бенефициент, ОПИК, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Процедура BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации

Източник на информация: ИСУН

Проект Зона ЗИ-5.2: Въвеждане на модерни информационно- комуникационни технологии в предприятията

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПИК, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Размер на инвестицията: 506 674,50 лв.

Кратко описание: Изпълнен 1 проект на частен бенефициент, ОПИК, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Източник на информация: ИСУН

Проект Зона ЗИ-5.3: Повишаване ресурсната ефективност в предприятията

За изпълнение на проекта допринася реализирането на проекти на частни фирми и неправителствени организации по няколко процедури на ОПИК и ОПРЧР.

ЗИ-5.3.1. Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ОПИК, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Размер на инвестицията: 3 130 384,30 лв.

Кратко описание: Изпълняват се 329 проекта с бенефициенти микро, малки и средни предприятия в град Велико Търново по Процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на

микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Източник на информация: ИСУН

ЗИ-5.3.2. Добри и безопасни условия на труд

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПРЧР, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Размер на инвестицията: 989 240,51 лв.

Кратко описание: Изпълнени 6 проекта с бенефициенти частни фирми, ОПРЧР, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Източник на информация: ИСУН

ЗИ-5.3.2. Насърчаване на предприемачеството

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ОПИК, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Размер на инвестицията: 241 789,05 лв.

Кратко описание: Изпълнен 1 проект на бенефициент МСП, ОПИК, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Процедура BG16RFOP002-2.024 Насърчаване на предприемачеството

Източник на информация: ИСУН

ЗИ-5.3.2. Подобряване на производствения капацитет в МСП

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПИК, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Размер на инвестицията: 9 144 272,76 лв.

Кратко описание: Изпълнени 12 проекта на частни бенефициенти МСП, ОПИК, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, BG16RFOP002-2.001 Подобряване на производствения капацитет в МСП

Източник на информация: ИСУН

ЗИ-5.3.2. Подобряване на производствения капацитет в МСП

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПИК, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Размер на инвестицията: 1 777 306,83 лв.

Кратко описание: Изпълнени 3 проекти на частни бенефициенти МСП, ОПИК, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Процедура BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП

Източник на информация: ИСУН

ЗИ-5.3.2. Развитие на кълстери в България

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОПИК, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Размер на инвестицията: 2 355 053,16 лв.

Кратко описание: Изпълнени 2 проекта на НПО бенефициенти, ОПИК, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Процедура BG16RFOP002-2.009 Развитие на кълстери в България

Източник на информация: ИСУН

ЗИ-5.3.2. Развитие на иновационни кълстери

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ОПИК, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“

Размер на инвестицията: 251 310 лв.

Кратко описание: 1 проект частен бенефициент, ОПИК, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни кълстери“

Източник на информация: ИСУН

Проект Зона ЗИ-5.4: Изграждане на панаирно градче за изложения и конгреси

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за неизпълнение:

- Обективна липса - подходящ терен в зоната;
- Дублиране на общия смисъл на проекта с инвестициите в публичната зона – терена на старото сержантско училище

Проект Зона ЗИ-5.5: Ефективно третиране на отпадъците, сепариране и преработка - екоинновации

Статус: Не е отчетен напредък

Идентифицирани проблеми за изпълнение:

- Липса на инвестиционен интерес от страна на частния бизнес
- Недостиг на общински средства

3.6. Група проекти ЗИ-6: Реклама и промоция на икономическите дейности

Проект Зона ЗИ-6.1: Бизнес маркетинг и маркетинг на възможностите за инвестиции

Статус: Приключен

Наименование на проекта, получил финансиране: Проект Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Пасърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Размер на инвестицията: 634 837,37 лв. за Община Велико Търново

Стойност на проекта по бюджет: 572 533,62 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор - 634 837,37 лв./, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър „National Theatre Marin Sorescu“ Крайова, „Dimanche Association“ Крайова, Румъния

Период на изпълнение:

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017 г.

Срок за изпълнение: 08.03.2020 г.

Кратко описание: Проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“, осигуряващ по-всеобхватен и ефективен пазар на труда в трансграничния регион Румъния- България и позволяващ нови икономически възможности и подобрени перспективи за заетост. Целта е стимулиране предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион, чрез иновативен маркетинг на местните земеделски и занаятчийски продукти и услуги. Организиран са земеделски и занаятчийски панаири във Велико Търново и Крайова, като традиционна форма на промоция и маркетинг. Разработена е платформа за електронна търговия - FairDeal; Проведени събития - фестивали, кръгли маси, обучения в България и Румъния; Организиран и проведен рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проекта; Разработен информационен уебсайт (www.fairdeal.bg) и създаден информационен банер с поместена информация за проекта,

за партньорите, а в сектор „Новини“- за проведените събития: пресконференции, семинари, панаири и др.; Разработена и проведена социална медийна рекламна кампания (създадени са профили в социалните мрежи- Facebook и Instagram) във връзка с дейностите по проект „FairDeal“, ежемесечно публикувана текуща информация за проведени събития, разработени видео- и снимков материал в създадените профили в социалните мрежи;

Интегрирането на традицията с предложени иновативен подход ще допринесе за по-широки възможности и по-висока ефективност на регионални малък и среден бизнес.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Зона ЗИ-6.2: Рекламирање и промоция на икономическата дейност

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 488 417,46 лв.

Период на изпълнение: 2016-2020 г.

Кратко описание: За периода 2014 – 2020 г. Община Велико Търново инвестира собствени средства за организиране на годишните издания на Международното изложение „Културен туризъм-2019“ и участва в Националната туристическа борса „Ваканция и спа“, на международни борси в Лондон, Испания, Москва, Румъния, вкл. разработване на рекламни материали и реализиране на он-лайн рекламни кампании.

Източник на информация: Община Велико Търново

4. ДРУГИ ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ИПГВР

Група проекти Д-1: Обновяване и енергийна ефективност на МФЖС и обществени сгради

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМФЖС)

Кратко описание:

Изпълнени 10 проекта, извън зоните за въздействие, както следва:

ул. „Ален Мак“ № 1, вх. А-Б

ул. „Георги Живков“ №1

ул. „Краков“ № 2

ул. „Ниш“ №2, вх. А, вх.Б, вх.В

ул. „Ниш“ №4, вх. А,Б,В

ул. „Охрид“ № 3 вх. А вх. Б вх. В вх. Г и ул. „Ален мак“ № 4 вх. А вх. Б вх. В вх. Г

ул. „Плиска“ №5, вх.Б

ул. „Филип Тотю“ №15, вх. А,Б,В

ул. „Филип Тотю“ №17, вх. А, Б,В

Размер на инвестицията: 9 432 000 лв.

Източник на информация: НПЕЕМФЖС

Група проекти Д-2: Обновяване на образователна, културна и социална инфраструктура

Проект Д-2.1. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален доверителен екофонд – Инвестиционна програма за климата

Обект 1. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново“

Статус: Планиран (очаква финансиране)

Размер на инвестицията: 2 618 374,45 лв.

Обект 2. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново”.

Статус: Приключен

Размер на инвестицията: 1 221 138,60 лв.

Проект Д-2.2 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“

Статус: В изпълнение

Наименование на проекта: Част от Проект № BG16RFOP001-3.002-0004-C04 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България

Размер на инвестицията:

ПП по електроника „Александър С. Попов“ - Велико Търново	1 296 311,95 лв.
ПП по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Велико Търново	419 313,14 лв.
ПП по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“	1 640 116,85 лв.

Период на изпълнение:

Дата на стартиране: 21.12.2016

Дата на приключване: 21.12.2021

Кратко описание: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура. Инвестициите в образователните институции са с цел обновяване и модернизация на учебните кабинети, лабораториите, спортните съоръжения и учебните работилници и ще допринесат за осъществяване на по-качествено професионално образование.

Източник на информация: ИСУН, МОН

Проект Д-2.3 „Изграждане на детска градина в кв. „Картала“, гр. Велико Търново

Статус: Планиран (одобрен, очаква подписване на договор)

Източник на финансиране: Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 на Министерство

на образованието, Модул 1 – Детски ясли и градини, Модул 2 – Неспециализирани училища, професионални гимназии

Размер на инвестицията: 2 971 600,00 лв.

Период на изпълнение: 2021 – 2022 г.

Източник на информация: МОН, Община Велико Търново

Проект Д-2.4 З. „Реконструкция на сграда на ЦМГ „Васил Друмев“ за осигуряване на едносменен режим на обучение - гр. В. Търново“

Статус: Планиран (одобрен, очаква подписване на договор)

Източник на финансиране: Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 на Министерство на образованието, Модул 1 – Детски ясли и градини, Модул 2 – Неспециализирани училища, професионални гимназии

Размер на инвестицията: 1 365 800,00 лв.

Период на изпълнение: 2021 – 2022 г.

Източник на информация: МОН, Община Велико Търново

Проект Д-2.5. „Реконструкция на сграда на ОУ „Бачо Киро“ - гр. Велико Търново за осигуряване на едносменен режим на обучение“

Статус: Планиран (одобрен, очаква подписване на договор)

Източник на финансиране: Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 на Министерство на образованието, Модул 1 – Детски ясли и градини, Модул 2 – Неспециализирани училища, професионални гимназии

Размер на инвестицията: 98 300,00 лв.

Период на изпълнение: 2021 – 2022 г.

Източник на информация: МОН, Община Велико Търново

Проект Д-2.6. Модернизация на образователната инфраструктура на ДГ „Първи юни“

Статус: Приключен

Наименование на проекта: Част от проект №BG161PO001/1.1-09/2010/033 „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Източник на финансиране: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010 - Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации по Приоритетна ос

1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1: „Социална инфраструктура“ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Размер на инвестицията: 218 336,30 лв.

Период на изпълнение: 2014-2015 г.

Кратко описание: Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Д-2.7: Модернизация на образователна инфраструктура, вкл. дворни пространства, достъпна среда и видеонаблюдение

Д-2.7.1. Детски градини

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Период на изпълнение: 2014 – 2020г.

Кратко описание: През периода са направени следните инвестиции по обекти, както следва:

В обект 1. ДГ „Слънце“ (ул. „Любен Каравелов“ № 47): стопански инвентар - Еразъм + (2015); стопански инвентар – ПУДООС (2016); Основен ремонт (2017); възстановяване сградата на детска градина „Слънце“, УПИ-II, кв. 109, ПМС 250/04.09.2020 г. (2020-2021г.)

Размер на инвестицията: 90 856 лв.

В обект 2. ДГ „Евгения Кисимова“ (ул. „Освобождение“ № 31): лаптоп и стопански инвентар (2015); стопански инвентар (2016);

Размер на инвестицията: 4 605лв.

В обект 3. ДГ „Соня“ (ул. „Момина Крепост“ № 9): основен ремонт детска площадка, климатична система (2017);

Размер на инвестицията: 75 820 лв.

В обект 4. ДГ „Здравец“ (ул. „Стара планина“ № 22) лаптоп (2017); компютърна конфигурация (2019); за възстановяване на покрив, ПМС 247 от 07 ноември 2017 г. (2018); Разширение и довършване на съществуваща детска градина в УПИ III 153 А, ДГ „Здравец“, ПМС 315/19.12.2018 (2019-2020); Изготвяне на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Здравец" и завършване на новия корпус към нея (2020)

Размер на инвестицията: 917 985 лв.

В обект 5. ДГ „Първи юни“ (ул. „Филип Тотю“ № 5): основен ремонт на санитарни възли (2015-2016); стопански инвентар, ПУДООС (2015); лаптопи и проектор (2017); доставка на детски съоръжения за детска площадка, ПУДООС (2019)

Размер на инвестицията: 60 436 лв.

В обект 6. ДГ „Райна Княгиня“ (ул. „Мария Габровска“ № 3): стопански инвентар (2015); интерактивна дъска и проектор, компютърна конфигурация; доставка на детски съоръжения за детска площадка, ПУДООС (2017);

Размер на инвестицията: 9 545 лв.

В обект 7. ДГ „Иванка Ботева“ (ул. „Мария Габровска“ № 7): стопански инвентар (2015); интерактивна дъска (2017);

Размер на инвестицията: 2 919 лв.

В обект 8. ДГ „Ивайло“ (ул. „Вежен“ № 1): стопански инвентар (2015); възстановяване на покрив, ПМС 247/07.11.2017 г.; възстановяване на подпорна стена в двора на детска градина, ПМС 63/26.04.2018 г.; хладилен шкаф (2018); Основен ремонт санитарни помещения (2019);

Размер на инвестицията: 254 491 лв.

В обект 9. ДГ „Слънчев дом“ (жк. „Акация“): компютърна конфигурация (2017); лаптоп за здравен кабинет (2019);

Размер на инвестицията: 1 593 лв.

Климатизи за нуждите на детските градини в Община Велико Търново (2020)

Размер на инвестицията: 28 200 лв.

Д-2.7.2. Основни училища

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Период на изпълнение: 2014 – 2020г.

Кратко описание:

В обект 1. ОУ „Димитър Благоев“ (ул. „Христо Смирненски“ № 1А): компютърни конфигурации; пожароизвестителна система; видеонаблюдение; портиерна кабина (2014); графична станция; пожароизвестителна система и видеонаблюдение; софтуер (2015); проектори; система за видеонаблюдение (2016); проектори, доизграждане на система за видеонаблюдение, електронна платформа (2017); възстановяване на покрив, ПМС 247/07.11.2017 г.; компютри и хардуер, климатични системи, озвучителна техника за училищен автоматичен звънец (2018); възстановяване на покрив, ремонт на санитарни възли, Wi-Fi мрежа (2019);

Размер на инвестицията: 183 238 лв.

В обект 2. ОУ „Петко Р. Славейков“ (ул. „Освобождение“ №29): графична станция, софтуер (2015); аудио-озвучителна техника, програмен продукт, електронна платформа (2017); възстановяване на покрив (столова), ПМС 247/07.11.2017 г. (2018-2019), проектор, миялна машина (2018);

Размер на инвестицията: 87 114 лв.

В обект 3. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ (ул. „Мармарлийска“ №13): мултимедиен проектор, копирна машина (2014); мултимедиен проектор, копирна машина, стол стопански инвентар (2015); компютри, копирна машина, принтер, скенер (2016);

лаптопи, интерактивна дъска, климатици, система за видеонаблюдение, обемни букви на фасада, Ученически стол - стопански инвентар /миялна машина, зеленчукорезачка, миксер/ (2017); аудио озвучителна система, заседателна маса (2018); подиум /съоръжение/, Ученически стол при ОУ "Св. П. Евтимий" - газов уред (2019); защитна стена Figewall; класна стая на открито (2020)

Размер на инвестицията: 75 753 лв.

В обект 4. ОУ „Бачо Киро“ (ул. „Филип Тотю“ №20): проектор, изграждане на спортна площадка за мултиспорт (2014); благоустрояване на училищния двор (2015); компютри, изграждане на детска площадка (2016); компютри и хардуер, климатични системи, софтуер (2017); интерактивни дъски (2018); лаптопи, интерактивна дъска, проектор, климатични системи (2019); лаптопи и интерактивен дисплей, видеонаблюдение (2020).

Размер на инвестицията: 190 591 лв.

В обект 5. ОДК: възстановяване на покрив на общински детски комплекс, гр. Велико Търново ПМС 247 от 07 ноември 2017 г. (2018-2019).

Размер на инвестицията: 201 600 лв.

Д-2.7.3. Средни училища

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Период на изпълнение: 2014 – 2020г.

Кратко описание: В обект 1. СУ „Емилиян Станев“ (ул. „Мария Габровска“ № 1): преносими компютри, изграждане на многофункционална зала в СУ „Емилиян Станев“; софтуери (2014); интерактивна дъска, компютри, система за видеонаблюдение, стопански инвентар (2015); компютър, компютри, "Еразъм+", пожароизвестителна система, система за видеонаблюдение, Бойлер Плувен басейн (2016); лаптопи, компютърни конфигурации, туба - духов музикален инструмент, телескоп (2017); компютърни конфигурации, компютри и хардуер, електрическа пещ (2018); интерактивни дъски, проектори, защитна стена и интернет точка за достъп, софтуер, музикални инструменти /чинели и барабани/ (2019); лаптопи (2020).

Размер на инвестицията: 1 337 184 лв.

Д-2.7.4. Профилирани гимназии

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Период на изпълнение: 2014 – 2020г.

Кратко описание:

В обект 1. ПМГ „Васил Друмев“ (ул. „Вела Благоева“ №10) са инвестирани: лаптоп (2014); основен ремонт на санитарни възли, закупуване на компютри (2015); проектор (2016); основен ремонт покрив (2017-2018), компютри (2017); безжична интернет мрежа (2018); интерактивни дъски, проектори, климатици, заваръчен апарат, софтуер, въздушна завеса с топлоносител (2019); термовизионна камера (2020)

Размер на инвестицията: 160 931 лв.

В обект 2. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ (ул. „Славянска“ №2): преносими компютри, видеоманетофон (2014); основен ремонт на санитарни възли, компютърни конфигурации (2015); климатик (2016); копирна машина (2017), безжична интернет мрежа (2018); компютри, цифрово записващо устройство добавено към съществуваща техника за видеонаблюдение (2019)

Размер на инвестицията: 100 224 лв.

Източник на информация: Община Велико Търново

Група проекти Д-3: Интеграция на маргинализирани групи и хора с увреждания

Проект Д-3.1. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/.

Размер на инвестицията: 1 192 023,86 лв.

Период на изпълнение: 53 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2020 г.

Кратко описание: За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода април– юни 2020 година работят 26 специалисти (17 души на трудови договори и 9 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др. Предоставят се следните услуги: ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП); семеен център за деца от 0 до 3 г.; здравна консултация за деца.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Д-3.2. „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ (ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3)

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

Размер на инвестицията: 820 000 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 12.03.2018г.

Кратко описание: Създаване и изграждане на 1 бр. преходно жилище за деца от 15 до 18 години, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и разширяване базата, чрез осъществяване на ремонт, обзавеждане и оборудване на съществуващ Център за обществена подкрепа

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Д-3.3. „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ (с. Церова кория)

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-C01, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”

Размер на инвестицията: 2 760 000 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца

Дата на сключване на АДБФП: 04.02.2019 г.

Срок за изпълнение: 04.02.2021 г.

Кратко описание: Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост на територията на община Велико Търново, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и Картата на резидентните услуги, чрез изграждане на 4 сгради (ново строителство), всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория. Центровете представляват отделни масивни сгради, разположени в общ парцел, със самостоятелни прилежащи дворни пространства. Общото за комплекса външно прилежащо пространство ще се оформи като паркова среда, с места за почивка и разходки. Предвижда се изграждане на обща кухня майка (в изнесена пристройка към една от сградите), обзаведена и оборудвана съобразно общия брой на потребителите. Ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на съществуваща сграда за предоставяне на услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ с капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново. Центърът ще бъде обособен като самостоятелен обект с отделен вход и собствено прилежащо дворно пространство.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Д-3.4. „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ (ул. „Симеон Велики“ № 3)

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

Размер на инвестицията: 941 359,37 лв.

Период на изпълнение: 24 месеца

Дата на сключване на АДФП: 15.07 2020

Дата на стартиране: 01.08.2020

Дата на приключване: 01.08 2022

Кратко описание: Целите на проектното предложение са: Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата, включително и за децата с увреждания, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване; Създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете, чрез които се цели подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Чрез реализацията на проекта ще се осигури възможността за обезпечаване предоставянето на новите социални услуги в общността в община Велико Търново, за които е ремонтирана подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. В изпълнение на заложените цели, считано от 01.12.2020 г. ще бъде създаден „Комплекс от социални услуги за деца“, чрез разкриването на две нови социални услуги: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативни услуги; „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, с капацитет 8 места.

Източник на информация: ИСУН, Община Велико Търново

Проект Д-3.5. Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания (гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14)

Статус: Планиран (в оценка, очаква финансиране)

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Размер на инвестицията: 998 948,29 лв.

Период на изпълнение: 27 месеца

Дата на сключване на АДФП: Предстои подписване на Договор за БФП

Кратко описание: Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места. Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, е социална услуга която осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информирание и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни в годината и други дейности. За целите на проекта Община Велико Търново предоставя част от сграда общинска собственост, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14 (първи етаж и част от втори етаж) в жилищен район на града, в близост до централната част с изградена достъпна архитектурна среда. В предоставената сграда ще бъде извършен основен ремонт, съгласно изработен инвестиционен проект. Предвижда се назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността, както и обучението му. За обезпечаване на проектните дейности се предвижда и закупуване на транспортно средство, адаптирано за нуждите на целевата група.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Д-3.6 „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ (село Церова кория, общ. Велико Търново)

Статус: Планиран (в оценка, очаква финансиране)

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения. Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Размер на инвестицията: 993 894,18 лв.

Период на изпълнение: 34 месеца

Дата на сключване на АДФП: Предстои подписване на Договор за БФП

Кратко описание: Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, общ. Велико Търново, с капацитет 40 места. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения е социална услуга, която осигурява почасови услуги, рехабилитация, трудотерапия, трудово наставничество, консултиране, информирание и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения. За целите на проекта Община Велико Търново предоставя сгради общинска собственост намиращи се в село Церова кория, общ. Велико Търново, местност „Иванова чешма“, а именно: сграда на един етаж, с площ 225 кв.м. и сграда на един етаж, с площ 88 кв.м. Предвижда се назначаване на персонал за предоставяне на

социалната услуга в общността и обучението му и закупуване на транспортно средство, адаптирано за нуждите на целевата група.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Д-3.7. „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Церова Кория“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Проект „Красива България“ - част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

Размер на инвестицията: 60 000 лв.

Период на изпълнение: 2018 г.

Кратко описание: Изграден е външен асансьор в сградата на специализираната институция

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Д-3.8. „Реновация и модернизация на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с. Церова Кория

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Размер на инвестицията: 30 000 лв.

Период на изпълнение: 2018 г.

Кратко описание: Обновени помещенията на партерния етаж на специализираната институция.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Д-3.9. „Вътрешно преустройство на съществуващата сграда на Домашен социален патронаж - гр. Дебелец, общ. Велико Търново“

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Проект „Красива България“ - част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

Размер на инвестицията: 400 000 лв.

Период на изпълнение: 2019 г.

Кратко описание: Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец, община Велико Търново“

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Д-3.10. Други инвестиции за социална инфраструктура извън зоните за въздействие

Статус: Приключен

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г.

Период на изпълнение: 2014 – 2020г.

Кратко описание: В обект 1. „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 год.“ (гр. Велико Търново, ул. „Бойчо Войвода“ №1 с капацитет 50 души“ са инвестирани средства за следните дейности: обзавеждане и оборудване (2015г.); автомобил за нуждите на ЦСРИ „Б. Войвода“ (2018г.)

Размер на инвестицията: 39 113 лв.

В обект 2. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ (гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски“ №49, западно крило с капацитет 10 души) са инвестирани средства за следните дейности: компютри; обзавеждане и оборудване (2015г.)

Размер на инвестицията: 4 093 лв.

В обект 3. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ (гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски“ № 49 източно крило с капацитет 10 души) са инвестирани средства за следните дейности: основен ремонт (2018г.); доставка и монтаж на газов котел (2019г.)

Размер на инвестицията: 8 519 лв.

Домашен социален патронаж, гр. Дебелец - кухненско оборудване; ЦНСТПЛУИ ул. "Н. Габровски", източно крило - доставка и монтаж на газов котел (2020)

Размер на инвестицията: 48 000 лв.

Източник на информация: Община Велико Търново

Група проекти 4: Свързаност и достъпност

Проект Д-4.1. „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „ТЕН-Т“, чрез общи мерки в трансграничния регион“

Статус: В изпълнение

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Размер на инвестицията: 11 384 588,86939 лв. за община Велико Търново (5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

Период на изпълнение:

Дата на сключване на АДБФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 09.12.2022 г.

Кратко описание: Основната цел на проекта е подобряване на проводимостта в пресечните точки на Паневропейски коридор 9, чрез рехабилитация и модернизирание на

12,643 км пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие и пряка връзка към основната инфраструктура на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T); разработване на 3 съвместни механизма (мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността), за да се улесни свързването на вторични и третични възли с основната TEN-T инфраструктура. Предметът на строителните дейности включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново с включени следните обекти: улица „Опълченска“ от връзката с път III-514 до връзка с път Е-85 (I-5), както и улици „Теодосий Търновски“ от пътна връзка с улица „Магистрална“ (Път Е772(I-4)) до улица „Димитър Найденов“, улица „Димитър Найденов“ от улица „Теодосий Търновски“ до улица „Сливница“, улица „Сливница“ от улица „Димитър Найденов“ през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски“, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница“ до ново преместване на река Янтра и улица „Ксилифорска“ от ново преместване на река Янтра до път III-514.

Партньори по проекта: Община Велико Търново LB/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор.

Източник на информация: Община Велико Търново

Проект Д-4.2. Осигуряване функционална свързаност на периферията със зоните за въздействие

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г., ПМС

Размер на инвестицията: 3 913 484 лв.

Източник на финансиране: Инвестиционни програми на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г., ПМС

Размер на инвестицията: 3 913 484 лв.

Кратко описание: укрепване на свлачище и възстановяване на ул. Трапезица, гр. Велико Търново (98 012 лв.); възстановяване на мост над р. Янтра между гр. Велико Търново и с. Шемшево на общински път ГАВ 3110 "път III-303, Керека (граница община Дряново - Велико Търново) - Шемшево - Велико Търново, при км 12+411 (1 167 902 лв.); трайно възстановяване на общинския път VTR 1009 /път I-5/ - Преображенски манастир (250 065 лв.); доизграждане на ул. Стоян Михайловски, кв. Картала, ОК 2577 – ОК 2576 – ОК 2567 – ОК 2564 – ОК 2565 – ОК 2805 (450 550 лв.); изграждане на ул. Васил Априлов, кв. Картала (252 000 лв.); изграждане на ул. Камен Зидаров, ОК 2521 – ОК 259 и ул. Петко Тодоров ОК 259 – ОК 2452, кв. Картала (245 000 лв.); изграждане на ул. Александър Бурмов, кв. Картала, ОК 2364 – ОК 2518 (176 000 лв.); възстановяване на ул. Климент Охридски (път III-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Св. Четиридесет мъченици“, гр. Велико Търново, частично (600 000 лв.); възстановяване на ул. Климент Охридски /път III-514/ при Манастирския комплекс „Великата лавра“ до църквата „Св. Четиридесет мъченици“, гр. Велико Търново (673 955 лв.); почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра – първи, четвърти и пети участък – за първи участък от дъговия железен мост на републикански път I-4 „София –

Варна“ до 50 м след бетонния мост за жп гара Велико Търново (404 904 лв.); ПМС 63 от 26 април 2018 г., спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи – почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра в кв. Асенов, гр. Велико Търново – в участъка от каменния мост на път Ш-514 до църквата „Св. Четиридесет мъченици“ (49 925 лв.); ПМС 250/04.09.2020 г.

Източник на информация: Община Велико Търново, ПМС

Приложение №6. Източници на информация

Закон за регионалното развитие, обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г, изм ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г, изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм ДВ. бр 66 от 26 Юли 2013г., доп ДВ бр 22 от 11 Март 2014г, изм. ДВ. бр 98 от 28 Ноември 2014г, изм ДВ бр.9 от 3 Февруари 2015г, доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г, изм и доп ДВ бр 15 от 23 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г, изм. ДВ. бр 58 от 18 Юли 2017г, изм. и доп ДВ. бр 28 от 29 Март 2018г,

Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие, приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г, обн. ДВ. бр 80 от 12.09.2008 г., посл изм и доп ДВ бр.50 от 01.07.2016 г.

Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (изменение от март 2019г.), интернет адрес: <https://www.mrrb.bg/bg/metodicheski-nasoki-za-razrabotvane-i-prilagane-na-integrirani-planove-za-gradsko-vuzstanovyavane-i-razvitie-izmenenie-ot-mart-2019-g/>

Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове, съгласувана по повод на Неформална среща на министрите, отговарящи за развитието на градските райони и териториална кохезия в Лайпциг на 24 - 25 май 2007 г; интернет адрес: http://www.bgregio.eu:8080/FCKeditor/UserFiles/File/_Leipzig-Charta-AdR-bgl.pdf

ESDP – European Spatial Development Perspective (Европейската перспектива за пространствено развитие, приета от СЕМАТ в Потсдам, 1999); интернет адрес: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf

Декларация от неофициалната среща на министрите в Толедо по въпросите на градското развитие, Толедо, 22 юни 2010 г., интернет адрес: http://www.bgregio.eu:8080/FCKeditor/UserFiles/File/2010%2006%2022%20TOLEDO%20DECLARATION%20approved_revised_bg.pdf

ЕВРОПА 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2010) 2020 окончателен), интернет адрес: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020>

Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г., приета с Решение № 696 на Министерския съвет от 24.08.2012 г.; интернет адрес: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=772>

Национална програма за развитие: България 2020, приета с Решение № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г., интернет адрес <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=765>

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г, приета с Протокол № 47.61 на Министерския съвет от 19.12.2012 г.; интернет адрес <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=774>

Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година, приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 2020 г. (обн ДВ. Бр.42 от 12 май), интернет адрес: <https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/4554>

Постановление № 92 от 17 април 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, обн. ДВ. бр. 30 от 24 април 2015 г., изм. ДВ. бр. 63 от 18 август 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 88 от 13 ноември 2015 г.

Постановление № 160 от 4 август 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, обн. ДВ. бр. 64 от 8 август 2017 г.

Постановление № 247 от 7 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, обн. ДВ. бр. 90 от 10 ноември 2017 г.

Постановление № 260 от 24 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г., обн. ДВ. бр. 95, от 28 ноември 2017 г.

Постановление № 63 от 26 април 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, обн. ДВ. бр. 37 от 4 май 2018 г.

Постановление № 292 от 12 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2018 г., обн. ДВ. бр. 104 от 14 декември 2018 г.

Постановление № 315 от 19 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г., обн. ДВ. бр. 107 от 28 декември 2018 г.

Постановление № 96 от 25 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, обн. ДВ. бр. 36 от 3 май 2019 г.

Постановление № 250 от 4 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, обн. ДВ. бр. 79 от 8 септември 2020 г.

Национален статистически институт (<https://www.nsi.bg/>)

Регионален план за развитие на Северния централен район за периода 2014-2020 г., приет с Решение № 461 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.; интернет адрес: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=867>

Областна стратегия за развитие на Област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., приета с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 13.06.2013 г., интернет адрес: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=991>

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (2007-2013), <http://umispublic.government.bg/>

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (2014-2020), <http://2020.eufunds.bg/>

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново за периода 2014-2020, интернет адрес

<https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/obshinski-savet-archive/resheniya/resheniya-ot-2013-godina/resheniya-po-protokol-59-ot-19122013-g-copy/reshenie-959/>

Общински план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014-2020 г., приет с Решение № 1136 на Общинския съвет от 28.05.2014 г., интернет адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2014/04/24/obshtinski-plan-za-razvitie-obshtina-veliko-tarnovo.pdf>

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014 – 2020, интернет адрес <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2017/08/08/mezhdinna-ocenka.pdf>

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велико Търново 2014-2020 за 2016-та година, интернет адрес <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2017/08/08/godisen-doklad-za-nabludenie-na-obshtinski-plan.pdf>

Общ устройствен план на Община Велико Търново, Одобрен с Решение № 507 от Протокол № 34 от 31.01.2013 г. на Великотърновски Общински съвет, интернет адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/stroitelstvo-i-ustroistvo/obsh-ustrojstven-plan/>

Програма за управление на община Велико Търново за периода 2015-2019, интернет адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2016/06/23/programa-za-upravlenie-2015-2019.pdf>

Отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Велико Търново за 2015 година, интернет адрес <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2016/06/23/otchet-upravlenie-obshtina-veliko-tarnovo-2015.pdf>

Отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Велико Търново за 2016 година, интернет адрес <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2017/08/08/godisen-plan-otchet-2016.pdf>

Отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Велико Търново за 2017 година, интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2018/03/08/otchet-prilojenie_1_2017.pdf

Отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Велико Търново за 2018 година, интернет адрес <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2019/05/09/otchet-programa-upravlenie-2018.pdf>

Отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Велико Търново за 2019 година, интернет адрес <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2016/06/23/programa-za-upravlenie-2015-2019.pdf>

Програма за управление на община Велико Търново за периода 2019-2023, интернет адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2020/03/12/programa-za-upravlenie-obshtina-vt-2020.pdf>

Инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2020г, интернет адрес <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2020/11/05/reshenie-357-ip-30092020.pdf>

Отчети на Инвестиционна програма на Община Велико Търново по години за периода от 2014 до 2020г., предоставени от Община Велико Търново

Община Велико Търново (<https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/>)
